

2555

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานผลดำเนินงาน (ไตรมาส 4)

ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

CONTENTS

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 4)	1
☞ การจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	4
☞ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	5
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	7
ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	8
ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	9
ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	10
ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน	11
ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 4/2555	12

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (<http://cc.swu.ac.th>)

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้น ในการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไป

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องได้เตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ปี 2555-2559 และแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2550-2554 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปิงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 4)

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีจำนวนโครงการหลัก 16 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย

- ▶ โครงการหลัก 12 โครงการ
- ▶ โครงการย่อย 44 โครงการย่อย/กิจกรรม


2. โครงการประจำ ประกอบด้วย

- ▶ โครงการหลัก 4 โครงการ
- ▶ โครงการย่อย 18 โครงการย่อย/กิจกรรม

ขณะนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาถึงไตรมาส 4 แล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานดังนี้


รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2555		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	47	75.81
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	1	1.61
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	7	11.29
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชลออกไปปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	0	0.00
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	7	11.29
รวม	62	100.00

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 4

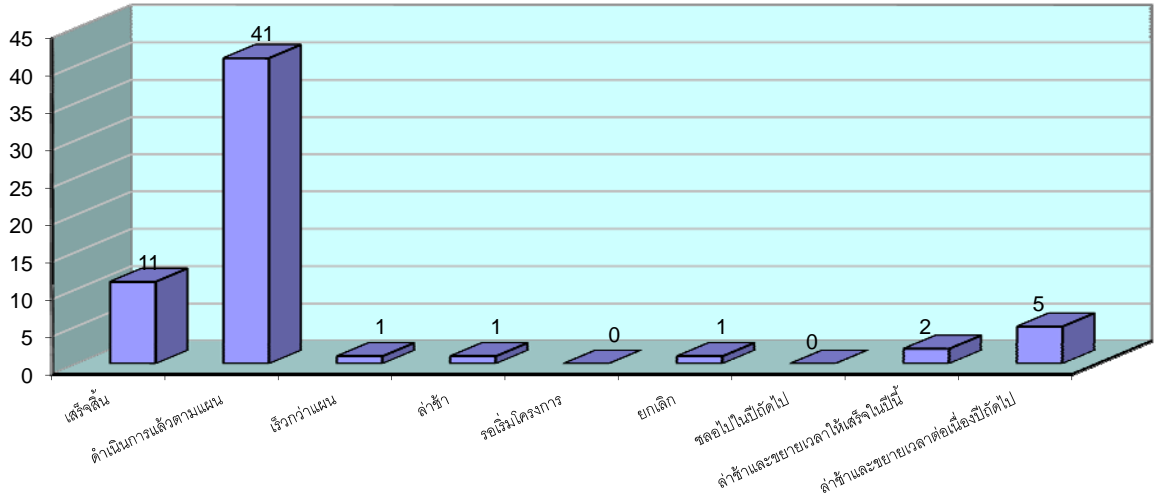

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำแนกตามไตรมาส

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

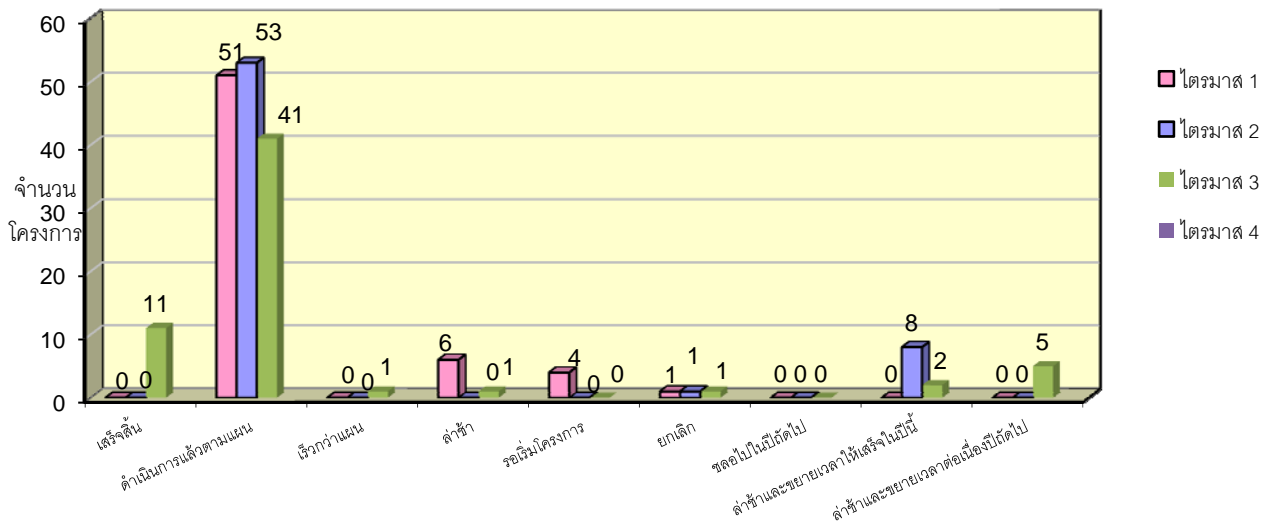

สำหรับในปีงบประมาณ 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังทุกระดับชั้นให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จดังนี้

1. สำนักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2555-2559 และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบกำกับ ดูแล ในเรื่องดังกล่าว
2. สำนักคอมพิวเตอร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ และจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าว
URL : <http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>
3. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีต่อไป
 - ▶ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัย
4. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
5. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
6. สำนักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
7. สำนักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
8. สำนักคอมพิวเตอร์มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

➡ การจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำและปรับปรุงเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี



<http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>

➡ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยยึดหลัก PDCA (Plan Do Check Act) ในการทำงานและเป็นการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ▶ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี
- ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
- ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัย
- ▶ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้บุคลากรรับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน
- ▶ มีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

และได้มีการนำเสนอแผน ผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ กำกับ ดูแล และนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ตามลำดับ รวมถึงประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้มอบให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการนำร่อง การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 1 ทำให้การติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ล่าช้า เนื่องจากบุคลากรส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบในโครงการต่างๆ เข้าไปช่วยงานในโครงการนำร่องฯ
2. ในปีนี้มีหลายโครงการที่จัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบ

ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์

1. ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2. อธิการบดี	ประธาน
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่าย มศว องค์กรฯ	กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
12. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	กรรมการ
13. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
18. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต	กรรมการ
19. อาจารย์วรารักษ์ วิทยานนท์	กรรมการ
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ
21. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

1. ศาสตราจารย์วิลาศ ววงค์	ที่ปรึกษา
2. นายพีรศักดิ์ วรรณทโรสถ	ที่ปรึกษา
3. นางสุวิภา วรรณสาธพ	ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	ประธาน
5. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)	กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ณสรณ์ ผลโภาค (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา)	กรรมการ
9. อาจารย์สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
10. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
11. นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
12. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
13. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช (เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์)	เลขานุการ

ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์




- | | |
|--|---------------------|
| 1. นางชนิษฐา รุจิโรจน์ | ที่ปรึกษา |
| 2. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
(ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง) | ที่ปรึกษา |
| 3. อาจารย์อรุณพ โพธิสุข | ที่ปรึกษา |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
(ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | ประธาน |
| 5. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต
(รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง | กรรมการ |
| 7. อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 8. นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 9. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 10. นายดิเรก อั้งตระกูล
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 11. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 12. นายนคร บริพนธ์มงคล
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) | กรรมการ |
| 13. นายสันติ สุขยานันท์
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ) | กรรมการ |
| 14. นางพัชรินทร์ สนธิวิเศษ
(เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการและเลขานุการ |

ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ปี 2554			ปี 2555								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	★											
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	★											
3. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านที่ประชุมสำคัญต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 	★											
4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
5. ติดตามผลดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นรายไตรมาส และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 			★			★			★			★
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ												★

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ผลดำเนินงาน		จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1 โครงการในปีงบประมาณ 2555		62			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		44	70.97		
1.2 โครงการประจำ		18	29.03		
2 ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	47	75.81	77.42	3.87
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	1	1.61		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0.00		
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	7	11.29		
2.7	ชลออกไปในปีถัดไป	0	0.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	7	11.29		
รวม		62	100.00	100.00	

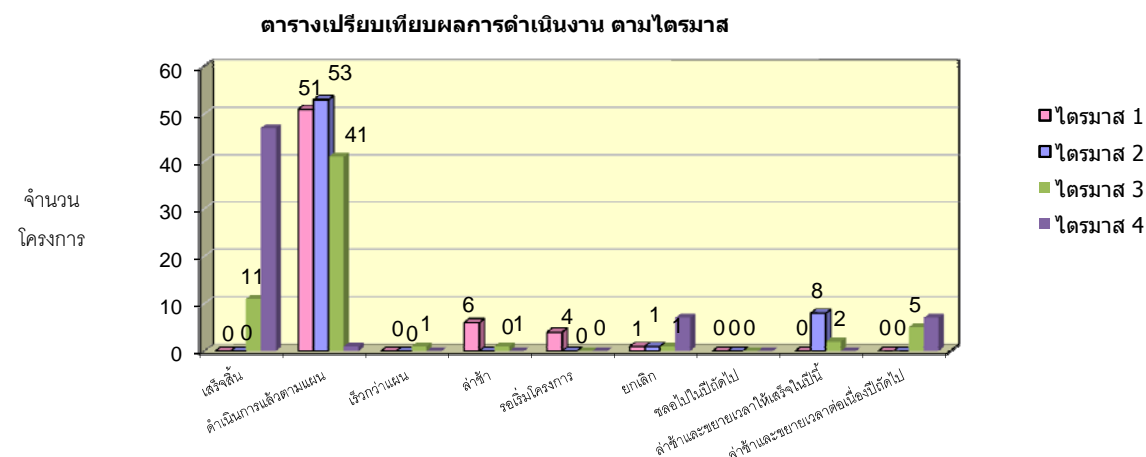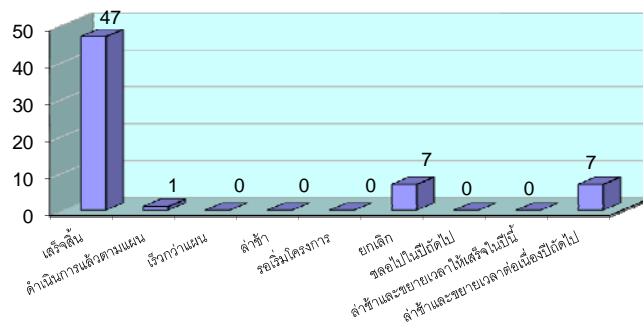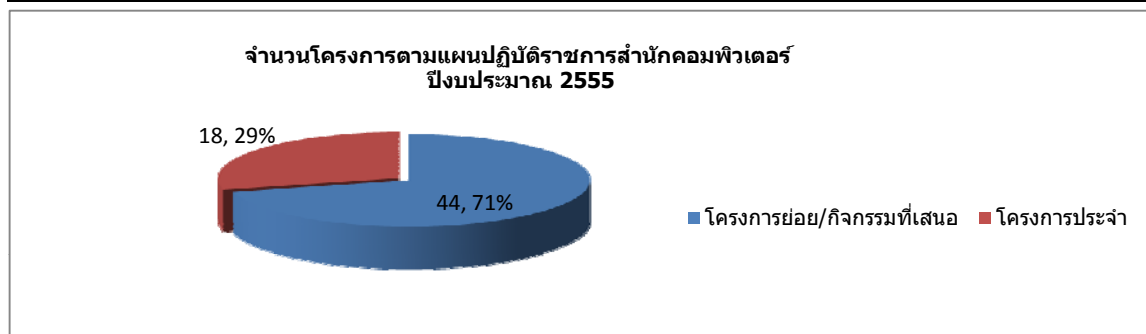

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินงานตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
41	- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไฮบริด มศว (SOT2BP)	อุราพร , สุพิมพ์ , ภาณุวัฒน์ , ชัยวัฒน์ , จิตติมา

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ , นคร , พงษ์ภูมิพันธ์
10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดีเรก , พัชรินทร์
11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	ดีเรก , สุพิมพ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล , ศิริศศิเกษม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล , วัลลภย์
31	มอดูล จองห้อง online	อมรรัตน์
44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	อุราพร , พัชรินทร์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดีเรก , ชนิษฐา
13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	ดีเรก , ธนรรณพ
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องค์กรฯ	อำนาจ , สุพิมพ์
21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	สุทธิสา , สุวิมล
28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑลลี, ลีดาภา
29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ลีดดาภา
39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านไอซีที	อุราพร , วัชรพงศ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																			
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	แนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	4 ฉบับ	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP126	1,2	4	project2012_01	10 ฉบับ	สูงกว่าเป้าหมาย	1. การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้ ดังนี้ 1.SUPREME2004 2. HURIS (งานเงินเดือน, งานลา,งานค่าส่ง) 3.Admission 4.Alumni 5.Loan 6.งานหลักสูตรกิจกรรม 7.e-Train 8.e-Project 9.SWU-SAP 10.Infoservice <u>หมายเหตุ</u> รายงานในไตรมาสที่ 3 มีสถานะการดำเนินงานเสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น	
		2 โครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 3	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใหม่มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใหม่มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างหน่วยงานนำร่องด้านการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติและมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	ร้อยละ 90	8 เดือน	ก.พ.-ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP109 RAP125 RAP126	2,3,4, 5	1,2,4,5,6	project2012_02	ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ ร้อยละ 91	สูงกว่าเป้าหมาย	<u>กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ในแก่นหน่วยงาน</u> 1.สรุปผลการสำรวจสถานะการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 2.สรุปผลการจัดกิจกรรมให้คำแนะนำการใช้ระบบอย่างถูกวิธี โดยได้เข้าดำเนินงานในหน่วยงานร่วมโครงการ และหน่วยงานที่สนใจ อาทิ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 3.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายไอซีทีของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน(MPM) คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์ ,นคร ,พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP86	1	4,5	project2012_03	-	อยู่ระหว่างการปรับคานแบบและเปิดซองสอบราคา	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป		
		4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ด.ค.54-มี.ค.55	มหัทธวัฒน์ ,นคร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	project2012_04	2 อาคาร	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครื่องข่าย 2 อาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	100	เสร็จสิ้น	
		5	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	เพื่อเปิดบริการการใช้ระบบโทรศัพท์ด้วยระบบ IP Phone และระบบ SIP Phone	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ด.ค.54-มี.ค.55	เฉลิมพล ,ธันยธร ,ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	project2012_05	2 อาคาร	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	100	เสร็จสิ้น	
		6	ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	เพื่อรองรับการขยาย Access Point เพิ่มในอนาคต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	48 AP	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร ,ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	project2012_06	48 AP	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
3	พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	7	บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device	เพื่อเปิดบริการการใช้อุปกรณ์ mobile device ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย - สามารถให้บริการแบบ Roaming ได้	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	อุปกรณ์ Mobile Device 2 ระบบปฏิบัติการ คือ IOS และ Android สามารถใช้งานได้ 2 ระบบปฏิบัติการ คือ IOS และ Android สามารถใช้งานได้	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร ,ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	project2012_07	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ Mobile Device บนระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ ได้แก่ IOS และ Android	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device บนระบบปฏิบัติการ IOS และAndroid เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		8	ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	เพื่อมีข้อมูลสถานะของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้	ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร ,ธันยธร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	project2012_08	10 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		9	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, ธีรยุทธ, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	SAP46	1	4,5	project2012_09	จำนวน 1 แผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกได้แก่ มศว องค์กรฯ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น	
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	2 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, พิชรินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	3,4	1,4,5	project2012_10	-	-	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, สุพิมพ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	project2012_11	-	-	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	2 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, ชนิษฐา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP125	3,4	1,4,5	project2012_12	-	-		30	ยกเลิก	
		13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	เพื่อเปิดบริการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานและเพิ่มช่องทางขอรับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,4,5	project2012_13	-	-		70	ยกเลิก	
		14	พัฒนางานให้บริการพิมพ์ผล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,4,5	project2012_14	ร้อยละ 82	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบและใช้งานทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	100	เสร็จสิ้น	
		15	โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	เพื่อศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี	รายงานผลการศึกษา	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ดิเรก, สันติ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,3,4,5	project2012_15	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	100	เสร็จสิ้น	
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, นคร	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	project2012_16	10 ห้อง	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	100	เสร็จสิ้น	
		17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ไม่ต่ำกว่า 100 คน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อำนาจ, สุพิมพ์	องค์กรฯ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	project2012_17	-	-	ยุบรวมโครงการ ไปร่วมกับโครงการ มศว IT Clinic เคลื่อนที่		ยกเลิก	มีเป้าหมายเดียวกัน โดยจัดบริการที่ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ
		18	จัดทำมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล, นคร	องค์กรฯ	RAP124	1,3,4	1,4,5	project2012_18	มาตรฐานอุปกรณ์ จำนวน 5 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำเอกสารมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 5 อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	19 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเปิดบริการการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	รายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	ไม่ต่ำกว่า 5 รายงาน	1 ปี	ค.ค. 54 - ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วราภรณ์	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	project2012_19	11 รายงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดทำรายงานใหม่เพิ่มเติม ดังนี้ 1.รายงานการให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายงาน 2.รายงานสถิติการจัดโครงการของหน่วยงาน (eProject) จำนวน 1 รายงาน 3.รายการสถิติผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดโครงการ (eTrain) จำนวน 2 รายงาน 4.รายงานสถิติการขอทุนวิจัย มคอ (ROSE) จำนวน 5 รายงาน <u>ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ Website ของระบบ Infoservice</u>	100	เสร็จสิ้น	
		20 ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้จริง	จำนวนงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง	ไม่ต่ำกว่า 1 งานใหม่	1 ปี	ค.ค. 54 - ก.ย.56	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	project2012_20	3 งาน	สูงกว่าเป้าหมาย	การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำรายงานงานที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1.รายงานงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา 2.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร 3.รายงานระบบบริหารงานโครงการ (SWU eProject) 4.รายงานระบบอบรมออนไลน์ (SWU eTrain) 5.รายงานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ROSE)	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																				ผลสำเร็จ
6	เว็บไซต์ มศว	21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	สุทธิสา, สุวิมล	ศูนย์ UOC	RAP123	2,4	1,2,3,4,5	project2012_21		-			ยกเลิก	หาหรือในส่วนงานภายในอีกครั้ง โดยในไตรมาสนี้ ยังไม่สามารถสรุปประเด็นการจัดทำตามการปรับเปลี่ยนของข้อมูลต่างๆจากระบบงานที่มีอยู่
		22	Upgrade Version DotNetNuke	เพื่อติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่	1 ระบบ	6 เดือน	เม.ย.55-ก.ย.55	สุวิมล, ปวีรศร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	2,3,4	1,2	project2012_22	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke เวอร์ชันใหม่	100	เสร็จสิ้น	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	23	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่องระบบสารสนเทศ มคอ	1. นำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. สำรวจสถานภาพและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3. รวบรวมองค์ความรู้จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว 4. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 5. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้ระบบ (user) และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเทคนิควิธีการ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. มีเอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. รายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 3. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว 4. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	2 ปี	ธ.ค.54-พ.ค.55	วิลาวัลย์, พรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP17 RAP125	2,5	1,2	project2012_23	1. เอกสารรายงานสถานะระบบสารสนเทศฯ 13 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จำนวน 13 ฉบับ 3. มีเอกสารเพิ่มเติม 13 ฉบับ 3. มีเอกสารองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา 100 %	ตามเป้าหมาย	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการมีดังนี้ 1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จำนวน 13 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา 100 % หมายเหตุ รายงานในไตรมาสที่ 3 มีสถานะการดำเนินงานเสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น	
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ครินครินทรวิโรฒ	24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล, ศิริศศิเกษม และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_24		-	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	บุคลากรลาออก

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล, วิลาวัลย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP49 RAP123	2,5	1,2	project2012_25		-	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	บุคลากรลาออก
	26	ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งปี	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วันทนา, พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_26	65.87	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ใช้แจ้ง 2. ความพึงพอใจในเกณฑ์ มากและดีมาก แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ดังนี้ 1. ด้านการให้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 69.585 2.ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 69.015 3.ด้านการให้บริการอื่นๆ ได้ร้อยละ 59.06 จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 164 คน	100	เสร็จสิ้น	
	27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วันทนา, พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_27	ความพึงพอใจร้อยละ 63.20	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ใช้แจ้ง 2. พัฒนาโมเดล การจองหอพักแบบ PACK TEAM แยกเล็กการใช้ งาน เนื่องจากพบปัญหาทั้งจากระบบ และผู้ใช้งาน 3. ความพึงพอใจในเกณฑ์ มากและดีมาก แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ดังนี้ 3.1. ด้านการให้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 62.6 3.2. ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 66 3.3. ด้านการให้บริการอื่นๆ ได้ร้อยละ62 จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 51 คน	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																				ผลสำเร็จ
		28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบงานรับสมัครพนักงานออนไลน์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ต.ค.54-ม.ค.55	มณฑล, รีดากา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_28		-			ยกเลิก	เนื่องจากจะมีระบบมาทดแทน จึงยกเลิกการพัฒนา ระบบงานรับสมัครพนักงานออนไลน์
		29	มอดูล ข้อมูลการทำงาน (finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	เพื่อพัฒนาระบบงานนำเข้าข้อมูลการทำงาน (finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ต.ค.54-ม.ค.55	รีดากา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_29		-		30	ยกเลิก	เนื่องจากมีระบบงานอื่นที่มีความเร่งด่วนในการใช้งานและต้องเร่งพัฒนา จึงจำเป็นต้องขอการพัฒนา ระบบงานนำเข้าข้อมูลการทำงาน (Finger scan) ออกไป
		30	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบงานการมีงานทำ online ของนิสิต	ติดตั้งระบบ 1 ระบบ	80	6 เดือน	ธ.ค.54-พ.ค.55	วันทนา, อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_30	ติดตั้ง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		31	มอดูล จองห้อง online	เพื่อพัฒนาระบบงานจองห้อง	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	9 เดือน	ต.ค.54-มิ.ย.55	อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_31		-	1. นำเสนอและหารือกับผู้ใช้ในการออกแบบรายงาน 2. อยู่ระหว่างการปรับหน้าจอลและเขียนโปรแกรมและเพิ่มรายงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากคิดภาระกิจในการพัฒนาระบบงานอื่นที่เร่งด่วนกว่า จึงทำให้การพัฒนา ระบบจองห้องล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	32	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อการบำรุงรักษาระบบใหม่มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มณฑล, รีดากา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP102 RAP123	2,5	1,2	project2012_32	ความพึงพอใจร้อยละ 72	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. จัดทำหน้าจอลสำหรับการออกรายงานประกันสังคม 2. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ export ข้อมูลสำหรับส่งธนาคาร เพื่อโอนเงินคดเบิกให้พนักงานมหาวิทยาลัย 3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2555	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																				ผลสำเร็จ
		33	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบใหม่มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,5	1,2	project2012_33	ความพึงพอใจร้อยละ 74	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ	100	เสร็จสิ้น	
		34	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , สุวิมล และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	project2012_34	ความพึงพอใจร้อยละ 74.2	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 2. ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น	
		35	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลง	ลดลงมากกว่า 90 % ต่อปี	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	project2012_35	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลงมากกว่า 90%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server) เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	
		36	การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	ระยะเวลาในการหยุดให้บริการฐานข้อมูล	น้อยกว่า 1 วัน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ประกิจ , มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	project2012_36	1 วัน	ตามเป้าหมาย	การย้าย server stone database ไปเครื่องใหม่และระบบ backup RMAN ลงเครื่องสต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ และมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในระบบไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ชัยรัตน์ , ปวีศร	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP125	4	1,2,3	project2012_37	100	ตามเป้าหมาย	ได้มีการนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเพิ่มกว่า 100 สื่อ	100	เสร็จสิ้น	
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่นบุคลากรและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ภาณุวัฒน์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP109	4	1,2,3	project2012_38	56 หลักสูตร	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้หลักสูตรตามกรอบสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดการระบบการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , วัชรพงศ์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP86	4	1,2,3	project2012_39		-			ยกเลิก	ปรับเป็นงานวิจัยและได้รับการอนุมัติในโครงการ SOT2BP ปีการศึกษา 2555 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำวิจัย
		40	ICT Competency Training 2012	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ภาณุวัฒน์ , จันทนา , จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP109	4	1,2,3	project2012_40	2 โครงการ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินโครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 11-12 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	เร็วกว่าแผน
		41	- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไซเบอร์ด มศว (SOT2BP)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไซเบอร์ด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงในระบบการศึกษาไซเบอร์ด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบมากกว่า 2,000	1. มีแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 1 เล่ม 2. มีจำนวนรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 3. มีจำนวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน 4. มีจำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงในระบบการศึกษาไซเบอร์ด มศว ไม่น้อยกว่า 12 คน 5. มีจำนวนนิสิตที่ใช้ระบบมากกว่า 2,000	1 ปี 8 เดือน	ต.ค.54-พ.ค.56	อุราพร , สุทิพย์ , ภาณุวัฒน์ , ชัยวัฒน์ , จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP9 SAP13	3,4	1,2,3	project2012_41		ไม่ประเมิน	1. SOT2 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา E-Learning Courseware (เป็นรายวิชาที่ขอรับทุนในภาคการศึกษา 1/2555 จำนวน 44 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2555 จำนวน 7 รายวิชา) 2. SOT2FM: อยู่ระหว่างดำเนินการ (อาจารย์ Mentor จำนวน 16 ท่าน อาจารย์ Mentee จำนวน 32 ท่าน) SOT2BP: อยู่ระหว่างดำเนินการ (อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 7 ท่าน)	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	เป็นโครงการตามปีการศึกษา 2555 (มี.ย 55 - พ.ค. 56) โดยใช้งบประมาณต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2554-2555)
		42	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.12)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	5 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ดิเรก , วัชรพงศ์ , พัชรินทร์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP66	3,4	1,2,3,6	project2012_42	6 โครงการ	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ ตาม บก.12	100	เสร็จสิ้น	
11	โครงการหารายได้	43	โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ศิรินุช , สมบุญ , สุธาทิพย์ , กรณ์ชวีรัตน์ , ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SSAP1	4,5	1,2,3,6	project2012_43	ความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ ได้ส่งมอบงวดสุดท้ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	2 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 56	อุราพร , พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP35	5	6	project2012_44		-	อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างเดิมและผลกระทบ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																				ผลสำเร็จ
โครงการประจำ																				
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	45	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบนานาชาติ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	จันทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP125	4,5	6	project2012_45	มีการประชาสัมพันธ์รายเดือน	ตามเป้าหมาย	ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly	100	เสร็จสิ้น	
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	ภายใน 3 เดือนมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 1.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ	1 แผน	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP23	3,5	4	project2012_46	1 แผน	ตามเป้าหมาย	มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี และดำเนินงานตามแผนฯ	100	เสร็จสิ้น	
		47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	1.คำสั่ง	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ , สุวิมล	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP23 RAP48 RAP50	3,5	4	project2012_47	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยฯ	ตามเป้าหมาย	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	100	เสร็จสิ้น	
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	48	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน 3.มีรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	สมบุญ , นคร , ดนัย , ญาดา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP38	5	4	project2012_48	1. แผนการพัฒนาบุคลากรฯ 1 แผน 2. มีพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 คน/ครั้ง/ปี 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	1. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ตามแผนฯ ในรอบปีงบประมาณ 2555 2. บุคลากรทุกคนได้พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 คน / ครั้ง / ปี 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	
		49	จัดทำแผนอัตรากำลัง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัยและกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP99	5	4	project2012_49	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ปี 2555-2559 เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		50	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คะแนนการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี ทุก 6 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , นคร , ดนัย , จันทนา	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP104	5	4	project2012_50	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้มีการปรับปรุงคู่มือจำนวน 3 งาน ดังนี้ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานการเงินและบัญชี 3. งานพัสดุ	100	เสร็จสิ้น	
		51	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , สุรชาติพย์	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP122	5	4	project2012_51	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	
		52	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP83	5	4	project2012_52	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายไตรมาส	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4/2555 และทบทวนเพื่อจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2556	100	เสร็จสิ้น	
		53	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์ , มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP85	5	4	project2012_53	6/9/12 เดือน	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ผลการประเมินได้คะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	
		54	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์ , มหัทธวัฒน์ , พิชรินทร์	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP85	5	4	project2012_54	มีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน 1 แผน และรายงานทุก 6/9/12 เดือน	ตามเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	
		55	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์ , มหัทธวัฒน์ , ชุติศรี	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP85	5	4	project2012_55	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มคอ 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย. 55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , มหัทธวัฒน์ , พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	project2012_56	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1. เนื่องจากในปีนี้ มหาวิทยาลัยใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 เป็นผลการประเมิน ก.พ.ร. แทน ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 2. อยู่ระหว่างจัดประชุม ทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีการศึกษา 2555	100	เสร็จสิ้น	
		57	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จัก การประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อ เสริมสร้างการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาค การศึกษา	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ฐิตาภา และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP85	5	4	project2012_57	1 แผน รายงานภาค การศึกษา	ตามเป้าหมาย	1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม 5ส 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส โดยเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ 5ส และ จดหมายข่าวกิจกรรม 5ส	100	เสร็จสิ้น	
		58	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ รายงานการวิเคราะห์ ผล	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก , จันทนา , สาวิตรี , เฉลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP93	5	4	project2012_58	1 แผน รายไตรมาส	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มาตรการประหยัดพลังงาน และจดหมายข่าวผ่าน เว็บไซต์ระบบคิดดี	100	เสร็จสิ้น	
4	ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม นโยบาย มหาวิทยาลัย	59	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ถาวร และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP31 (3)	5	4	project2012_59	3 กิจกรรม ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการโครงการ ถวายเทียนพรรษา 2. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ 2555	100	เสร็จสิ้น	
		60	ภาษาไทยเข้มแข็งและรัก การอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ธนรณพ , วรเศรษฐ์ , เฉลิมพล ปวรวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	project2012_60	1 กิจกรรม ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ด้วยไอที โดยจัดทำเป็นสกรีนเซฟ เวอร์ จำนวน 2 สาระ คือ ส่วนภาษาไทย และ การละเล่นไทย	100	เสร็จสิ้น	
		61	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	จันทนา , สุเมธ , ถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	project2012_61	1 กิจกรรม ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	จัดโครงการรณรงค์จิตอาสาและจิตสำนึก สาธารณะ กิจกรรม : พัฒนาโรงเรียน โดยนำ นิสิตและบุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ และ บุคลากรจากหน่วยงานอื่น ที่มีจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้าน ดอนกลาง (ศึกษาศึกษาคร)	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	62	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วระเศรษฐ์ , จักรพันธ์ , ญาดา , ชุศรี , สุกัญญา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP95	5	4	project2012_62	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเล็กๆ และจัดต้นไม้รอบอาคารและในห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และพื้นที่ให้บริการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์	100	เสร็จสิ้น	
