
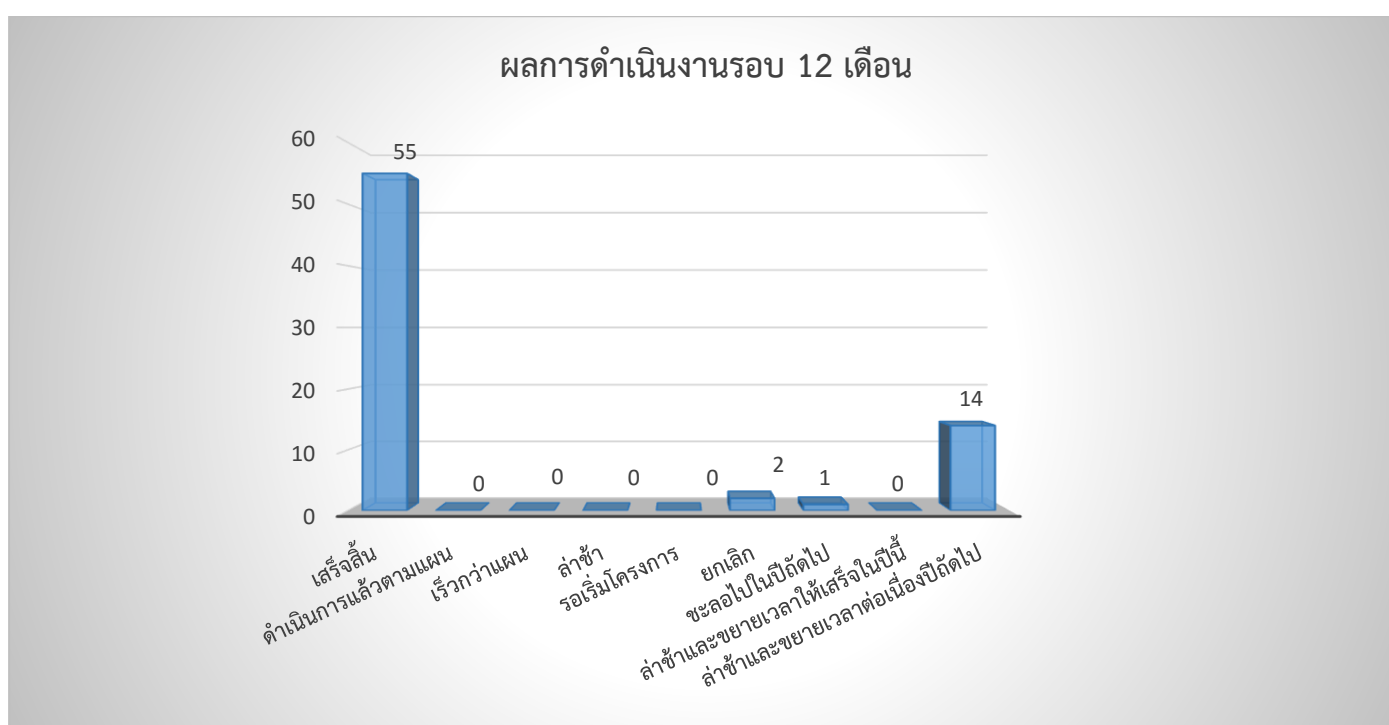


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ผลดำเนินงาน		จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ	จำนวน โครงการย่อย/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	ร้อยละ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558		72	100.00	55.00	76.39
1.1	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	56	77.78	39	54.17
	โครงการตามแผน	48		31	
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2	5		5	
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3	3		3	
	1.2	โครงการประจำ	16	22.22	16.00
2	สถานะผลการดำเนินงาน			ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	55	76.39	76.39	3.82
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0.00	23.61	
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	2	2.78		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	1	1.39		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	14	19.44		
รวม		72	100.00		100.00

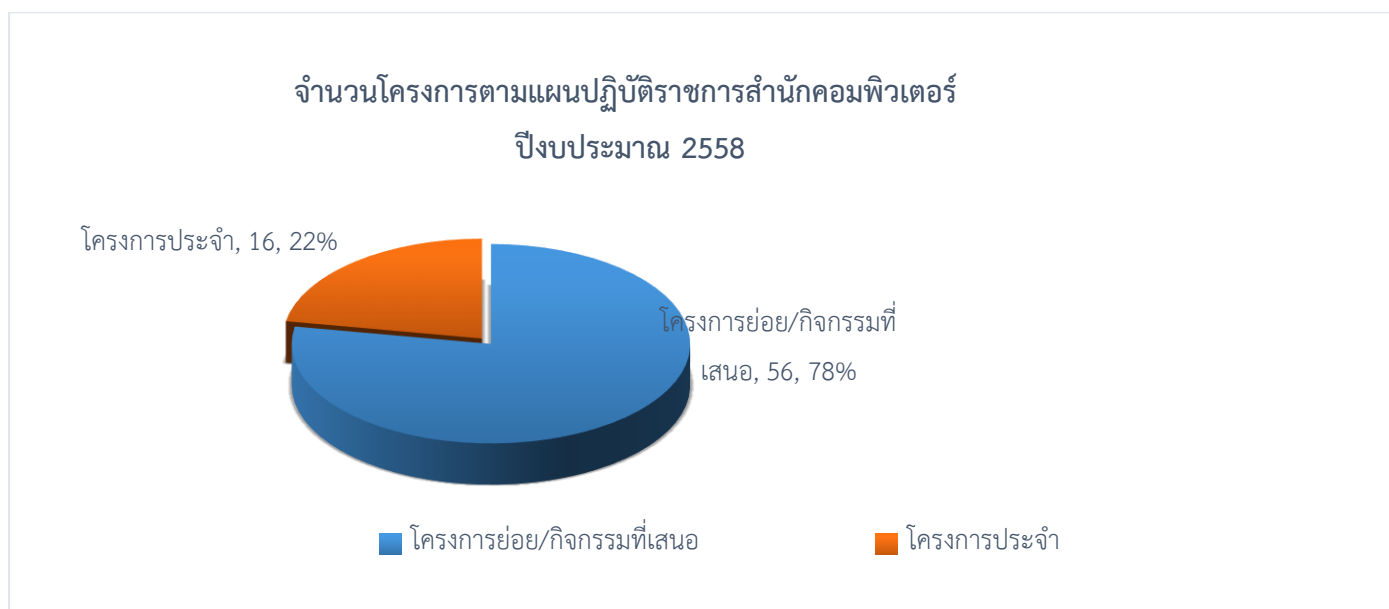

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	ภาคภูมิ ญาติา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	ภาคภูมิ ญาติา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	ภาคภูมิ ญาติา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร (Radius)	นคร ญาติา ชนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร ชนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	นคร ญาติา ฉันทธร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	วันทนา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	สุทิสรา กฤษดา กาญจนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	วันทนา	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	วันทนา กัลยา	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	มณฑล ฐิตาภา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
28	โครงการบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กัลยา กาญจนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
29	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	อมรรัตน์ ฐิตาภา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online	อมรรัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

	โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
32	โครงการระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	สุทิสา วิลาวัลย์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	สุวิมล ปวีศร ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สุวิมล ปวีศร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ (CMS)	ปวีศร สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย ปวีศร สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีศร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิดา พรทิพย์ นคร สันติ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	อ.อรุณพ พัชรินทร์ दनัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
49	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	วรเศรษฐ์ ภัทรชัย ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
50	โครงการพัฒนาระบบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร	สุทิสา พรทิพย์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
51	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร	กัลยา อมรรัตน์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
52	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	คณะกรรมการ ISM	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
53	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สันติ และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
53	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สันติ และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
54	โครงการปรับระบบรับนิติใหม่ (รับตรง) รอบ 2 (การประมวลผลคะแนน O-NET และ การใช้คะแนนสูงสุดของสทศในการยื่นสมัครได้)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
55	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ ผศ.วัชรชัย สุทิสา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
56	กิจกรรม : (ร่าง) ข้อกำหนด และรายละเอียดโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ สุทิสา กัลยา กฤษฎดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
งานประจำ				
57	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	วณิชยา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
58	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ศศ.วัชรชัย ประกิจ สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
59	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	สมบุญ มัทธวัฒน์ นคร दनัย ญาดา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
60	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ दनัย จันทนา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
61	การบริหารแผนการใช้งบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ กรัณฑ์รัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
62	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ พัชรินทร์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
63	การประกันคุณภาพ	อ.อรรณพ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
64	การควบคุมภายใน	อ.อรรณพ มัทธวัฒน์ กรัณฑ์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
65	ระบบบริหารความเสี่ยง	อ.อรรณพ มัทธวัฒน์ กรัณฑ์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
66	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	พัชรินทร์ มัทธวัฒน์ พรทิพย์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
67	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	จักรพันธ์ วรรณี และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
68	การประหยัดพลังงาน	ดิเรก สันติ จักรพันธ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
69	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	อ.อรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
70	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ศศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
71	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สุธาทิพย์ ถาวร อุตร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
72	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	ศิริศศิเกษม दनัย พัชรินทร์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวิวัฒน์ นคร ภาคภูมิ	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	มัทธวิวัฒน์ นคร เฉลิมพล	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	มัทธวิวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล ธนภฤต	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	มัทธวิวัฒน์ ประกิจ ธัญธร	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	มัทธวิวัฒน์ ภาคภูมิ ธนภฤต	เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอจัดประชุมกับคณะต่างๆ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ในปีการศึกษา 2558ต่อไป
16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเติมมอดูลการทำงานหลายงานที่ไม่มีในแผนการพัฒนาเดิม ดังนี้ 1.งานอัปเดตเอกสาร มคอ.1 และ มคอ.2 2.งานบันทึกข้อมูล Curriculum Mapping 3. งานกำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล มคอ. (หน่วยงานเจ้าของวิชา) 4.งานติดตามการบันทึก มคอ. ส่งผลกระทบให้งานที่ดำเนินการไม่เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนในปีถัดไป
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการทำงานนี้ได้
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา กฤษดา	ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการ
26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ
34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย สุวิมล	ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร Apple Developer และ Google Developer มีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการยืนยันหลักฐานในการยืนยันตัวตนขององค์กรที่การสมัคร
36	ศึกษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร
41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวีตร ภัทรชัย	ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1.จัดทำห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ (Self Service Studio) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์/บุคลากร 2. ควรมีนโยบายในการผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ วันทนา ธัญธร สุธาทิพย์ กรัณธ์รัตน์ ไพโรจน์ ธนรรณพ	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและดำเนินโครงการ"งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในอดีต)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	ผช.วัชรชัย และทีมงาน	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้อบรม ในโครงการบริการ วิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ทำให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการไป ปีงบประมาณ 2559 แทน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการทำงานนี้ได้
47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ พัชรินทร์ นคร พรทิพย์ สันติ	1. เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงทำให้ไม่มี เวลาที่ตรงกันจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. การปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

คำชี้แจง :

1. **ตัวอักษรสีแดง** หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ ยังไม่เริ่มโครงการ ยกเลิก และโครงการมีความล่าช้า
2. **ตัวอักษรสีเขียว** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-4

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ						
โครงการย่อย/กิจกรรม																											
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	จำนวน 1 ห้อง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ นคร ภาควิชา	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับแบบ TOR และ BOQ ของห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับมอบแบบบูรณาการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
	2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ นคร เฉลิมพล	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียบร้อยแล้ว และรอดำเนินการประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณถัดไป	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป
	3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหารหอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อม องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล ธนกุล	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียบร้อยแล้ว และรอดำเนินการประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณถัดไป	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป
	4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	จำนวน AP ที่ติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา เฉลิมพล	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียบร้อยแล้ว และรอดำเนินการประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณถัดไป	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2	
	6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็น Windows 2012R2 และสามารถให้บริการ Cloud Computing ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กร	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียบร้อยแล้ว และรอดำเนินการประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณถัดไป	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป
	8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวน 1 ระบบปฏิบัติการที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร (Radius)	เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวน 1 ระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สายที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร จำนวน 1 ระบบ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร	เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร	จำนวนพื้นที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ (Location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวน 1 พื้นที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร เสร็จสิ้นเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)	เพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเดิม	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวน 1 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ทดแทนระบบเดิม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตร และองค์กรฯ	จำนวนอุปกรณ์เครือข่าย (Config) ที่จัดเก็บ	10 อุปกรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นศร ฤชดา ฉันยธร	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	จำนวน 1 ระบบจัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำโปรแกรมจัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์	จำนวนระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนา	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ฉันยธร เฉลิมพล	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	จำนวน 1 ระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนาเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แสดงสถานะระบบโทรศัพท์ และสามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4586	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ภาควงมิต ธนฤต	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป			รอดำเนินการเผยแพร่กับคณะต่างๆ ในปีการศึกษา 2558	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอจัดประชุมกับคณะต่างๆ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ในปีการศึกษา 2558ต่อไป
	15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	จำนวนผู้ใช้ (Google Apps)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ฉันยธร เฉลิมพล	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งาน Google Apps เพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 จากจำนวนผู้ใช้งาน 9,939 บัญชี ถึงเดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวนผู้ใช้งาน 12,551 บัญชี	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
3. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อ นิสิตและบุคลากร	16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80 ของผู้ให้บริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป			1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3. อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ภัทรชัย													ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	สูงกว่าเป้าหมาย	กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้ “ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)” เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ มศว ประสานมิตร และทางกองแผนงานได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา																1. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ไข โปรแกรม และทดสอบการใช้งานโดยผู้พัฒนาระบบ 1.1 งานบันทึกข้อมูล มคอ.3 1.2 งานติดตามการบันทึกข้อมูล 2. พัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความต้องการผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูลและคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมและดำเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้ใช้ 5. ให้คำแนะนำ ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	85%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	1.ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับผิดชอบ โดยวิธีรับตรง)	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับผิดชอบ โดยวิธีรับตรง)	ตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษัท 2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 5. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ ในการใช้งานโปรแกรมเพื่อดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1.เพื่อจัดทำระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า 2.เพื่อให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 3.ผลักดัน/ส่งเสริม การใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กฤษดา		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำและประสานงานบริษัทที่พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำระบบแก่มหาวิทยาลัย 3. ร่วมในการร่างเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ได้ส่งมอบเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ให้กับหน่วยงานกองกลางเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสากฤษดา กัญญา		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. การพัฒนาและติดตั้งระบบ webservice register หรือ http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister/ เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย 2. ให้บริการกับหน่วยงาน ได้แก่สถาบันยุทธศาสตร์ และวิจัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวหน่วยงาน เป็นต้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา				📖	×	×	×	×	×	×	×	✎	1. งานใหม่ 7 มอดูล 2.งานปรับปรุง 4 มอดูล 3.รายงาน 2 รายงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษัท 2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 5. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ ในการใช้งานโปรแกรม ในช่วงกิจกรรมการจองหอพักของนิสิตรุ่นพี่ และนิสิตใหม่ ประจำปีภาค/ปีการศึกษา 1/2558	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา				📖	×	×	×	×	×	×	×	✎			เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ดูแลระบบจองรถส่วนกลางมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ) ในการนำข้อมูลรถบริษัทมาบันทึกในโปรแกรม และได้ตรวจสอบโปรแกรมแล้ว พบว่าระบบเดิมสามารถรองรับการทำงานดังกล่าวได้ ทางศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ จึงขอให้หน้าจอกการทำงานเดิม	0%	ยกเลิก	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการทำงานนี้ได้
	24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 5 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กัลยา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	จำนวน 37 หน่วยงานที่ใช้ระบบ	สูงกว่าเป้าหมาย	หน่วยงานศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อ.นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร โดยมีจำนวนบุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 47 ท่าน จาก 37 หน่วยงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
5.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	2 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลวิฑูตาภา กฤษดา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			งานสัญญาจ้าง 1. อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูลสัญญาจ้างเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน 2. จากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอและเงื่อนไขการแสดงผลการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการ	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	งานสัญญาจ้าง 1. อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูลสัญญาจ้างเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน 2. จากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอ และเงื่อนไขการแสดงผลการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการ
	26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2.เพื่อจัดทำร่างเอกสาร TOR ระบบบริการการศึกษาใหม่	1.เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่าง	1.เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 ฉบับ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่างจำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์พรทิพย์ อมรัตน์ วันทนา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1.ดำเนินการจัดทำเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบเสร็จสิ้น 2.การจัดทำเอกสาร TOR ฉบับร่าง ยังไม่ดำเนินการ	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสาร TOR ได้เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลวิฑูตาภา กฤษดา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70	ตามเป้าหมาย	1. ปรับโปรแกรมเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับค่าจ้าง โดยเมื่อคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจนถึงทศนิยมสองตำแหน่ง ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 2. ตรวจสอบค่าน้ำหนักข้อมูลในของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ กับตำแหน่งในอัตราค่าจ้าง 3. จัดทำหน้าจอสำหรับตรวจสอบค่าน้ำหนักข้อมูลในของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4. ออกแบบหน้าจอสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานสอน 5. ออกแบบหน้าจอสำหรับจัดเก็บข้อมูลการบันทึกกิจกรรมสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กัลยา กาญจนมา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูล/รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	29	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, E-Survey, E-Project, E-Document)	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ รุธิตภา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ให้คำปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ส่งเสริมการใช้แก่ผู้ใช้งาน	100%	เสร็จสิ้น	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ
	31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ให้คำปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลือ ระบบจองห้องออนไลน์ และแนะนำระบบ เพื่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. ปรับแก้ไขหน้าจอรอสมัครจอง โดยเพิ่มหมายเหตุการอนุมัติ 3. ส่งเสริมการใช้งานและจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน ตามความต้องการของหน่วยงาน 4. หน่วยงานที่เริ่มใช้ในปี 2558 คือ สำนักหอสมุดกลาง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
8.ระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย	32	โครงการระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสนับสนุนการใช้งานให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จัดทำระบบใหม่	ความสำเร็จของโครงการ	1 มีระบบคลังข้อมูล 1 ระบบ 2. มีผู้ใช้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 3. มีเว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสรา วิลาวลัย	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	1. ระบบงาน 1 ระบบ 2. มีผู้ใช้งาน 1 หน่วยงาน (ต่ำกว่าเป้าหมาย) 3. มี 1 เว็บไซต์ แต่ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. ปรับปรุงคลังข้อมูลบนระบบ SUPREMEplus โดยทำการปรับข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน ได้แก่ ipass ,wise เป็นต้น 2. ปรับปรุงให้ข้อมูลสามารถให้บริการได้มากกว่า 1 ทาง เช่น ให้สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บน web service ได้	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Hosting	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีศรี ชัยวัฒน์				☺	×	×	×	×	×	×	×	☺	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย Windows Server 2012 ทั้ง Web Server และ Database Server และได้เปิดพื้นที่ให้บริการสำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
	34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล							☺	×	×	×	×	☺			ทำการสมัครลงทะเบียนเป็นนักพัฒนา ระบบ Google Developer และ Apple Developer เรียบร้อย	30%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร Apple Developer และ Google Developer มีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการยืนยันหลักฐานในการยืนยันตัวตนขององค์กรที่ทำการสมัคร	
	35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีศรี	☺	×	×	×	×	☺								จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
	36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดหาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีศรี สุวิมล							☺	×	×	×	×	☺			ศึกษาข้อมูล และทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source	30%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร	
	37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ (CMS)	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	จำนวนเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีศรี สุวิมล														จำนวน 5 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN" ให้กับหน่วยงาน และคอยให้คำปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ ปัจจุบันได้มีหน่วยงานสนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วย DNN ประมาณ 30 เว็บไซต์	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
10.ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งระบบ LMS เพิ่มเติม	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย สุวิมล	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺	ติดตั้ง LMS ทางเลือก 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ iTunes U เรียบร้อยแล้ว 2. ศึกษาและทดสอบการตั้งค่า site ,การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ใน , การ Import ข้อมูล นิสิตและอาจารย์เข้าระบบ Moodle	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	รายงานผลการบำรุงรักษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	รายงานจำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. ทำการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือนเดิมให้มาทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ Server โดยสามารถเพิ่มความเร็วด้านการประมวลผล/การเข้าถึงข้อมูลบนดิสก์ การสำรองข้อมูล ทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านบริการและรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น 2. ประสานงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการติดตั้ง HTTPS เพื่อเข้ารหัสการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 3. ทดสอบการทำงานของมอดูลหลักใน ATutor เวอร์ชัน 2.2	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดทาระบบจัดเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานผลการศึกษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีริศ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Digital Portfolio ต้นแบบเว็บไซต์ http://10.1.3.248/portfolio/swu/bootstrap/pages/swu.html	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	เพื่อเปิดบริการห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ของตนเอง (Self Service Studio) เปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้	จำนวนสื่อการเรียนรู้	ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวีริศ ภัทรชัย		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการนำร่อง "เผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนระบบ iTunes" มีผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน จากการติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อได้สมบูรณ์ที่จะเผยแพร่	60%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1. จัดทำห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ของตนเอง (Self Service Studio) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์/บุคลากร 2. ควรมีนโยบายในการผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
11.โครงการ Google Apps เพื่อการศึกษา	42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล	☺	×	×	×	×	×	☺							จำนวน 1 ระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	ตามเป้าหมาย	สร้างเครื่องมือ SWUCC GAFE สำหรับเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเข้าสู่ Google Calendar	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
12. โครงการจัดหารายได้	43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ 2. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้อบรมในโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก 3. อยู่ระหว่างการหาแนวทางหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30%	ชะลอไปในปีถัดไป	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้อบรมในโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ทำให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการไปในปีงบประมาณ 2559 แทน
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ วันทนา อัญจร สุธาทิพย์ กรัณท์รัตน์ ไพโรจน์ อนุธรรมพ	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺			1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือการจัดเตรียมงาน Open house ครอบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์ 2. อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน Open house ครอบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและดำเนินโครงการ"งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน
	45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิดา พรทิพย์ นครสันติ	☺	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☺	มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เมื่อวันที่ 7 และ 10 - 11 สิงหาคม 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และโรงแรมเพลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วม จำนวน 45 คน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรพรรณ พัทธินทร ดนัย		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	2 กิจกรรม ศึกษาดูงาน	ตามเป้าหมาย	ผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านไอที โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Developing a Prototype of Sonoporation Sytem using Ultrasound Technique for Implementation in Drug Delivery เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Sarawak ประเทศ Malasia 2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิทัล ตามโครงการเพื่อการวิจัยอาเซียน ACSCG ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ (ร่าง)	1 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พัทธินทร นครพรทิพย์ สันติ															ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2558	0%	ยกเลิก	1. เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงทำให้ไม่มีเวลาที่ตรงกันจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. การปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการที่ยู่งยากและซับซ้อน
14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เพื่อจัดให้บริการความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บรรลุ 5 ข้อ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ศิริศศิเกษม จิตติมา		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 สรุปดังนี้ (1) ผู้เข้ารับการอบรม 66 คน (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 164,167.00 บาท (3) รายงานผลการดำเนินงานส่งศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้ 3.1 รายงานผลสรุปผลการดำเนินโครงการ 3.2 รายงานผลฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์ในเล่ม รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4) รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1748	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
2.โครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	52	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	จำนวน 4 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ISM				📖	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 4 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมแบบประเมินฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เห็นชอบต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ 3. ดำเนินการเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ใช้ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	53	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย อีกทั้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	จำนวน 1 ระบบ	สำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ				📖	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายพร้อมทั้งได้จัดอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประสานมิตร รวม 360 เครื่อง 1. สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 104 เครื่อง 2. บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 42 เครื่อง 3. สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 149 เครื่อง 4. สำนักงานอธิการบดี จำนวน 55 เครื่อง (กองกิจการนิสิต, กองบริการการศึกษา) 5. หน่วยงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง องค์กรฯ รวม 423 เครื่อง 1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ รวม 88 เครื่อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
งานประจำ																										
1.การณรงคู้จัก SWU IT Services	57	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	สำนักงานผู้อำนวยการ	วณิชยา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	มีการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	58	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1.เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2.เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3.เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2.จำนวนกิจกรรมตามแผน	1. 1 แผน 2.จำนวน 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย ประกิจสุวิมล	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	1. จัดประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย 2. รายงานผลการดำเนินงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 4 โครงการวิจัย และโครงการที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน 1 โครงการวิจัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	59	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1. 1 แผน 2. อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ มัทธวัชวินนนคร ดนัย ญาดา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	1. แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 1 ฉบับเป็นไปตามแผน 2.บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 96 % ต่ำกว่าแผน 100 %	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ได้รับการพัฒนา 96 %) 2. รายงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และประชุมที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	60	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ นครสันติ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	คู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1 ฝ่าย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณาการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ 2. ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มีการนำคู่มืองานสารบรรณ หัวข้อกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	61	การบริหารแผนการใช้งานงบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	รายไตรมาส	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ กรัณท์รัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ทุกรายไตรมาส	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	62	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมัญญา พัทชรินทร์ บุศรารักษ์		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	□	มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทุกรายไตรมาส 2. มีรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกรายไตรมาส 3. ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบ SWU-SAP	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	63	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ ไพโรจน์ศิริศิริเกษม บุศรารักษ์		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ QA SAR Online และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง 2557 2. สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ผลการตรวจประเมินเท่ากับ 4.57 คะแนน 3. สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
	64	การควบคุมภายใน	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ มหัทธวัฒน์กรัณท์รัตน์		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ป	มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. มีการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ทุกรายไตรมาส 2. มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกรายไตรมาส	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	65	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรณพ มหัทธวัฒน์ กรัณษร์ธน์	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	1.มีแผนบริหารความเสี่ยง 2.มีการรายงานผลมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิตความเสี่ยง 3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 4. มีการติดตามความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
	66	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดพร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ บุศรารักษ์	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
	67	การดำเนินงานโครงการ 5ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. รายงานผลการศึกษ	สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ วรรณิ และทีมงาน	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีการรายงานผลมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส สำนักคอมพิวเตอร์ "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย" Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11 - 14 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และอาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ 2. มีรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
	68	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	ดิเรก สันติ จักรพันธ์	📖	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✎	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีการรายงานผลมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	1. ติดโปสเตอร์กิจกรรมการประหยัดพลังที่บอร์ดชั้น 11 2. รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากร 3. มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ						
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	69	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	มี	จัดอบรม 1 ครั้ง	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เนื่องจากการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที เป็นการอบรมสำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ดังนี้ 1. ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนเป็นกลางเดือนสิงหาคม 2558 จึงทำให้การเปิดอบรมไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. หน่วยงานดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเชิญบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร 3. สำนักคอมพิวเตอร์มีการจัดอบรมโดยเป็นการอบรมที่มีชื่อแตกต่างกันแต่เป็นงานด้านบริการวิชาการ เช่น โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือโครงการนำร่อง “เผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนระบบ iTunes U”	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
	70	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเรื่อง Business Intelligence สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ไอทีในการทำงานจริง	จำนวนการจัดอบรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผศ.วัชรชัย ชนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา		×	มี												มีจัดอบรม 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 139 คน 2. จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 3. รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	71	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	สุรชาติพย์ถาวรอุดร		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2. จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ "สี่สัปดาห์วันวาน สงกรานต์ บ้านฉ่ำ" เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในโอกาสระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2558 เป็นวันสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทย	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
	72	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ศิริศศิเกษม ดนัยพัชรินทร์		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1 กิจกรรม	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 24 คน 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 40,387.50 บาท 3. รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1882	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
