
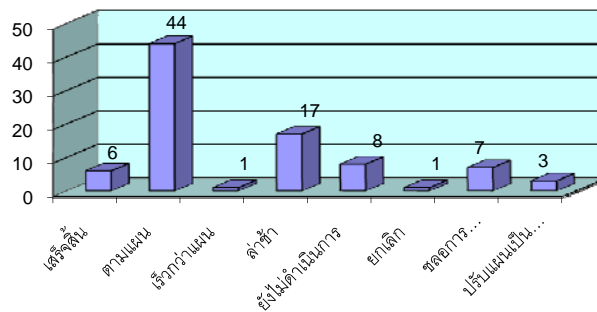



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2553)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2553	87	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	82	94.25
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	5	5.75
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	6	6.90
2.2 ตามแผน	44	50.57
2.3 เร็วกว่าแผน	1	1.15
2.4 ล่าช้า	17	19.54
2.5 ยังไม่ดำเนินการ	8	9.20
2.6 ยกเลิก	1	1.15
2.7 ชลอการดำเนินงาน	7	8.05
2.8 ปรับแผนเป็นปี 2554	3	3.45
รวม	87	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2553



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

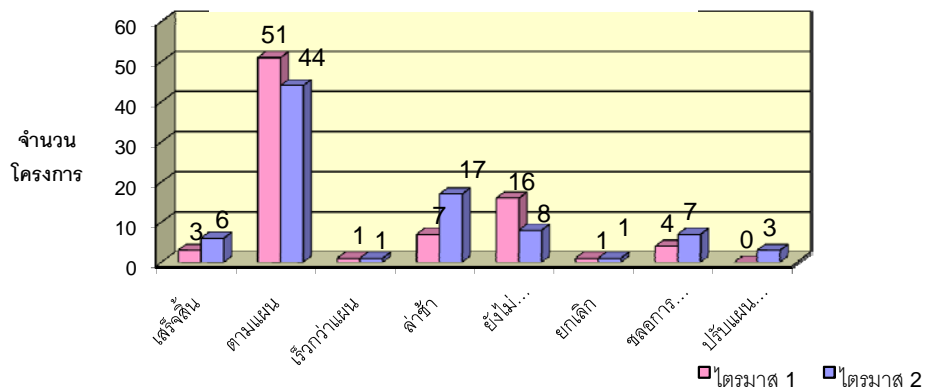

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																														
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ไอซีที	1 จัดทำคู่มือการดูแล และให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการ จัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และ บุคคลทั่วไป	1 ปี																				4,7,9	142 161 203	ดำเนินการผลิตเอกสาร SWU IT Tools	40	ตามแผน		
		2 คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2553	เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการ ของมหาวิทยาลัย	1 ปี																					4,7,9	142 161 203	ศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของ กระทรวง ICT	40	ล่าช้า	
		3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ บริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่าย ประจำปี	3 เดือน																					4,7,9	142 161 203	ประชุมหารือเพื่อวางแผนการ ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา เครือข่าย	10	ตามแผน	
		4 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร มศว	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แก่ นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ	9 เดือน																					4,7,9	142 161 203	- ดำเนินการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี อยู่ ระหว่างดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ มศว (ISM) - จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมข้อมูล http://secure.swu.ac.th	60	ตามแผน	
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 2550	5 ระบบลงทะเบียน MAC Address	เพื่อให้สามารถระบุ หมายเลข hardware address ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ในระบบเครือข่าย	10 เดือน																			4,7,9	203	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ ลงทะเบียน MAC Address	20	ตามแผน			
		6 ทะเบียนการใช้บริการ Internet Passport	เพื่อทำรายงานการใช้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Ipass	8 เดือน																				4,7,9	203	เก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบ	20	ตามแผน		
3	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องให้บริการ VPN	เพื่อให้สามารถใช้งาน VPN ได้ขณะ Virtualized ไม่ สามารถทำงานได้	1 เดือน																			4,7	142	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น			
		8 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล buasri ID ให้ทันสมัย	9 เดือน																				4,7	142	ตรวจสอบข้อมูล Buasri ID	20	ตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)
	9	จัดทำระบบ Disaster Recovery Site : กรณี สำนัก หอสมุดกลาง เพื่อรองรับมาตรการ ป้องกันความเสี่ยง (RISK)	เพื่อให้สามารถกู้คืน ข้อมูลได้เมื่ออาคาร สำนักคอมพิวเตอร์ เกิดปัญหาภัยพิบัติ	1 ปี	☑						☑	☑	☑	☑	☑	☑					4,7	142	ดำเนินการประสานงานกับสำนัก หอสมุดกลางแล้วรอทำหนังสือไปยัง สำนักหอสมุดกลาง	60	ตามแผน			
4	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายไร้ สาย (WISE)	10	เพิ่มอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ Access Point	เพื่อให้บริการ เครือข่ายไร้สายได้ มากยิ่งขึ้น	1 ปี	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	200	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น			
		11	ศึกษาวิจัยและติดตั้ง ระบบ Voice Over Wireless	เพื่อศึกษาระบบ โทรศัพท์ผ่าน เครือข่ายไร้สาย	8 เดือน	☑						☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,5,7	200		0	ปรับแผนเป็นปี 2554		
5	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย	12	วิเคราะห์สถานะระบบ โทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัย	เพื่อทราบสถานะของ ระบบโทรศัพท์ ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	4 เดือน			☑			☑	☑	☑								4,7	200	กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์	20	ล่าช้า			
		13	การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อให้ระบบ Rtel มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	4 เดือน			☑					☑	☑	☑	☑	☑					4,7	200	กำลังทำการทดสอบการใช้งานระบบ sip phone	30	ตามแผน		
6	ขยายบริการไอที เพื่อผลิตและบุคลากร	14	จัดหาเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	6 เดือน	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑							1,2,3	64 66	1. กำหนดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 2. เปิดซองซองราคา วันที่ 7 มี.ย. 3. คาดว่าจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ เดือน ก.ค.	90	ล่าช้า			
		15	การติดตั้งระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิดบริการ ให้แก่นิสิตในปี การศึกษา 2553	2 ปี	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		1,2,3	65 66	- อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบครุภัณฑ์	20	ล่าช้า		
	ปรับปรุงบริการ คอมพิวเตอร์ อาคาร เรียนรวม องค์รักษ์	16	ปรับปรุงบริการ คอมพิวเตอร์ อาคาร เรียนรวม องค์รักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	66 66	เฟส1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เฟส2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1. เตรียมติดตั้งเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ 2. เตรียมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 3. กำลังเปิดซองระบบกล้องวงจรปิด 4. กำลังดำเนินการเปิดซองครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้	80	ล่าช้า			
		17	ขยายจุดบริการแก่นิสิตและบุคลากร แบบ Kiosk Information System	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	67 66	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	10	ตามแผน	- จุด มุมการเรียนรู้ style IT - รอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 (เพิ่มเติม) เสนอจัด kiosk 1 ตัว	
		18	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอบรับ บริการ IT ออนไลน์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	5,6	202	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ	40	ล่าช้า		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																												คค	พย	ธค
7	ระบบ ICT Competency ของ นิสิตและบุคลากร ระยะเวลาที่ 2	19 พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบ หลักสูตรการพัฒนา สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและ นิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้า		
		20 จัดทำระบบสอบวัด สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่ บุคลากร และ นิสิต	เพื่อทำการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ ด้าน ICT ตามกรอบ มาตรฐานของ มหาวิทยาลัย	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้า	
		21 การจัดทำคลังข้อ คำถามเพื่อการสอบวัด สมรรถนะ ICT	เพื่อใช้ในการทำสอบ แบบ Online	2 ปี (52-53)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	51 56 57 58	- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อคำถามเพื่อการ สอบวัดสมรรถนะ ICT ครั้งที่ 2 เพื่อ try out ครั้งที่ 2	60	ตามแผน	
		22 จัดทำ Courseware เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้าน ICT	เพื่อให้ นิสิตและ บุคลากรสามารถเข้า ศึกษาด้วยตนเอง	9 เดือน		☑	☑						☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ	10	ล่าช้า	ใช้งบประมาณ บค.13 (400,000)
8	SWU Hybrid Education	23 SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	เพื่อส่งเสริมนโยบาย การพัฒนา E-Learning Courseware ของ มหาวิทยาลัย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	51 56 57 58	เตรียมดำเนินการโครงการ	30	ตามแผน		
		24 ICT Competency Training	เพื่อพัฒนา นิสิตและ บุคลากรให้เป็น ผู้รู้ไอที และผู้สารสนเทศ	1 ปี	☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	- อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา สมรรถนะด้านไอที ครั้งที่ 4 (ต.ค. 52- ก.พ.53) - เตรียมจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอที ครั้งที่ 5 (เม.ย.-มิ.ย.53)	60	ตามแผน		
		25 กิจกรรมพัฒนาศาสตร์สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการ ให้ความรู้ด้านไอทีที่ แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี						☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3,6	169 201	เตรียมประชุมหารือ	10	ล่าช้า		
		26 การบริการวิชาการแก่ ชุมชน (บค 13)	เพื่อจัดให้บริการ ความรู้ประชาชนใน เรื่องการประยุกต์ ไอที	1 ปี			☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3,6	108 109	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	60	ตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	27	ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,6	201 202	ได้จัดกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน (วันที่ 9 และ 29-30 มกราคม 2553) - กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว http://publications.swu.ac.th	70	ตามแผน	
		28	เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	3 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	5,6	201 202		100	เสร็จสิ้น
10	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREME Plus	29	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	3 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ	50	ล่าช้า	- ศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วย php framework ส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - รอคอยปรับย้าย Server ที่ใช้ Develop
		30	ติดตั้งระบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199	?? ดำเนินการถึงไหนแล้ว	0	ยังไม่ดำเนินการ	
11	ระบบ SWU Information Portal	31	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว	9 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199	อยู่ระหว่างการศึกษานำ Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ตามแผน	
		32	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	เพื่อให้บัณฑิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว	9 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199	อยู่ระหว่างการศึกษานำ Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ตามแผน
12	ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ (FISCAL : FInancial Information System, Cost Accounting and Logistics)	33	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อติดตั้งระบบการบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2. เพื่อติดตั้งระบบบริการการเงินและบัญชี 3. เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ 4. เพื่อติดตั้งระบบในการแสดงข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ	3 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,9	199	ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากรอสำนักงานอธิการบดีดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและจัดหาระบบ	0	ขาดการดำเนินงาน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
13	เว็บไซต์ มศว 2553	34	ติดตั้ง Feature ใหม่ใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	5,6	115 202	- Thai Version อยู่ระหว่างการ ออกแบบโครงสร้างใหม่ และคุย รายละเอียดในการจัดทำ - English Version อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงจากทาง บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะปรับปรุง Content ที่ Template เดิมเป็นการ ชั่วคราวก่อน	20	ล่าช้า				
		35	เว็บไซต์ Graphic Identity	3 เดือน	☑	☑					☑	☑	☑									5,6	115 202	- ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้าง ของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการออกแบบ graphic จาก อ.วรรณวรุณ	20	ล่าช้า			
		36	เว็บไซต์ IT Service Portal	4 เดือน	☑	☑									☑	☑	☑	☑				5,6	115 202	ปรับแผนดำเนินการจะเริ่มในไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ			
		37	ติดตั้งเว็บไซต์ The President	3 เดือน	☑	☑					☑	☑	☑								5,6	115 202	ทำการออกแบบโครงสร้างของ เว็บไซต์แล้วแต่ รอการออกแบบ graphic จาก อ.วรรณวรุณ	20	ล่าช้า				
14	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริการ การศึกษา SUPREME2004	38	ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,4	4 30	- ติดตั้งงานอาจารย์ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาทราบ และเปิดให้ใช้งาน ในปี การศึกษา 1/2553	100	ตามแผน				
		39	ระบบ Course Report ตามมาตรฐาน TQF	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,4	30	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบงาน	50	ตามแผน			

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)
		40 ระบบงานรับนิสิตใหม่แบบคลออดปี	เพื่อจัดทำระบบงานรับนิสิตใหม่แบบออนไลน์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2,4	30	- ดำเนินการจัดทำ TOR เสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างศูนย์รับนิสิตใหม่ ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่พัฒนาระบบ	20	ตามแผน	ยังไม่ทราบระยะเวลาการดำเนินการ		
		41 ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต		1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2,4	30	กองกิจการนิสิต ขลอการพัฒนา ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต	0	ยกเลิก			
		42 ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต	เพื่อให้บริการการจองห้อง และชำระเงินออนไลน์สำหรับนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2,4	30	อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงาน ระยะ ที่ 1 คือ - การชำระเงินค่าหอพักผ่านธนาคาร SCB - และจะติดตั้งให้ใช้งานปีการศึกษา 1/2553	50	ตามแผน			
		43 ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	เพื่อจัดทำระบบในการให้บริการการทำกู้ยืมเงินที่สอดคล้องกับระบบของ สกอ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,9	30	อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงาน และ จะทดสอบการทำงานของระบบ ประมาณเดือนพฤษภาคม 53 และ จะเริ่มใช้งานจริง ปีการศึกษา 1/2553	50	ตามแผน			
		44 เชื่อมต่อระบบนิสิตกับส่วนงานอื่น เช่น สำนักบริหารหอพัก ศูนย์การแพทย์	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันร่วมกัน	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	2,4,9	30	ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน	10	ตามแผน			
15	ระบบจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	45 จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการทำงานของระบบ (TOR)	3 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,8	192 193		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ		
		46 จัดทำโปรแกรมประมาณการรายรับ	เพื่อให้มีเครื่องมือในการจัดทำประมาณการรายรับ และ การวิเคราะห์รายรับในภาคการศึกษาต่างๆ	6 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,9	193		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ		
		47 การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีทีเพื่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,9	193 194		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ		
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	48 รับสมัครพนักงานใหม่แบบออนไลน์	เพื่อจัดทำระบบการรับสมัครและฐานข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานใหม่	8 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4	199 200 201		0	ปรับแผนเป็นปี 2554	เนื่องจากงานยังไม่เร่งด่วน จึงชลอการพัฒนาระบบไปก่อน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)								
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)						
																												คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค
17	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	49	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของหน่วยงานย่อย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการทำวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ และส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,5	106	จะมีการติดตั้งส่วนของกรรพทุนผ่านระบบให้ใช้ภายในเดือนมิถุนายน	30	ล่าช้า		
		50	ประเมินผลระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1 ปี (52-53)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7	106	กำลังทดสอบระบบ ติดตั้งภายในเดือนมิถุนายน	50	ล่าช้า	
18	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	51	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการรับรายงานตัวให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7	199 200 201	ตรวจรับงานงวดที่ 1	20	ตามแผน		
		52	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น บัตรนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7	199 200 201	ตรวจรับงานงวดที่ 1	20	ตามแผน		
		53	ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามหน่วยงาน	1 เดือน			☑	☑																			1,4,7	199 200 201	ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		54	จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	เพื่อติดตั้งระบบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดประจำปี	4 เดือน	☑	☑	☑	☑																			1,4,7	199 200 201	ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		55	การจัดทำระบบ Online Tracking Service	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการต่างๆ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199 200 201		0	ปรับแผนเป็นปี 2554	เนื่องจากงานยังไม่เร่งด่วน จึงขอลงการพัฒนาแบบไปก่อน	
		56	สารสนเทศศิษย์เก่า	เพื่อนำข้อมูลศิษย์เก่าที่อยู่นอกระบบนั้นเข้าระบบ	5 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4	180 181 182	- นำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหน้าจอรายงาน	70	ตามแผน		
		57	จัดทำ report ระบบ Course syllabus	เพื่อจัดทำรายงานสถิติการทำ Course Syllabus	3 เดือน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,3,7	199 200 201	เขียนเว็บเพจสร้างรายงานแบบกราฟสำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เอ้าท์นระบบจริง	70	ล่าช้า	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																												คค
19	ระบบงานสารบรรณ	58 จัดทำ TOR และการ จัดจ้างผู้ประกอบการ ภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบและ กระบวนการทำงาน	2 เดือน	☑		☑	☑		☑	☑										4,7,8,	139		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็น หน่วยงานดำเนินการ ไม่ สามารถติดตามแผนการ ดำเนินงานได้		
		59 การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีที เพื่อการจัดทำ ระบบงานสารบรรณ	4 เดือน	☑		☑	☑					☑	☑	☑	☑					1,4,7,9	139		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็น หน่วยงานดำเนินการ ไม่ สามารถติดตามแผนการ ดำเนินงานได้		
		60 การเชื่อมต่อกับระบบ ฐานข้อมูลอื่น	เพื่อให้ระบบสารบรรณ เชื่อมโยงได้กับ ระบบงานอื่น ๆ	2 ปี			☑	☑								☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7,9	139		0	ชลอการดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็น หน่วยงานดำเนินการ ไม่ สามารถติดตามแผนการ ดำเนินงานได้	
20	ศรินครินทร์วีโรฒ วิชาการ	61 เว็บไซต์ศรินครินทร์วี โรฒวิชาการ	เพื่อใช้ในการ ติดต่อสื่อสารและ ส่งผลงานวิจัยและ บทความวิชาการเพื่อ ใช้ในการพิจารณา คัดเลือกเข้าสู่งานศรี นครินทร์วีโรฒ วิชาการ ครั้งที่ 4	4 เดือน	☑	☑			☑	☑	☑	☑								5,7	98 106		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว http://register.conference.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น			
		62 จัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2	เพื่อจัดสัมมนาและ เผยแพร่ความรู้ด้าน ไอซีที	1 ปี			☑					☑									6	202		ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553 http://it.cc.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น		
21	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	63 ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อให้ระบบงานที่ พัฒนาเสร็จได้มีการ ติดตั้งใช้งานจริงใน มหาวิทยาลัย เช่น Meeting Attendance, Alumni, eBuilding, MOU	1 ปี	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199 200 201		เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ		
		64 อบรมให้ความรู้ระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบที่ติดตั้ง ใช้งานได้มีการใช้ งานอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ	1 ปี	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	200 201		เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		65 ประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่ บุคลากร และ หน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	1 ปี			☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	202		เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																												คค	พย
22	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	66 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรของสำนัก คอมพิวเตอร์สามารถ ทำวิจัยได้	1 ปี			☐			☐	☐	☐							☐		5	78 81	จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ วิจัยประจำปี	10	ตามแผน				
		67 ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรของสำนัก คอมพิวเตอร์สามารถ นำผลงานวิจัย นำเสนอต่อสังคมได้	1 ปี			☐		☐	☐	☐									☐		5,7	105	ยังไม่มีกรนำเสนอผลงานวิจัยต่อสังคม	0	ยังไม่ดำเนินการ			
23	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของ สำนักคอมพิวเตอร์	68 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรและการ จัดการความรู้	เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลของ สำนักคอมพิวเตอร์มี ระบบ และมีการ บริหารงานที่ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยและ บุคลากรทุกคนได้รับ การพัฒนาให้เป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ เหมาะสม	1 ปี			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7,9	29 155 166	1.แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ 1 แผน 2.ส่งบุคลากรอบรม	25	ตามแผน				
		69 จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	เพื่อให้การบริหาร งบประมาณของ สำนักคอมพิวเตอร์มี ระบบ และมีการ บริหารงานที่ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย	1 ปี					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7,9	134 135	1.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานผลต่อคณะกรรมการ ประจำสำนัก 1 ครั้ง (เดือน ตค.)	25	ตามแผน			
		70 จัดทำโครงการเงินทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหา รายได้เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งแก่ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรแบ่งปันให้ ผู้อื่น	1 ปี			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4,7,9	167	1.ตั้งคณะทำงาน 2.เตรียมประชุมวางแผน	15	ตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ตามแผน		
	71	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	1 ปี																					4,7,9		1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานปี 2552 และจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2553	25	ตามแผน	
	72	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1 ปี																					4,7,9	137	1.จัดทำแผนการประกันคุณภาพ ปี 2553 2.ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมแผนในวันศุกร์ที่ 20 มค.2553	25	ตามแผน	
	73	การควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1 ปี																					4,7,9	137	1.ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ตามแผน	
	74	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี																					4,7,9	143	1.ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เตรียมประชุมคณะทำงาน	15	ตามแผน	
	75	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	1 ปี																					4,7,9	143	1.เตรียมแผนดำเนินงาน 2.ประชุมคณะทำงาน	15	ตามแผน	
	76	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 สของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1 ปี																					4,7,9	140	จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1	60	ตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
	77	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี																			4,7,9	140	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ตามแผน	
	78	ระบบบริการแบบ One Stop Service	เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี																			1,4,7	138 139	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำนโยบาย/ กำหนดกิจกรรม	25	ตามแผน	
24	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	79 สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี																			1,6	119 121	เตรียมแผนการจัดกิจกรรมงาน สกกรานต์ ในเดือนเมษายน 2553	30	ตามแผน	
	80	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี																			1,6	119	ประสานงานกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่ออบรม "ภาษาไทยกับงาน IT"	30	ตามแผน	
	81	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี																			1,6	119 147 149	1. ตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำแผน	15	ตามแผน	
	82	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี																			1,6	150	1. ตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำแผน	10	ตามแผน	

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ไอซีที	83 โครงการนำร่อง DOOffice Model Project เพื่อ เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านไอทีของ หน่วยงาน	เพื่อให้มหาวิทยาลัย ได้แนวปฏิบัติที่ดีของ การใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และ สร้างหน่วยงาน ดันแบบด้าน ICT ที่ดี (Digital Office	10 เดือน	☑	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,6,7, 9		- เยี่ยมหน่วยงานนำร่อง เพื่อแนะนำ โครงการให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน	20	ตามแผน			
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2																														
		84	ระบบจองห้อง		4 เดือน																						อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ	50	ตามแผน	
		85	เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SWU Online Teaching & Learning2)																								ดำเนินการติดตั้งเว็บไซต์การเรียน การสอนออนไลน์ มศว เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		86	พัฒนาเว็บไซต์ Cyber Education																								อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์	50	ตามแผน	
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3																														
		87	ระบบจองรถ/คนขับ	- สามารถจองได้ทั้ง ของส่วนกลาง และ ของหน่วยงานได้ - เลือกจองคนขับ จองรถ หรือทั้งคนขับ และรถได้ - เพื่อสนับสนุน การ	3 เดือน																						- ออกแบบระบบเสร็จแล้ว - ทำการย้ายฐานข้อมูลสำหรับ แก่ไช้code มาไว้ที่ SWIM	20	เร็วกว่าแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)									
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
งานประจำ																																		
1	ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 แนวปฏิบัติที่ดีในการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์	การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	มีการประชุม ISM และออกวางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว ฉบับที่ 1				
		2 การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	มีการ backup ระบบ username และ password ที่อยู่บน ldap ทุกวัน			
		3 การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	มีการเก็บข้อมูล backup พรบ แต่ยังไม่ได้ทำงาน copy ไปยัง centralized storage รอการจัดการ storage			
		4 การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	ดำเนินการติดตั้งระบบ cacti แล้วกำลังดำเนินการ customized เพื่อให้เข้ากับระบบของมศว			
		5 การบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	เพื่อปรับปรุงและทำการย้าย server ให้เข้าสู่ระบบ Virtualized)	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	ดำเนินการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปบนระบบ virtualized			
		6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องให้บริการเครือข่ายไร้สาย (ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเพิ่มเติม)	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีเครื่องแม่ข่าย			
		7 การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203	ดำเนินการจัดสรร storage เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูล	50	ตามแผน		
		8 จัดให้บริการการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามหน่วยงาน	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	4,7,9	203					

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มิ.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		9 จัดให้บริการระบบ Web Hosting	เพื่อให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน	1 ปี																			4,7,9	202 203		50	ตามแผน		
2	ด้านระบบการให้บริการและซ่อมบำรุง	1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการให้บริการ การจัดหา และการซ่อมบำรุงระบบไอซีที	การบำรุงรักษาเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553	1 ปี																			4,7,9	203	ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าทำการบำรุงรักษาเครื่อง ประจำปี 2553 เรียบร้อย	40	ตามแผน		
			จัดระบบการให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์แก่นิสิต และ บุคลากร	1 ปี																				4,7,9	64 203	ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ (คุณพรทิพย์) เรื่องจองห้อง	50	ตามแผน	
		2 การจัดระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	การให้บริการแก้ปัญหา PC Hot Line	1 ปี																				4,7,9	64 203	รายงานในเอกสารจดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน (Ccnews)	50	ตามแผน	
			การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์	1 ปี																					4,7,9	64 203	รายงานในเอกสารจดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน (Ccnews)	50	ตามแผน
3	ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	1 ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (Atutor)	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี																			4,5,7	180 181 182					
		2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นิสิต บุคลากร	เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา แก่ชุมชน	1 ปี																				2,4,6,7	64 65 66				
		3 การออกแบบกราฟฟิค และ การจัดทำ Courseware	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี																				3,4,7	205				
		4 ระบบ Courseware Information Management (CIM System)	เพื่อการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิต courseware	1 ปี																				4,7,9	180 181 182				
4	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1 ระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี																			1,4,7,9	180 181 182					
		2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี																				1,4,7,9	180 181 182				

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)
		3 ระบบจารจร : บัณฑิต รก และ สถิติติดข้อมูล ยานพาหนะ	เพื่อให้มีระบบ ฐานข้อมูล ยานพาหนะของ มหาวิทยาลัย	5 เดือน			☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑				☉	1,4,7,9	180 181 182						
5	การบริหารจัดการ สำนักคอมพิวเตอร์	1 งานบุคคล	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	166 167 169	1.ดำเนินการเรื่องสัมมนา/อบรม/ดู งาน/ประชุม http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm 2.	25	ตามแผน			
		2 งานนโยบายและแผน	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	135 136 198	1.คำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2554 2.เตรียมจัดทำคำขอตั้งเงินรายได้ ปี 2553	25	ตามแผน			
		3 งานบริการการศึกษา	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	169 201 203	1.ประสานงานการดำเนินโครงการ ของสำนักฯ 2.ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ	25	ตามแผน			
		4 งานการเงิน บัญชี	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	195 196 197	1.ประสาน/จัดทำโครงการต่างๆ สำนัก 2.จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ	25	ตามแผน			
		5 งานพัสดุ ครุภัณฑ์	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	195 196 197	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ เงินรายได้ ปี 53 13 รายการ 2.จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ โครงการ ต่างๆ	25	ตามแผน		
		6 งานธุรการ	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☉	1,4,7,9	203	รับ-ส่งเรื่องของสำนัก	25	ตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 52-มี.ค.53)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																											ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ตามแผน
	7	งานธุรการ องค์กรฯ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี																	1,4,7,9	203	ประสานงานเรื่องต่างๆ	25	ตามแผน			

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

- ด้านที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านที่ 2 : ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 3 : ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านที่ 4 : ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านที่ 5 : ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็น
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
