
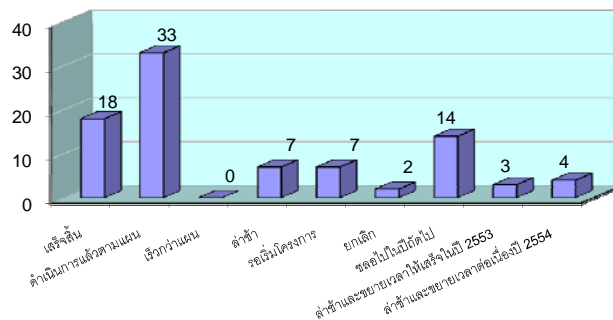



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2553	88	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	82	93.18
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	6	6.82
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	18	20.45
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	33	37.50
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00
2.4 ล่าช้า	7	7.95
2.5 รอเริ่มโครงการ	7	7.95
2.6 ยกเลิก	2	2.27
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	14	15.91
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี 2553	3	3.41
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	4	4.55
รวม	88	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2553



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

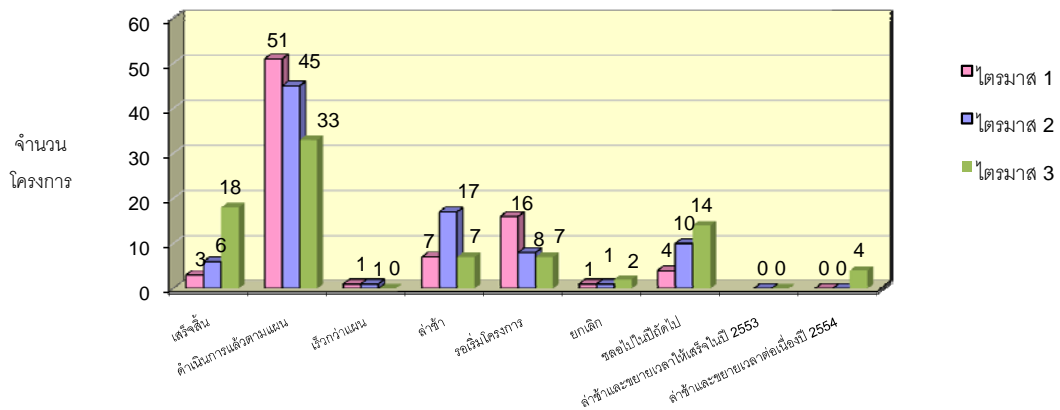

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน			
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																						
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการผลิตเอกสาร SWU IT Tools	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		2	คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2553	เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	จัดทำร่างมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของกระทรวง ICT	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		3	แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี	3 เดือน															ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 อาคาร 1. อาคาร 6 2. อาคารโรงยิม คณะพลศึกษา	100	เสร็จสิ้น
		4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่ นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ	9 เดือน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	- ดำเนินการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ระหว่างรอดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มศว (ISM) - จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล http://secure.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	5	ระบบลงทะเบียน MAC Address	เพื่อให้สามารถระบุหมายเลข hardware address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบเครือข่าย	10 เดือน		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบลงทะเบียน MAC Address	20	ดำเนินการแล้วตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		6	ทะเบียนการให้บริการ Internet Passport	เพื่อทำรายงานการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Ipass	10 เดือน		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺		เก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบ	20	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี 2553
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องให้บริการ VPN	เพื่อให้สามารถใช้งาน VPN ได้ขณะที่ Virtualized ไม่สามารถทำงานได้	1 เดือน					☺							ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล buasri ID ให้ทันสมัย	9 เดือน		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺			ตรวจสอบข้อมูล Buasri ID	100	เสร็จสิ้น	
		9	จัดทำระบบ Disaster Recovery Site : กรณี สำนัก หอสมุดกลาง เพื่อรองรับมาตรการป้องกันความเสี่ยง (RISK)	เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้เมื่ออาคารสำนักคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาภัยพิบัติ	1 ปี		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺			ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE)	10	เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สายได้มากยิ่งขึ้น	1 ปี		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		11	ศึกษาวิจัยและติดตั้งระบบ Voice Over Wireless	เพื่อศึกษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไร้สาย	8 เดือน				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺			0	ชล่อไปในปีที่ถัดไป

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน
5	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	12 วิเคราะห์สถานะระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย	เพื่อทราบสถานะของระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	4 เดือน		☐	☐	☐	☺						กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์	20	ล่าช้า		
		13 การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อให้ระบบ Rtel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	4 เดือน					☐	☐	☐	☺			ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว จำนวน 4 จุด	100	เสร็จสิ้น		
6	ขยายบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	14 จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	6 เดือน	☐	☐	☐	☐	☐	☺				1. กำหนดคุณสมบัติเรียบร้อย 2. เปิดซองสอบราคา วันที่ 7 มิ.ย. 3. คาดว่าจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ เดือน ก.ค.	90	ล่าช้า			
		15 การติดตั้งระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิดบริการให้แก่นิสิตในปีการศึกษา 2553	2 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	- อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบครุภัณฑ์	20	ล่าช้า	
		16 ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออครักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ 1. เคนเตอร์การให้บริการ 2. มุมสบายๆ ไอที	100	เสร็จสิ้น	
		17 ขยายจุดบริการแก่นิสิตและบุคลากร แบบ Kiosk Information System	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	40	ดำเนินการแล้วตามแผน
		18 ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ Online tracking	40	ชล่อไปในปีที่ถัดไป

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน			
7	ระบบ ICT Competency ของ นิสิตและบุคลากร ระยะที่ 2	19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่นักบุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่นักบุคลากรและ นิสิต	2 ปี (53-54)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	
		20	จัดทำระบบสอบวัดสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่นักบุคลากร และ นิสิต	เพื่อทำการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้าน ICT ตามกรอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย	2 ปี (53-54)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554
		21	การจัดทำคลังข้อคำถามเพื่อการสอบวัดสมรรถนะ ICT	เพื่อใช้ในการทำสอบแบบ Online	2 ปี (52-53)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อคำถามเพื่อการสอบวัดสมรรถนะ ICT ครั้งที่ 2 เพื่อ try out ครั้งที่ 2	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554
		22	จัดทำ Courseware เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน ICT	เพื่อให้ นิสิตและบุคลากรสามารถเข้าศึกษาด้วยตนเอง	2 ปี (53-54)				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554
8	SWU Hybrid Education	23	SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	SWU Hybrid Education เปลี่ยนเป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 200 รายวิชาในปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. SOT Faculty สำหรับผู้พัฒนา ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 149 คน 121 รายวิชา 2. Mentor&Mentee ปัจจุบันมี Mentor 44 คน Mentee 80 คน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน			
		24 ICT Competency Training	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 2 โครงการ - การดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 4 (ต.ค. 52- ก.พ.53) - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 5 (เม.ย.-มิ.ย.53)	100	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		25 กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	เตรียมประชุมหารือ	10	ล่าช้า	
		26 การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	27 ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	การจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553) มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 13 หน่วยงาน สามารถรวบรวมสื่อได้จำนวน 390 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	
		28 เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	3 เดือน	☑	☑	☑												☑	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว http://publications.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
10	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREME Plus	29	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	3 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		30	ติดตั้งระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	?? ดำเนินการถึงไหนแล้ว	0	รอเริ่มโครงการ
11	ระบบ SWU Information Portal	31	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตนได้	9 เดือน				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการศึกษานำ Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ชลไปในปีถัดไป
		32	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตนได้	9 เดือน				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการศึกษานำ Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ชลไปในปีถัดไป

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
12	ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และ พัสด (FISCAL : FInancial Information System, Cost Accounting and Logistics)	33	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อติดตั้งระบบการบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2. เพื่อติดตั้งระบบบริการการเงินและบัญชี 3. เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานพัสดและครุภัณฑ์ 4. เพื่อติดตั้งระบบในการแสดงข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน บัญชี และ พัสด	3 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากรอสำนักงานอธิการบดีดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและจัดหาระบบ	0	ชลอปในปีถัดไป
13	เว็บไซต์ มศว 2553	34	ติดตั้ง Feature ใหม่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1.เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Thai Version อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างใหม่ และคุยรายละเอียดในการจัดทำ - English Version อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงจากทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะปรับปรุง Content ที่ Template เดิมเป็นการชั่วคราวก่อน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน
		35	เว็บไซต์ Graphic Identity	เป็นแหล่งรวบรวมต้นแบบกราฟฟิคเพื่อนำไปใช้ในงานอื่นๆ	3 เดือน				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการออกแบบ graphic	20	ล่าช้า
		36	เว็บไซต์ IT Service Portal	เพื่อเป็นเว็บทำศูนย์รวมบริการ IT Service ต่าง ๆ ที่ติดตั้งให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร	4 เดือน							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		37	ติดตั้งเว็บไซต์ The President	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล ประวัติ และผลงาน	3 เดือน				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ประกอบเว็บไซต์ตามกราฟิกต้นแบบจัดทำเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์	30	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี 2553
14	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	38	ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อให้มีเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตผ่านระบบไอที	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ติดตั้งงานอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และเปิดให้ใช้งาน ในปีการศึกษา 1/2553	100	เสร็จสิ้น
		39	ระบบ Course Report ตามมาตรฐาน TQF	จัดทำระบบสำหรับอาจารย์ผู้สอน และรายงานข้อมูล ให้ตรงตามมาตรฐาน TQF ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคณะ 2. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชา มีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขา สาขาวิชา	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการนำเสนอ Prototype ให้กับผู้ใช้งานและดำเนินการพัฒนาระบบ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
		40	ระบบงานรับนิสิตใหม่แบบตลอดปี	เพื่อจัดทำระบบงานรับนิสิตใหม่แบบออนไลน์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	- ดำเนินการจัดทำ TOR เสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างศูนย์รับนิสิตใหม่ ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่พัฒนาระบบ	20	ชลไปในปีถัดไป
		41	ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต		1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	กองกิจการนิสิต ยกเลิกการพัฒนา ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต	0
		42	ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต	เพื่อให้บริการการจองห้อง และชำระเงินออนไลน์สำหรับนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการพัฒนาระบบงาน ระยะที่ 1 คือ - การชำระเงินค่าหอพักผ่านธนาคาร SCB - และจะติดตั้งให้ใช้งานปีการศึกษา 1/2553	100	เสร็จสิ้น
		43	ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	เพื่อจัดทำระบบในการให้บริการการทำกู้ยืมเงินที่สอดคล้องกับระบบของ สกอ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการพัฒนาระบบงาน และทดสอบการทำงานของระบบ และจะเริ่มใช้งานจริง ปีการศึกษา 1/2553	70	ดำเนินการแล้วตามแผน
		44	เชื่อมต่อระบบนิสิตกับส่วนงานอื่น เช่น สำนักบริหารหอพัก ศูนย์การแพทย์	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันร่วมกัน	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน	10
15	ระบบจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	45	จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการทำงานของระบบ (TOR)	3 เดือน		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		0	ชลไปในปีถัดไป

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานการณ์ภาพ การดำเนินงาน	
		46	จัดทำโปรแกรมประมาณการรายรับ	เพื่อให้มีเครื่องมือในการจัดทำประมาณการรายรับ และการวิเคราะห์รายรับในภาคการศึกษาต่างๆ	6 เดือน					☐	☐	☐	☐	☐	☺				0	ชลอปในปีถัดไป
		47	การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีทีเพื่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	2 ปี										☐	☐	☺		0	ชลอปในปีถัดไป
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	48	รับสมัครพนักงานใหม่แบบออนไลน์	เพื่อจัดทำระบบการรับสมัครและฐานข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานใหม่	8 เดือน		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺				0	ชลอปในปีถัดไป
17	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	49	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของหน่วยงานย่อย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการทำวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ และส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	ติดตั้งมอดูลการขอทุนผ่านระบบ	100	เสร็จสิ้น

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
		50 ประเมินผลระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1 ปี (52-53)			☑						☑			☺	กำลังทดสอบระบบ ติดตั้งภายในเดือนมิถุนายน	50	ล่าช้า		
18	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	51 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการรับรายงานตัวให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	ตรวจรับงานงวดที่ 1	20	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		52 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น บัตรนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	ดำเนินการตรวจรับงานตามแผนปัจจุบัน ตรวจรับงานไปแล้ว 3 งวด	50	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		53 ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามหน่วยงาน	1 เดือน								☺							ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	รอเริ่มโครงการ
		54 จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	เพื่อติดตั้งระบบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี	4 เดือน							☑	☑	☑	☺				ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	รอเริ่มโครงการ	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน			
		55	การจัดทำระบบ Online Tracking Service	เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การให้บริการของ หน่วยบริการต่างๆ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		0	ชลไปในปีถัดไป	
		56	สารสนเทศศิษย์เก่า	เพื่อนำข้อมูลศิษย์เก่าที่อยู่นอกระบบ นั้นเข้าระบบ	5 เดือน	☑	☑	☑	☑	☺									- นำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ หน้าจอรายงาน	70	ล่าช้า	
		57	จัดทำ report ระบบ Course syllabus	เพื่อจัดทำรายงาน สถิติการทำ Course Syllabus	3 เดือน		☑	☑	☺										เขียนเว็บเพจสร้างรายงานแบบกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้อัปขึ้นบนระบบจริง	70	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี 2553	
19	ระบบงานสารบรรณ	58	จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการ ภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบ และกระบวนการทำงาน	2 เดือน		☑	☺												0	ชลไปในปีถัดไป	
		59	การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีที เพื่อการจัดทำ ระบบงานสารบรรณ	4 เดือน					☑	☑	☑	☺								0	ชลไปในปีถัดไป
		60	การเชื่อมต่อกับระบบ ฐานข้อมูลอื่น	เพื่อให้ระบบสาร บรรณเชื่อมโยงได้ กับระบบงานอื่น ๆ	2 ปี						☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			0	ชลไปในปีถัดไป
20	ศรินครินทร์วีโรฒ วิชาการ	61	เว็บไซต์ศรินครินทร์วี โรฒวิชาการ	เพื่อใช้ในการ ติดต่อสื่อสารและ ส่งผลงานวิจัยและ บทความวิชาการเพื่อ ใช้ในการพิจารณา คัดเลือกเข้าสู่งานศริน ครินทร์วีโรฒ วิชาการ ครั้งที่ 4	4 เดือน	☑	☑	☑	☺										ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว http://register.conference.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		62 จัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2	เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที	1 ปี				☺									ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553 http://it.ccs.msu.ac.th	100	เสร็จสิ้น	
21	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	63 ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อให้ระบบงานที่พัฒนาเสร็จได้มีการติดตั้งใช้งานจริงในมหาวิทยาลัย เช่น Meeting Attendance, Alumni, eBuilding, MOU	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	รอเริ่มโครงการ
		64 อบรมให้ความรู้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบที่ติดตั้งใช้งานได้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	รอเริ่มโครงการ
		65 ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☺	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0
22	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	66 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1 ปี	☑	☑	☑		☑					☑		☺	จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
		67	ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถนำผลงานวิจัยนำเสนอต่อสังคมได้	1 ปี	☐	☐	☐			☐				☐			☺	ยังไม่มีกรนำเสนอผลงานวิจัยต่อสังคม	0	รอเริ่มโครงการ
23	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	68	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	1.แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ 1 แผน 2.ส่งบุคลากรอบรม	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
		69	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	1.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนัก 1 ครั้ง (เดือน ต.ค.)	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
	70	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.ตั้งคณะทำงาน 2.เตรียมประชุมวางแผน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
	71	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	1 ปี	☑		☑			☑				☑				☑	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานปี 2552 และจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2553 2.รวบรวมโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 3.จัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล http://cc.swu.ac.th >รู้จักสำนัก>แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ 4.ในวันที่ 18 มกราคม 2553 จัดประชุมติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 1	75	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
	72	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.จัดทำแผนการประกันคุณภาพ ปี 2553 2.ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมแผนในวันศุกร์ที่ 20 มค.2553	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
	73	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
	74	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เตรียมประชุมคณะทำงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
	75	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.เตรียมแผนดำเนินงาน 2.ประชุมคณะทำงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
	76	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 2. ดำเนินการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
	77	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
	78	ระบบบริการแบบ One Stop Service	เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำนโยบาย/กำหนดกิจกรรม	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
24	ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม นโยบายมหาวิทยาลัย	79	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การ ดำเนินงาน สอดคล้องตาม ภารกิจที่ มหาวิทยาลัย มอบหมาย	1			☐						☺				กิจกรรม 1 : ปรับปรุงเว็บไซต์ทำนุ บำรุงศิลปะ กิจกรรม 2 : ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญของชาติ กิจกรรม 3 : ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องใน วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 16 ปี (29 ธ.ค.52) กิจกรรม 4 : งานสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ (7-9 เม.ย. 53)	100	เสร็จสิ้น
		80	ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน	เพื่อให้การ ดำเนินงาน สอดคล้องตาม ภารกิจที่ มหาวิทยาลัย มอบหมาย	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	ประชุมกรรมการพิจารณาจัดทำ โครงการและกำหนดรูปแบบกิจกรรม	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		81	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การ ดำเนินงาน สอดคล้องตาม ภารกิจที่ มหาวิทยาลัย มอบหมาย	1			☐						☺				1.ตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผน	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		82	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การ ดำเนินงาน สอดคล้องตาม ภารกิจที่ มหาวิทยาลัย มอบหมาย	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☺	1. เป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อร่วม รณรงค์ Green University 2. รณรงค์การมีการใช้พลังงาน 3. ติดตั้ง Server แบบ Blade เพื่อ ประหยัดพลังงานและพื้นที่ว่าอุปกรณ์ 4- ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารสำนัก คอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 1																				

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	83 โครงการนำร่อง DOOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน	เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และสร้างหน่วยงานต้นแบบด้าน ICT ที่ดี (Digital Office Model) ให้แก่มหาวิทยาลัย	10 เดือน			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	- เยี่ยมหน่วยงานนำร่อง เพื่อแนะนำโครงการให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน - จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 5 มีจำนวนรายวิชาที่เปิดอบรม 18 วิชา - การส่งแบบสำรวจ การกำหนด KPI ของการพัฒนาไอซีที ถึง 9 หน่วยงานที่ร่วมโครงการ และหน่วยงานส่งแบบสำรวจกลับมา 8 หน่วยงาน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2																					
		84 ระบบจองห้อง		4 เดือน				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ออกแบบระบบ และฐานข้อมูลแล้ว รอนำเสนอผู้บริหาร	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		85 เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SWU Online Teaching & Learning2)																	ดำเนินการติดตั้งเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ มศว เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		86 พัฒนาเว็บไซต์ Cyber Education																	อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์	70	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		87	ระบบติดตามยุทธศาสตร์ตาSWU SAP														อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์	100	ดำเนินการแล้วตามแผน	
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3																				
		88	ระบบจองรถ/คนขับ	- สามารถจองได้ทั้งของส่วนกลางและของหน่วยงานได้ - เลือกจองคนขับจองรถ หรือทั้งคนรับและรถได้ - เพื่อสนับสนุน การ	3 เดือน						☐	☐	☺				ดำเนินการเสร็จแล้วดังนี้ 1. ออกแบบระบบเสร็จแล้ว ดังนี้ 2. ทำการย้ายฐานข้อมูลสำหรับแก้ไขcode มาไว้ที่ SWIM 3. พัฒนาระบบ - หน้าจอผู้ใช้-สิทธิ์ - หน้าจอข้อมูลคนขับรถของ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน			
งานประจำ																						
1	ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	แนวปฏิบัติที่ดีในการมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์	การจัดการระบบการ รักษาความปลอดภัย ของเครื่อง คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	มีการประชุม ISM และออกร่าง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศ มศว ฉบับที่ 1		
		2	การรักษาความปลอดภัยของการ เข้าถึงระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	การรักษาความปลอดภัยของการ เข้าถึงระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	มีการ backup ระบบ username และ password ที่อยู่บน ldap ทุกวัน		
		3	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	มีการเก็บข้อมูล backup พรบ แต่ยังไม่ได้ทำงาน copy ไปยัง centralized storage รอการจัดการ storage		
		4	การตรวจติดตาม สถานะการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย	การตรวจติดตาม สถานะการใช้ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการติดตั้งระบบ cacti แล้ว กำลังดำเนินการ customized เพื่อให้ เข้ากับระบบของมศว		
		5	การบริหารจัดการ เครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	เพื่อปรับปรุงและทำ การย้าย server ให้ เข้าสู่ระบบ Virtualized)	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายขึ้นไปบนระบบ virtualized		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		3	ระบบจราจร : บัตรจอดรถ และ สถิติข้อมูล ยานพาหนะ	เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย	5 เดือน				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑	มอดูล การขอบัตรจอดรถ http://transys.swu.ac.th/	100	เสร็จสิ้น
5	การบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	1	งานบุคคล	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑	1.ดำเนินการเรื่องสัมมนา/อบรม/ดูงาน/ประชุม http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm 2.	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		2	งานนโยบายและแผน	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑	1.คำขอตังงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2554 2.เตรียมจัดทำคำขอตั้งเงินรายได้ ปี 2553	75
		3	งานบริการการศึกษา	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑	1.ประสานงานการดำเนินโครงการของสำนักฯ 2.ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		4	งานการเงิน บัญชี	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑	1.ประสาน/จัดทำโครงการต่างๆ สำนัก 2.จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน		
	5	งานพัสดุ ครุภัณฑ์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ เงินรายได้ ปี 53 13 รายการ 2.จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
	6	งานธุรการ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รับ-ส่งเรื่องของสำนัก	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
	7	งานธุรการ องค์กรฯ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ประสานงานเรื่องต่างๆ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 52-มิ.ย.53)	สถานภาพการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

ด้านที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 2 : ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 3 : ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ด้านที่ 4 : ด้านการบริการวิชาการ

ด้านที่ 5 : ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี
