
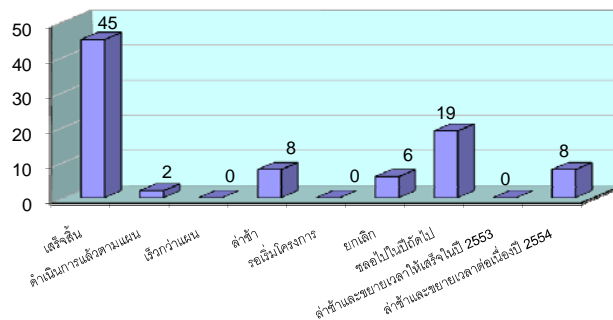



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - มิถุนายน 2553)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ
<b>1 โครงการในปีงบประมาณ 2553</b>	<b>88</b>	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	82	93.18
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	6	6.82
<b>2 ผลการดำเนินงาน</b>		
2.1 เสร็จสิ้น	45	51.14
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	2	2.27
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00
2.4 ล่าช้า	8	9.09
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00
2.6 ยกเลิก	6	6.82
2.7 ขอลงไปในปีถัดไป	19	21.59
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี 2553	0	0.00
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	8	9.09
<b>รวม</b>	<b>88</b>	<b>100.00</b>

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมาณ 2553



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

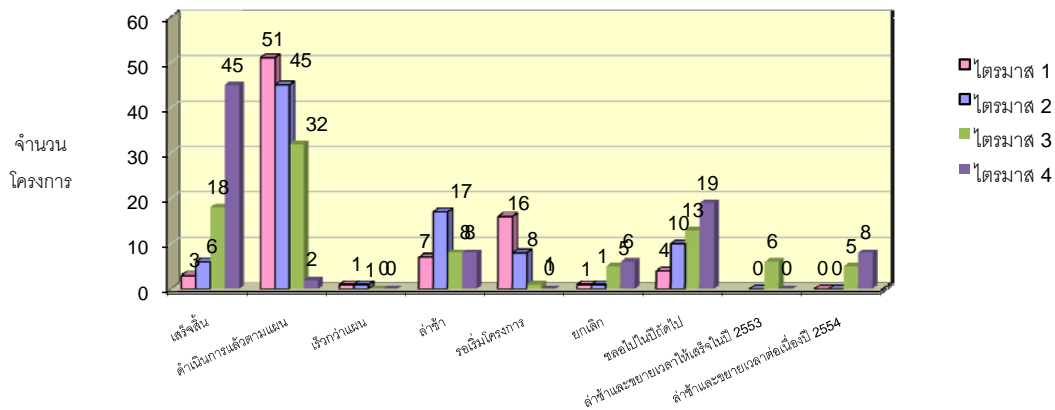

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>											
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 เรื่อง	ดำเนินการผลิตเอกสาร Student IT services	100	เสร็จสิ้น	
		2	คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2553	เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย	1 ปี	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 ประเภท	จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของกระทรวง ICT	100	เสร็จสิ้น	
		3	แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี	3 เดือน	จำนวนอาคารที่ดำเนินการตรวจสอบ	2 อาคาร	ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 อาคาร 1. อาคาร 6 2. อาคารโรงยิม คณะพลศึกษา	100	เสร็จสิ้น	
		4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่ นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ	9 เดือน	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 ฉบับ	- ดำเนินการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี อยู่ระหว่างรอดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มศว (ISM) - จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล <a href="http://secure.swu.ac.th">http://secure.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น	
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	5	ระบบลงทะเบียน MAC Address	เพื่อให้สามารถระบุหมายเลข hardware address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบเครือข่าย	10 เดือน	จำนวนร้อยละของ MAC address ที่เข้าระบบ	90%	อยู่ระหว่างการพัฒนาบบลงทะเบียน MAC Address	70	ล่าช้า	ปัจจุบันได้ข้อมูล MAC Address จากการทำ PM แล้ว ขณะนี้รอโปรแกรมที่กำลังพัฒนาจากฝ่ายระบบสารสนเทศ

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		6	ทะเบียนการให้บริการ Internet Passport	เพื่อทำรายงานการให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Ipass	10 เดือน	รายงานการใช้งานเครือข่ายผ่าน Ipass	1 ฉบับ	เก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบ	20	ล่าช้า	รอโปรแกรมที่กำลังพัฒนาจากฝ่ายระบบสารสนเทศ
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องให้บริการ VPN	เพื่อให้สามารถใช้งาน VPN ได้ขณะที่ Virtualized ไม่สามารถทำงานได้	1 เดือน	จำนวนเครื่องที่มีการปรับเปลี่ยน	1 เครื่อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล buasri ID ให้ทันสมัย	9 เดือน	ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกับระบบ supreme	1 เรื่อง	ปรับปรุงฐานข้อมูล Buasri ID เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		9	จัดทำระบบ Disaster Recovery Site : กรณี สำนักหอสมุดกลาง เพื่อรองรับมาตรการป้องกันความเสี่ยง (RISK)	เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้เมื่ออาคารสำนักคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาภัยพิบัติ	1 ปี	จำนวนระบบที่ backup ข้ามไปยัง DR site	3 ระบบ	ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE)	10	เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สายได้มากยิ่งขึ้น	1 ปี	มีจำนวน Access Point ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ร้อยละของความพึงพอใจ	อย่างน้อย 5 จุด	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 จุด	100	เสร็จสิ้น	
		11	ศึกษาวิจัยและติดตั้งระบบ Voice Over Wireless	เพื่อศึกษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไร้สาย	8 เดือน	จำนวนเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย	2 เครื่อง		0	ชลออกไปในที่สุดไป	ทำการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขาดอุปกรณ์ Voice Over Wireless จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย	12 วิเคราะห์สถานะระบบ โทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัย	เพื่อทราบสถานะของระบบโทรศัพท์ ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	4 เดือน	รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์	1 ฉบับ	กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์	20	ล่าช้า	รอนัดบริษัทและทีม มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการ หมายเลขนำหน้าระบบ โทรศัพท์ใหม่
		13 การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อให้ระบบ Rtel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	4 เดือน	จำนวนเบอร์ที่สามารถ ใช้ระบบ SIP Phone ได้	10 เบอร์	ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว จำนวน 4 จุด	100	เสร็จสิ้น	
6	ขยายบริการไอที เพื่อนิสิตและบุคลากร	14 จัดหาเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	6 เดือน	จำนวนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ เพิ่มขึ้น	100 เครื่อง	1. กำหนดคุณสมบัติเรียบร้อย 2. เปิดของสอบราคา วันที่ 7 มิ.ย. 3. คาดว่าจะได้เครื่องคอมฯ ต้นเดือน ก.ค.	95	ล่าช้า	เนื่องจากมีปัญหาความไม่ ชัดเจนในนโยบาย
		15 การติดตั้งระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิด บริการให้แก่นิสิตใน ปีการศึกษา 2553	2 ปี	การดำเนินงานตาม แผน	1 รายการ ตามแผน	- อยู่ในขั้นตอนการเดินสายระบบเครือข่าย (ภายนอกอาคาร) - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบครุภัณฑ์	40	ล่าช้า	เนื่องจากมีปัญหาความไม่ ชัดเจนในนโยบาย
		16 ปรับปรุงบริการ คอมพิวเตอร์ ณ สำนัก คอมพิวเตอร์ อาคาร เรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	จำนวนบริการที่ได้รับ การปรับปรุง	อย่างน้อย 1 บริการ	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ 1. เคนเตอร์การให้บริการ 2. มุมสบายๆ สไตส์ไอที	100	เสร็จสิ้น	
		17 ขยายจุดบริการแก่นิสิต และบุคลากร แบบ Kiosk Information System	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	มีการติดตั้งระบบและ อุปกรณ์ Kiosk	อย่างน้อย 1 ระบบ	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	40	ชล่อไปในปีที่ ถัดไป	- จุด มุมการเรียนรู้ style IT - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน ปี 2553 (เพิ่มเติม)
		18 ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับ บริการ IT ออนไลน์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร	1 ปี	มีการติดตั้งระบบและ อุปกรณ์ Kiosk	อย่างน้อย 1 ระบบ	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ	40	ชล่อไปในปีที่ ถัดไป	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
7	ระบบ ICT Competency ของ นิสิตและบุคลากร ระยะเวลาที่ 2	19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบ หลักสูตรการพัฒนา สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและ นิสิต	2 ปี (53-54)	จำนวนหลักสูตรครบ ตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร/1 กรอบ สมรรถนะ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้าและ ขยายเวลา ต่อเนื่องปี 2554	
		20	จัดทำระบบสอบวัด สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่ บุคลากร และ นิสิต	เพื่อทำการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ ด้าน ICT ตามกรอบ มาตรฐานของ มหาวิทยาลัย	2 ปี (53-54)	ติดตั้งระบบการ ประเมินสมรรถนะตาม แผน	1 มอดูล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้าและ ขยายเวลา ต่อเนื่องปี 2554	
		21	การจัดทำคลังข้อ คำถามเพื่อการสอบวัด สมรรถนะ ICT	เพื่อใช้ในการทำ สอบแบบ Online	2 ปี (52-53)	จำนวนข้อคำถามใน คลัง	500 ข้อ คำถาม	- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อคำถามเพื่อการ สอบวัดสมรรถนะ ICT ครั้งที่ 2 เพื่อ try out ครั้งที่ 2	60	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี 2554	
		22	จัดทำ Courseware เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้าน ICT	เพื่อให้ นิสิตและ บุคลากรสามารถเข้า ศึกษาด้วยตนเอง	2 ปี (53-54)	จำนวน Courseware	10 เรื่อง	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ	10	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี 2554	
8	SWU Hybrid Education	23	SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	เพื่อส่งเสริมนโยบาย การพัฒนา E-Learning Courseware ของ มหาวิทยาลัย	1 ปี	จำนวนรายวิชา E-Learning Courseware เพิ่ม มากขึ้น  จำนวนคณาจารย์มา จัดทำ courseware เพิ่มมากขึ้น	รายวิชา ใหม่จำนวน 20 รายวิชา จำนวน อาจารย์ใช้ ระบบ อย่างน้อย 50 คน	SWU Hybrid Education เปลี่ยนเป้าหมาย ในการดำเนินงานเป็น 200 รายวิชาในปี การศึกษา 2553 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. SOT ครั้งที่ 3 สำหรับผู้พัฒนา ปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 149 คน 121 รายวิชา 2. SOT2 Faculty Mentor ครั้งที่ 2 ปัจจุบันมี Mentor 44 คน Mentee 80 คน	80	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
	24	ICT Competency Training	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	1 ปี	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 2 โครงการ คือ - การดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 4 (ต.ค. 52- ก.พ.53) - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 5 (เม.ย.-มิ.ย. 53)	100	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	25	กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	5 ครั้ง	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น		
	26	การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	1 ปี	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้ 100 %	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2554	95	ล่าช้า		
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	27	ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	1 ปี	จำนวนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น	100 ชิ้น	การจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553) มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 13 หน่วยงาน สามารถรวบรวมสื่อได้จำนวน 390 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	
		28	เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	3 เดือน	ติดตั้งเว็บไซต์ได้ตามแผน	ภายในไตรมาส 1	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <a href="http://publications.swu.ac.th">http://publications.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
10	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	29	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	3 ปี	มีรายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	อย่างน้อย 5 รายงาน	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ	60	ชลอปในปีถัดไป	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนทีมงาน รอปรับแผนการดำเนินงานใหม่อีกครั้ง
		30	ติดตั้งระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	2 ปี	การนำเสนอKPIเกี่ยวกับฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากร	อย่างน้อย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างการประสานงานและการเลือกกระบวนการออกแบบระบบ	0	ชลอปในปีถัดไป	
11	ระบบ SWU Information Portal	31	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	9 เดือน	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	2 รายการ	อยู่ระหว่างการศึกษา Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ชลอปในปีถัดไป	
		32	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	เพื่อให้มีนิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	9 เดือน	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	อยู่ระหว่างการศึกษา Tools สำหรับใช้ในการทำระบบ Portal	10	ชลอปในปีถัดไป	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
12	ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ (FISCAL : Financial Information System, Cost Accounting and Logistics)	33	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อติดตั้งระบบการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2. เพื่อติดตั้งระบบบริการการเงินและบัญชี 3. เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ 4. เพื่อติดตั้งระบบในการแสดงข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ	3 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากรอสำนักงานอธิการบดีดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและจัดหาระบบ	0	ชล่อไปในที่สุด	
13	เว็บไซต์ มศว 2553	34	ติดตั้ง Feature ใหม่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1. เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	- Thai Version อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างใหม่ และหาหรือรายละเอียดในการจัดทำ - English Version อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงจากทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะปรับปรุง Content ที่ Template เดิมเป็นการชั่วคราวก่อน	30	ชล่อไปในที่สุด	ดร.ชนิษฐา ประสานงานกับ สุวิมล ปรับแผนและสถานะการดำเนินงาน
		35	เว็บไซต์ Graphic Identity	เป็นแหล่งรวบรวมต้นแบบกราฟฟิคเพื่อนำไปใช้ในงานอื่นๆ	3 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	- ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการออกแบบ graphic	60	ล่าช้า	ดร.ชนิษฐา ประสานงานกับ สุวิมล ปรับแผน
		36	เว็บไซต์ IT Service Portal	เพื่อเป็นเว็บทำศูนย์รวมบริการ IT Service ต่าง ๆ ที่ติดตั้งให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร	4 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	ติดตั้งเว็บไซต์ IT Service Portal	100	เสร็จสิ้น	



**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		37	ติดตั้งเว็บไซต์ The President	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ประวัติ และ ผลงาน	3 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	ประกอบเว็บไซต์ตามกราฟที่กั้นแบบจัดทำเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์	30	ชลอปในปีถัดไป	รอการพิจารณาและข้อสรุปโครงสร้างเนื้อหาและการออกแบบกราฟิกสำหรับเป็นต้นแบบของเว็บไซต์
14	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	38	ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อให้มีเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตผ่านระบบไอที	1 ปี	จำนวนอาจารย์และนิสิตที่ใช้ระบบ	5 กลุ่ม	- ติดตั้งงานอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และเปิดให้ใช้งาน ในปีการศึกษา 1/2553	100	เสร็จสิ้น	
		39	ระบบ Course Report ตามมาตรฐาน TQF	จัดทำระบบสำหรับอาจารย์ผู้สอน และ รายงานข้อมูล ให้ตรงตามมาตรฐาน TQF ดังนี้  1. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคณะ  2. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชา มีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชา	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	- พัฒนาระบบงานเรียบร้อยแล้ว - เตรียมนำเสนอผู้บริหาร - เตรียมประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		40	ระบบงานรับนิสิตใหม่แบบตลอดปี	เพื่อจัดทำระบบงานรับนิสิตใหม่แบบออนไลน์	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	- ดำเนินการจัดทำ TOR เสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างศูนย์รับนิสิตใหม่ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่พัฒนาระบบ	20	ชลอปในปีถัดไป	ยังไม่ทราบระยะเวลาการดำเนินการ
		41	ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต		1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	กองกิจการนิสิต ยกเลิกการพัฒนา ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต	0	ยกเลิก	
		42	ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต ระยะที่ 1	เพื่อให้บริการการ จองห้อง และชำระ เงินออนไลน์สำหรับ นิสิต	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	ดำเนินการพัฒนาระบบงาน ระยะที่ 1 คือ - การชำระเงินค่าหอพักผ่านระบบ Counter Payment ธนาคาร SCB - และติดตั้งให้ใช้งานปีการศึกษา 1/2553	100	เสร็จสิ้น	
		43	ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	เพื่อจัดทำระบบในการให้บริการการทำ กู้ยืมเงินที่สอดคล้องกับระบบของ สกอ	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	ดำเนินการพัฒนาระบบงาน และ ทดสอบการทำงานของระบบ และจะ เริ่มใช้งานจริง ปีการศึกษา 1/2553	100	เสร็จสิ้น	
		44	เชื่อมต่อระบบนิสิตกับ ส่วนงานอื่น เช่น สำนัก บริหารหอพัก ศูนย์ การแพทย์	เพื่อให้เกิดการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และส่งเสริมการใช้ ระบบฐานข้อมูล เดียวกันร่วมกัน	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน	10	ยกเลิก	
15	ระบบจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	45	จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการทำงานของระบบ (TOR)	3 เดือน	1. ขอบเขตของระบบตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร TOR 2. สามารถจัดหาผู้ประกอบการ	ภายใน ไตรมาส 1	ได้จัดทำ TOR แล้ว แต่ให้ไปรวมไว้ในโครงการ FIECAL	0	ยกเลิก	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		46	จัดทำโปรแกรมประมาณการรายรับ	เพื่อให้มีเครื่องมือในการจัดทำประมาณการรายรับ และการวิเคราะห์รายรับในภาคการศึกษาต่างๆ	6 เดือน	มีโปรแกรมประมาณการรายรับ	ภายใน ไตรมาส 2	ให้ไปรวมไว้ในโครงการ FIECAL	0	ยกเลิก	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ
		47	การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีทีเพื่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	2 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR	ให้ไปรวมไว้ในโครงการ FIECAL	0	ยกเลิก	เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผนวกเข้ากับระบบงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	48	รับสมัครพนักงานใหม่แบบออนไลน์	เพื่อจัดทำระบบการรับสมัครและฐานข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานใหม่	8 เดือน	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR	ได้หารือและกำหนดรูปแบบที่เป็นภาพรวมแล้ว	0	ชลออกไปในปีถัดไป	เนื่องจากงานยังไม่เร่งด่วน จึงชลอการพัฒนาระบบไปก่อน
17	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	49	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของหน่วยงานย่อย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการทำวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ และส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR	ติดตั้งมอดูลการขอทุนผ่านระบบ	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		50	ประเมินผลระบบ ROSE ระยะที่ 1	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1 ปี (52-53)	รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1	อยู่ในเกณฑ์	1. ติดตั้งระบบและให้ฝ่ายวิจัยทดลองใช้ระบบ 2. แก้ไขรายละเอียดและจัดลำดับของการทำงานตามที่ใช้สรุปผลให้ 3. ประชุมนำเสนอระบบให้แก่คณะกรรมการโครงการ และฝ่ายวิจัย 4. ทำแผนการอบรมให้บุคลากรฝ่ายวิ ฝ่ายวิจัย และผู้ดูแลงานวิจัยประจำหน่วยงาน	50	ยกเลิก	เนื่องจากผู้ใช้ (ฝ่ายวิจัย) ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้บางมอดูลต้องแก้ไข พัฒนาเพิ่มเติม
18	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	51	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการรับรายงานตัวให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว	1 ปี	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	ดำเนินการตรวจรับงานครบถ้วนทั้งหมด 6 งวด	100	เสร็จสิ้น	
		52	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น บัตรนิสิต	1 ปี	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	ดำเนินการตรวจรับงานครบถ้วนทั้งหมด 6 งวด	100	เสร็จสิ้น	
		53	ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามหน่วยงาน	1 เดือน	ข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำ SAR	1 รายงาน	ปรับแผนการดำเนินงาน	0	ชลออกไปในปีถัดไป	
		54	จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	เพื่อติดตั้งระบบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี	4 เดือน	มีข้อมูลสนับสนุนการทำรายงานประเมินตนเอง	1 ระบบ	ปรับแผนการดำเนินงาน	0	ชลออกไปในปีถัดไป	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		55	การจัดทำระบบ Online Tracking Service	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการต่างๆ	1 ปี	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 1 หน่วยงาน	ปรับแผนการดำเนินงาน	0	ชลอปในปีถัดไป	เนื่องจากงานยังไม่เร่งด่วน จึงชลอการพัฒนาระบบไปก่อน
		56	สารสนเทศศิษย์เก่า	เพื่อนำข้อมูลศิษย์เก่าที่อยู่นอกระบบนั้นเข้าระบบ	5 เดือน	จำนวนรายงานเกี่ยวกับศิษย์เก่า	อย่างน้อย 5 รายงาน	-ดำเนินการนำข้อมูลศิษย์เก่าเข้าเรียบร้อยแล้ว - เพิ่มหน้าจอการสอบถามข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ยังขาดเรื่องการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลจะดำเนินการต่อไป
		57	จัดทำ report ระบบ Course syllabus	เพื่อจัดทำรายงานสถิติการทำ Course Syllabus	3 เดือน	จำนวนรายงาน	อย่างน้อย 3 รายงาน	นำเว็บเพจรายงานแบบกราฟ ขึ้นบนระบบจริง	100	เสร็จสิ้น	เนื่องจากเว็บเพจรายงานแบบกราฟที่ทำขึ้นมา เป็นเว็บเพจที่ใช้ความรู้เรื่อง AJAX เข้ามาช่วย แต่เนื่องจากคลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ ต้องการแสดงแบบกราฟแท่งเพียงอย่างเดียว อีกทั้งรายงานที่อาจารย์ผู้สอนต้องการเป็นรายงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้เรื่อง AJAX ทำให้คุณเสริมลต้องแก้ไขโค้ดของรายงานดังกล่าว
19	ระบบงานสารบรรณ	58	จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก	เพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการทำงาน	2 เดือน	มีรูปแบบรายการสามารถจัดหาผู้ประกอบการได้	ภายใน ไตรมาส 2	จัดตั้งคณะกรรมการแล้ว	0	ชลอปในปีถัดไป	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้
		59	การติดตั้งระบบ	เพื่อให้มีระบบไอซีทีเพื่อการจัดทำระบบงานสารบรรณ	4 เดือน	ติดตั้งระบบงานได้ตามแผน	ภายใน ไตรมาส 2	ปรับแผนการดำเนินงาน	0	ชลอปในปีถัดไป	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		60	การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น	เพื่อให้ระบบสารบรรณเชื่อมโยงได้กับระบบงานอื่น ๆ	2 ปี	จำนวนระบบงานที่เชื่อมโยงได้	อย่างน้อย 1 ระบบ เช่น HURIS	ปรับแผนการดำเนินงาน	0	ชลออกไปในปีถัดไป	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้
20	ศรินครินทร์วิโรฒ วิชาการ	61	เว็บไซต์ศรินครินทร์วิโรฒวิชาการ	เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่งานศรินครินทร์วิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4	4 เดือน	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้ว <a href="http://conference.swu.ac.th/">http://conference.swu.ac.th/</a> <a href="http://register.conference.swu.ac.th">http://register.conference.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น	
		62	จัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2	เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที	1 ปี	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553 <a href="http://it.cc.swu.ac.th">http://it.cc.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น	
21	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	63	ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อให้ระบบงานที่พัฒนาเสร็จได้มีการติดตั้งใช้งานจริงในมหาวิทยาลัย เช่น Meeting Attendance, Alumni, eBuilding, MOU	1 ปี	จำนวนมอดูลใหม่ที่ได้รับติดตั้ง	5 มอดูล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		64	อบรมให้ความรู้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบที่ติดตั้งใช้งานได้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	1 ปี	จำนวนมอดูลในระบบต่างๆที่จัดอบรม ร้อยละความเข้าใจระบบเพิ่มมากขึ้น	5 มอดูล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		65 ประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	1 ปี	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
22	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	66 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1 ปี	จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ	จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	25	ล่าช้า	
		67 ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัย	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถนำผลงานวิจัยนำเสนอต่อสังคมได้	1 ปี	จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จได้รับการเผยแพร่	1 ครั้ง	ยังไม่มีกรนำเสนอผลงานวิจัยต่อสังคม	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์ภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
23	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	68	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1 ปี	ภายใน 3 เดือนมีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน  1 ครั้ง  รายไตรมาส	1.แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ 1 แผน 2.ส่งบุคลากรอบรม ปีละ 1 ครั้ง	100	เสร็จสิ้น	
		69	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1 ปี	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน  รายไตรมาส	1.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 1 ครั้ง (เดือน ตค.)	100	เสร็จสิ้น	



**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		70	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหา รายได้เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สำนักคอมพิวเตอร์  เพื่อนำความรู้และ ประสบการณ์ของ บุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น	1 ปี	จำนวนโครงการที่จัด มีการประชุมติดตาม งบประมาณทุกเดือน	อย่างน้อย 1 โครงการ	1.ตั้งคณะทำงาน 2.เตรียมประชุมวางแผน	15	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี 2554	
		71	ติดตามผลงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานโครงการ ต่างๆ เป็นไปตาม แผนงาน และ เป้าหมาย	1 ปี	จำนวนครั้งของการ ติดตามผลงาน  รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	อย่างน้อย 2 ครั้ง  รายไตรมาส	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนผลการ ดำเนินงานปี 2552 และจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2553 2.รวบรวมโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ ราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 3.จัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อ เผยแพร่ข้อมูล <a href="http://cc.swu.ac.th">http://cc.swu.ac.th</a> >รู้จัก สำนัก< แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ 4.ในวันที่ 18 มกราคม 2553 จัดประชุม ติดตามแผนปฏิบัติการสำนัก คอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 1	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		72	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1 ปี	คะแนนการประเมินคุณภาพ  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี  ทุก 6 เดือน	สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2552 และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	100	เสร็จสิ้น	
		73	การควบคุมภายใน	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 ปี	มีแผนการควบคุมภายใน  มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน  6/9/12	1.ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	100	เสร็จสิ้น	
		74	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	มีแผนการบริหารความเสี่ยง  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น  รายไตรมาส	3. มีการรายงานผลดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส	100	เสร็จสิ้น	
		75	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	1 ปี	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1.เตรียมแผนดำเนินงาน 2.ประชุมคณะทำงาน 3. รายงานผลการดำเนินงานทุก 6,9,12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	76	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1 ปี	มีแผนการดำเนินงาน  มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน  รายภาคการศึกษา	1. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 2. ดำเนินการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส	100	เสร็จสิ้น	
	77	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	มีแผนการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ  รายงานการวิเคราะห์ผล	1 แผน  รายเดือน  รายไตรมาส	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4. จัดทำข่าวประหยัดพลังงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	100	เสร็จสิ้น	
	78	ระบบบริการแบบ One Stop Service	เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	มีการประกาศการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  จำนวนบริการที่ปรับบริการ	1 ประกาศและอย่างน้อย 1 บริการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. เตรียมประชุมจัดทำนโยบาย/กำหนดกิจกรรม	25	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
24	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	79	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	กิจกรรม 1 : ปรับปรุงเว็บเพจทำนุบำรุงศิลปะ กิจกรรม 2 : ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญของชาติ กิจกรรม 3 : ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 16 ปี (29 ธ.ค.52) กิจกรรม 4 : งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (7-9 เม.ย. 53)	100	เสร็จสิ้น	
		80	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	ประชุมกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการและกำหนดรูปแบบกิจกรรม	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	
		81	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	จัดกิจกรรมอาสาสอนและให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	
		82	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1. เป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อร่วมรณรงค์ Green University 2. รณรงค์การมีการใช้พลังงาน 3. ติดตั้ง Server แบบ Blade เพื่อประหยัดพลังงานและพื้นที่ว่าอุปกรณ์ 4- ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 1

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	83 โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน	เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และสร้างหน่วยงานต้นแบบด้าน ICT ที่ดี (Digital Office Model) ให้แก่มหาวิทยาลัย	10 เดือน	จำนวนหน่วยงานที่ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	4 กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เยี่ยมหน่วยงานนำร่อง (สำนักหอสมุดกลาง) เพื่อแนะนำโครงการให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน</li> <li>- จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 6</li> <li>- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการศึกษาไฮบริด มศว ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2/2553</li> <li>- โครงการ IT Talk ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสำนักหอสมุดกลาง</li> <li>- ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ D-Office Model Project ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2553 - กันยายน 2553)</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ D-Office Model Project ระยะที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2553 - กันยายน 2553)</li> </ul>	100	เสร็จสิ้น	
<b>แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2</b>										
		84 ระบบจองห้องเรียนและ ห้องประชุม		4 เดือน			ออกแบบระบบ และฐานข้อมูลแล้ว รอนำเสนอผู้บริหาร	60	ชลออกไปในที่สุดไป	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์ภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		85	เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SWU Online Teaching & Learning2)				ดำเนินการติดตั้งเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ มศว เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น		
		86	พัฒนาเว็บไซต์ Cyber Education				ติดตั้งเว็บไซต์ Cyber Education ใหม่เรียบร้อยแล้ว cybered.swu.ac.th	100	เสร็จสิ้น		
		87	ระบบติดตามยุทธศาสตร์ตาม SWU SAP				ติดตั้งระบบติดตามยุทธศาสตร์ตาม SWU SAP	100	เสร็จสิ้น		
<b>แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3</b>											
		88	ระบบจองรถ/คนขับ	- สามารถจองได้ทั้งของส่วนกลางและของหน่วยงานได้ - เลือกจองคนขับจองรถ หรือทั้งคนขับและรถได้ - เพื่อสนับสนุน การ	3 เดือน			พัฒนาระบบการจองรถ/คนขับรถของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว URL: <a href="http://transys.swu.ac.th">http://transys.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
<b>งานประจำ</b>											
1	ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	แนวปฏิบัติที่ดีในการมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์	การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ปี	มีรายงานการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย	1 ฉบับ	มีการประชุม ISM และออกร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว ฉบับที่ 1	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	
		2	การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี	สามารถกู้คืนข้อมูลบุคลากรส่วนที่เป็น username และ password	ได้ภายใน 3 ชั่วโมง	มีการ backup ระบบ username และ password ที่อยู่บน ldap ทุกวัน	100	เสร็จสิ้น	
		3	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1 ปี	จำนวนที่มีการเก็บข้อมูลอยู่บนระบบ Centralized log	2 เครื่อง	มีการเก็บข้อมูล backup พบ แต่ยังไม่ได้ทำงาน copy ไปยัง centralized storage รอการจัดการ storage	100	เสร็จสิ้น	
		4	การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	มีรายงานสรุปผลการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ระบบ	ดำเนินการติดตั้งระบบ cacti แล้ว กำลังดำเนินการ customized เพื่อให้เข้ากับระบบของมศว	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี 2554	รอการปรับแก้ไข Interface
		5	การบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	เพื่อปรับปรุงและทำการย้าย server ให้เข้าสู่ระบบ Virtualized)	1 ปี	จำนวน server ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็น virtual	6 ระบบ	ดำเนินการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปบนระบบ virtualized เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		6	การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องให้บริการเครือข่ายไร้สาย (ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเพิ่มเติม)	1 ปี	เพิ่ม server เพื่อใช้ในการประมวลผล report	1 ระบบ	ดำเนินการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		7	การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	1 ปี	จำนวน server ที่ทำการ backup เข้าสู่ระบบ	5 เครื่อง	ดำเนินการนำ Server ต่างๆ Backup สู่ Storage	100	เสร็จสิ้น	
		8	จัดให้บริการการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามหน่วยงาน	1 ปี	ข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินงานประจำปี	1 ฉบับ	ดำเนินการแล้วตามแผนเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		9	จัดให้บริการระบบ Web Hosting	เพื่อให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บหน่วยงาน	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามที่หน่วยงานขอมา	100	เสร็จสิ้น	
2	ด้านระบบการให้บริการและซ่อมบำรุง	1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการให้บริการ การจัดหา และ การซ่อมบำรุงระบบไอซีที	การบำรุงรักษาเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการ เพื่อเข้าทำการบำรุงรักษาเครื่อง ประจำปี 2553 เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	
				จัดระบบการให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์แก่นิสิต และ บุคลากร	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศเรื่องระบบของห้อง	100	เสร็จสิ้น	
		2	การจัดระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	การให้บริการแก้ปัญหา PC Hot Line	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	รายงานในเอกสารจดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน (Ccnews)	100	เสร็จสิ้น	



**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
			การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	รายงานในเอกสารจดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน (Ccnews)	100	เสร็จสิ้น	
3	ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	1	ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (ATutor)	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		2	บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นิสิต บุคลากร	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		3	การออกแบบกราฟฟิค และ การจัดทำ Courseware	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ปรับปรุง Server ดังนี้ 1. upgrade OS เป็น CentOS 5.4 x64 2. เพิ่ม RAM เป็น 5 GB 3. upgrade application ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PHP, MySQL, Apache 4. upgrade ATutor เป็น 1.6.3 5. ปรับปรุงระบบการ Backup ข้อมูลในระบบ ATutor ลง Storage ด้วย Rsnapshot 6. ปรับปรุงระบบการ Sync ข้อมูล ATutor กับ SUPREME และ HURIS	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		4 ระบบ Courseware Information Management (CIM System)	เพื่อการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิต courseware	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 ระบบ	ดำเนินการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
4	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1 ระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	บำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในการใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		3 ระบบจราจร : บัตรจอดรถ และ สถิติข้อมูลยานพาหนะ	เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลยานพาหนะของมหาวิทยาลัย	5 เดือน	จำนวนมอดูลใหม่ที่ติดตั้ง	อย่างน้อย 1 มอดูล	มอดูล การขอบัตรจอดรถ <a href="http://transys.swu.ac.th/">http://transys.swu.ac.th/</a>	100	เสร็จสิ้น	
5	การบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	1 งานบุคคล	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	1.ดำเนินการเรื่องสัมมนา/อบรม/ดูงาน/ประชุม <a href="http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm">http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm</a> 2.	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	2	งานนโยบายและแผน	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานการผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	1.ค่าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2554 2.เตรียมจัดทำคำขอตั้งเงินรายได้ ปี 2553	100	เสร็จสิ้น	
	3	งานบริการการศึกษา	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานการผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	1.ประสานงานการดำเนินโครงการของสำนักฯ 2.ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ	100	เสร็จสิ้น	
	4	งานการเงิน บัญชี	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานการผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	1.ประสาน/จัดทำโครงการต่างๆ สำนัก 2.จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ	100	เสร็จสิ้น	
	5	งานพัสดุ ครุภัณฑ์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานการผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ เงินรายได้ ปี 53 13 รายการ 2.จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ	100	เสร็จสิ้น	
	6	งานธุรการ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน  รายงานการผลการดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์ภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		7 งานธุรการ องค์กรฯ	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	1 ปี	มีแผนในการ ดำเนินงาน  รายงานการผลการ ดำเนินการประจำเดือน	1 แผน  ทุกเดือน	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1-4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม					ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 52-ก.ย.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

**ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554**

ด้านที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 2 : ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 3 : ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ด้านที่ 4 : ด้านการบริการวิชาการ

ด้านที่ 5 : ด้านการบริหาร

**ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนารับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี
