
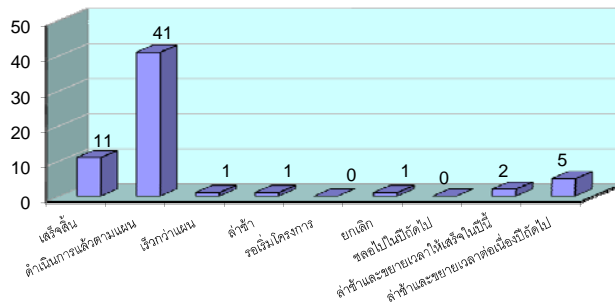



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2555)

ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
<b>1 โครงการในปีงบประมาณ 2555</b>	<b>62</b>	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 โครงการประจำ	18	29.03
<b>2 ผลการดำเนินงาน</b>		
2.1 เสร็จสิ้น	11	17.74
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	41	66.13
2.3 เร็วกว่าแผน	1	1.61
2.4 ล่าช้า	1	1.61
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00
2.6 ยกเลิก	1	1.61
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	0	0.00
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	2	3.23
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	5	8.06
<b>รวม</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมาณ 2555



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

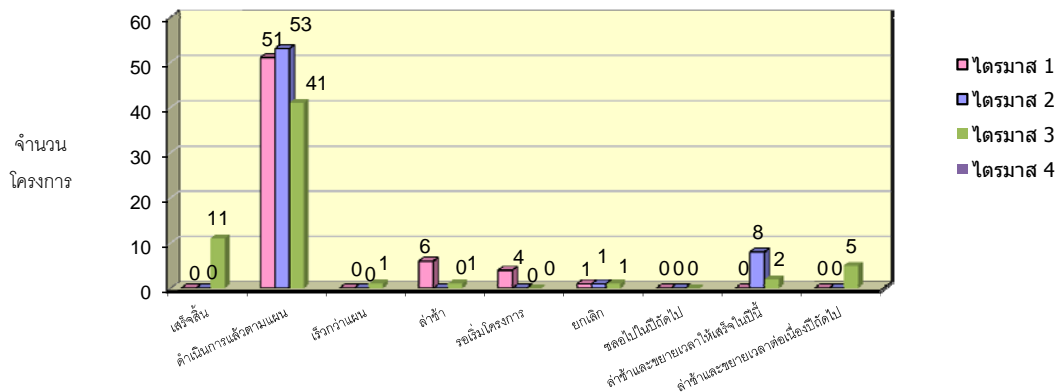

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2555)

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วรารักษ์
4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	มหัทธวัฒน์ นคร
5	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เฉลิมพล ธันยธร ญาดา
6	ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	นคร ญาดา
8	ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	นคร ธันยธร
23	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่องระบบสารสนเทศ มศว	วิลาวัลย์ พรทิพย์ และทีม
30	มอดูล ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนิสิต	วันทนา อมรรัตน์
43	โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล	ศิรินช สมบุญ สุธาทิพย์ กรัณธ์รัตน์ ศิริศศิเกษม
<b>โครงการประจำ</b>		
46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	สุพิมพ์ ประกิจ
47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	สุพิมพ์ ประกิจ สุวิมล
56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	พัชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์
โครงการย่อย/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
40	ICT Competency Training 2012	อุราพร ภาณุวัฒน์ จันทนา จิตติมา
โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	อุราพร พัชรินทร์
โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑลสี, ฐิตาภา
29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ฐิตาภา

36	การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	ประกิจ , มณฑล
----	--	---------------

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ , นคร , พงษ์ภูมิพันธ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล , ศิริศศิเกษม และทีม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล , วิลาวัลย์ และทีม
31	มอดูล จองห้อง online	อมรรัตน์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>		
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องครักษ์	อำนาจ , สัทิมพ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>																		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	แนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	4 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มัทธวิวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์	RAP126	1,2	4	10 ฉบับ	สูงกว่าเป้าหมาย	1. การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้ ดังนี้ 1.SUPREME2004 2. HURIS (งานเงินเดือน, งานลา,งานค่าส่ง) 3.Admission 4.Alumni 5.Loan 6.งานหลักสูตรกิจกรรม 7.e-Train 8.e-Project 9.SWU-SAP 10.Infoservice	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	2	โครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 3	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอทีที่พื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างหน่วยงานนำร่องด้านการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติและมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	ร้อยละ 90	8 เดือน	ก.พ.-ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา และทีม	RAP109 RAP125 RAP126	2,3,4,5	1,2,4,5,6		-	<b>กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที</b> 1. การจัดหลักสูตรการอบรมระบบ SWU IT Service สำหรับบุคลากรใหม่ (บรรจุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา) และบุคลากรในหน่วยงานร่วมโครงการ 2. จัดทำแบบสำรวจสถานะระบบไอซีทีของหน่วยงานร่วม โครงการ D-Office ครั้งที่ 3 3. ออกหนังสือเชิญหน่วยงานร่วมโครงการ D-Office ครั้งที่ 3 พิจารณา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีครั้งที่ 11 (ICT11) 4. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
														กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ให้แก่หน่วยงาน 1. ประชุมทีมเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ของ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ - เตรียมงานประชุมผู้ประสานงานหน่วยร่วมโครงการ - จัดตารางการติดตั้ง และอบรมระบบสารสนเทศใหม่ให้แก่หน่วยงานร่วมโครงการ - ติดตามการรายงานข้อมูล และกิจกรรมใน Website ของโครงการ 2. แนะนำการใช้ระบบ eProject ePayment eDocument eTrain eSurvey ให้แก่บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง				
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์ ,นคร ,พงษ์ภูมิพันธ์	RAP86	1	4,5	-	อยู่ระหว่างการบริจาคแบบ และเปิดซองสอบราคา	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป		
		4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มหัทธวัฒน์ นคร	RAP124	1	4,5	2 อาคาร ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่าย 2 อาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		5	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เพื่อเปิดบริการการใช้ระบบโทรศัพท์ด้วยระบบ IP Phone และระบบ SIP Phone	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	เฉลิมพล, ธันยธร, ญาดา	RAP124	1	4,5	2 อาคาร	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		6	ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	เพื่อรองรับการขยาย Access Point เพิ่มในอนาคต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	48 AP	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	RAP124	1	4,5	48 AP	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครื่องขยายไร้สาย (Wireless Controller) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
3	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	7	บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device	เพื่อเปิดบริการการใช้อุปกรณ์ mobile device ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย - สามารถใช้บริการแบบ Roaming ได้	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	อุปกรณ์ Mobile Device 2 ระบบปฏิบัติการ คือ IOS และ Android สามารถใช้งานได้	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	RAP124	1	4,5		-	อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		8	ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	เพื่อมีข้อมูลสถานะของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้	ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ธันยธร	RAP124	1	4,5	10 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		9	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, ธันยธร, ญาดา	SAP46	1	4,5		-	องค์กรฯสำรวจเสร็จสิ้นขาดประสานมิตรยังไม่ครบทั้งหมด	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	2 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, พัชรินทร์	RAP86	3,4	1,4,5		-	มีประชุมเพื่อปรับปรุงกำหนดราคากลางใหม่เพื่อเตรียมจัดจ้าง	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, สุปิพิมพ์	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5		-	อยู่ระหว่างการปรับขนาดแบบการจัดพื้นที่ให้บริการฯ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผลิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	2 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, ชนิษฐา	RAP125	3,4	1,4,5	-	รวบรวมคู่มือการให้บริการ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	เพื่อเปิดบริการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานและเพิ่มช่องทางการขอรับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก, ธนรณพ	RAP86	4	1,4,5	-	อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรม	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		14	พัฒนางานให้บริการพิมพ์ผล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, ธนรณพ	RAP86	4	1,4,5	-	1. ติดตั้งระบบและเริ่มทดลองให้บริการที่ประสานมิตร 2. อยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานที่องค์กรฯ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		15	โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	เพื่อศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี	รายงานผลการศึกษา	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ดิเรก, สันติ	RAP86	4	1,3,4,5	-	1. ศึกษาเทคโนโลยี Access Control ในรูปแบบต่างๆ 2. ประสานงานบริษัทเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, นคร	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	-	1. รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง 2. จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ไม่ต่ำกว่า 100 คน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อำนาจ, สุพิมพ์	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	-	ยุบรวมโครงการ ไปร่วมกับโครงการ มศว IT Clinic เคลื่อนที่		ยกเลิก	มีเป้าหมายเดียวกัน โดยจัดบริการที่ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ
		18	จัดทำมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, นคร	RAP124	1,3,4	1,4,5	5 อุปกรณ์	รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและจัดทำเป็นมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่าย	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	19 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเปิดบริการการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	รายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	ไม่ต่ำกว่า 5 รายงาน	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วราภรณ์	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	-	1.จัดทำรายงานใหม่จำนวน 7 รายงาน 2.อบรม/แนะนำการใช้รายงานและสถิติข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย (SUPREMEplus) โดยจัดเป็นหลักสูตรไว้ในโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2555	75	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		20 ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้จริง	จำนวนงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง	ไม่ต่ำกว่า 1 งานใหม่	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย.56	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วันทนา	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	-	1. การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำรายงานงานที่ดำเนินการแล้ว งานที่ดำเนินการแล้ว 1.รายงานงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา 2.รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 3.รายงานระบบบริหารงานโครงการ (SWU eProject)  งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1.รายงานบริหารโครงการ (SWU e-Project) 2.รายงานระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU -SAP) 3.รายงานระบบงานวิจัย (ROSE) 4.รายงานจำนวนนิสิตเต็มเวลา ตามสาขาวิชา(Full Time Equivalent Student) 5.รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	เว็บไซต์ มศว	21 ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	สุทิสา , สุวิมล	RAP123	2,4	1,2,3,4,5		-	1. จัดทำ website เพื่อ นิสิต โดยเข้าดูได้ที่ <a href="http://my.swu.ac.th">http://my.swu.ac.th</a> 2. จัดทำ portlets ตามที่ได้วางไว้ในแผนการทำงาน Presonalized (Public และ Private) ตัวอย่างเช่น 2.1 เว็บเมลล์ 2.2 ตารางสอนส่วนบุคคลของนิสิต 2.3 ผลการเรียนส่วนบุคคลของนิสิต 2.4 โปรแกรมอื่นๆ เช่น calendar Communities ตัวอย่างเช่น เครื่องมือด้านสังคมออนไลน์ เช่น facebook 3. จัดทำ Template ของ คณะในมหาวิทยาลัย	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		22 Upgrade Version DotNetNuke	เพื่อติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่	1 ระบบ	6 เดือน	เม.ย.55-ก.ย.55	สุวิมล , ปวีศรี	RAP124	2,3,4	1,2		-	ดำเนินการติดตั้ง DotNetNuke Version 06.02.00 ที่เครื่อง Server เรียบร้อยแล้ว	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	23	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่องระบบสารสนเทศ มศว	1. เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อสำรวจสถานภาพและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว 4. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้ระบบ (user) และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเทคนิควิธีการ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. มีเอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. รายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 3. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 4. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	RAP17 RAP125	2,5	1,2	-	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ มีดังนี้ 1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จำนวน 13 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา 100 %	100	เสร็จสิ้น				
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล , ศิริศศิเกษม และทีม	RAP123	2,5	1,2	-	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอย้ายเวลาต่อเนื่องนี้ถัดไป	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องนี้ถัดไป	บุคลากรลาออก	
		25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล , วิลาวัลย์ และทีม	RAP49 RAP123	2,5	1,2	-	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอย้ายเวลาต่อเนื่องนี้ถัดไป	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องนี้ถัดไป	บุคลากรลาออก	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		26	ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งปี	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วันทนา , พรทิพย์	RAP123	2,5	1,2		-	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 2.อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วันทนา , พรทิพย์	RAP123	2,5	1,2		-	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 2. อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบงานรับสมัครพนักงานออนไลน์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ต.ค.54-ม.ค.55	มณฑลสิ, ลีตาภา	RAP123	2,5	1,2		-	1. การพัฒนาระบบงานอยู่กำลังดำเนินการ 3 หน้าจอ -frcrpre001 : บันทึกรายละเอียดการรับสมัคร -frcrpre002 : สมัครงาน -หน้าแสดงผลการรับสมัครงาน ,ขั้นตอนการรับสมัครงาน,หน้าสมัครงานของบุคคลภายนอก	35	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	บุคลากรลาออก
		29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่ฐานวันลาในระบบ HURIS	เพื่อพัฒนาระบบงานนำเข้าข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่ฐานวันลาในระบบ HURIS	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ต.ค.54-ม.ค.55	ลีตาภา	RAP123	2,5	1,2		-	1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3. การพัฒนาระบบงาน	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากมีระบบงานอื่นที่มีความเร่งด่วนในการใช้งานและต้องเร่งพัฒนา จึงจำเป็นต้องขลอการพัฒนา ระบบงานนำเข้าข้อมูลการทำงาน (Finger scan) ออกไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		30	มอดูล ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน online ของนิสิต	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	6 เดือน	ธ.ค.54-พ.ค.55	วันทนา , อมรรรัตน์	RAP123	2,5	1,2	-	ได้ระบบส่งเสริมการปฏิบัติงานของนิสิต และประสานงานผู้ใช้เพื่อติดตั้งระบบและอบรมการใช้งาน	100	เสร็จสิ้น	
		31	มอดูล จองห้อง online	เพื่อพัฒนาระบบงานจองห้อง	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	9 เดือน	ต.ค.54-มิ.ย.55	อมรรรัตน์	RAP123	2,5	1,2	-	- นำเสนอและหารือกับผู้ใช้ในการออกแบบรายงาน - ดำเนินการปรับหน้าจอและเขียนโปรแกรมและเพิ่มรายงาน	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	บุคลากรลาออก
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	32	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มณฑลสิ , ลีตาภา	RAP102 RAP123	2,5	1,2	-	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกเดือน 2. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี - จัดทำรายงานตามความต้องการของหน่วยงาน 3. ปรับข้อมูลสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 4. การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ก.พ.รับรอง 5. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ export ข้อมูลสำหรับส่งธนาคาร เพื่อโอนเงินดอกเบี้ยให้พนักงานมหาวิทยาลัย	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		33	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , วันทนา	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,5	1,2	-	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 2. ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		34	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , สุวิมล และทีม	RAP123	2,5	1,2	-	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 2. ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		35	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลง	ลดลงมากกว่า 90 % ต่อปี	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มณฑล	RAP124	1	1,2	-	<b>งานที่ดำเนินการแล้ว</b> 1. ดำเนินการเรื่องจัดจ้างบริษัทเรียบร้อยแล้ว 2. บริษัทเริ่มเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บ log file จากเครื่อง Server เดิม และได้จัดทำเอกสารเพื่อการปรับปรุง Server ตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการย้ายฐานข้อมูลจากเครื่อง Server เดิม ไปยังเครื่อง Server ใหม่เรียบร้อยแล้ว <b>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</b> 1. การ Config Database 2. การดำเนินการเรื่องการ Backup & Recovery	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		36 การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	ระยะเวลาในการหยุดให้บริการฐานข้อมูล	น้อยกว่า 1 วัน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ประกิจ , มณฑล	RAP124	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37 โครงการระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ และมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในระบบไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ชัยวัฒน์ , ปวีศร	RAP125	4	1,2,3	-	-	ขออนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อจัดหาสื่อ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		38 ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ภาณุวัฒน์	RAP109	4	1,2,3	-	-	ตามการจัดอบรมในโครงการ ICT Competency Training ได้นำมาวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	65	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		39 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , วัชรพงศ์	RAP86	4	1,2,3	-	-	อยู่ระหว่างการทดลองในรายวิชา SWU141 ภายใต้โครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 12	60	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		40 ICT Competency Training 2012	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ภาณุวัฒน์ , จันทนา , จิตติมา	RAP109	4	1,2,3	-	-	ดำเนินโครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 11-12 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือจัดทำรายงานสรุป	70	เร็วกว่าแผน		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
41		- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไฮบริด มศว (SOT2BP)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. มีแนวปฏิบัติที่ดีจำนวน 1 เล่ม 2. มีจำนวนรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 3. มีจำนวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน 4. มีจำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 12 คน 5. มีจำนวนนิสิตที่ใช้ระบบมากกว่า 2,000 คน 6. มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1 ปี 8 เดือน	ต.ค.54-พ.ค.56	อุราพร , สุพิมพ์ , ภาณุวัฒน์ , ชัยวัฒน์ , จิตติมา	SAP9 SAP13	3,4	1,2,3		-	แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดอบรมและอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน ซึ่งโครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2556	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		42	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บ.ก.12)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	5 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ดิเรก , วัชรพงศ์ , พัชรินทร์	RAP66	3,4	1,2,3,6		-	อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อดำเนินการอีก 2 โครงการ ได้แก่ ขยายเครือข่ายโพธิ์วิทยาลัยและน้องหนูเรียนรู้แท็บเล็ต ขาดการจัดทำรายงานทุกโครงการฯ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการหารายได้	43	โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ศิรินุช , สมบุญ , สุชาติพย์ , กรัณซ์รัตน์ , ศิริศศิเกษม	SSAP1	4,5	1,2,3,6	รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	2 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 56	อุราพร , พัชรินทร์	SAP35	5	6		-	อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างเดิมและผลกระทบ	10	ล่าช้า	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
<b>โครงการประจำ</b>																		
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	45	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบนานสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	จันทร์	RAP125	4,5	6	-	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly 3. จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์	75	ดำเนินการแล้วตามแผน		
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	ภายใน 3 เดือนมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 1.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ	1 แผน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ	SAP23	3,5	4	1 แผน	ตามเป้าหมาย	มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	100	เสร็จสิ้น	
		47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง) 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	1.คำสั่ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ , สุวิมล	SAP23 RAP48 RAP50	3,5	4	1 คำสั่ง	ตามเป้าหมาย	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของสำนักคอมพิวเตอร์ และมีวิจัยที่ดำเนินการทำสัญญาขอทุนจำนวน 4 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	48 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ 2.มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน  รายเดือน/ รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สมบุญ , นคร , ดนัย , ญาดา	SAP38	5	4		-	กำลังดำเนินการสรุปผลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		49 จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , ศิริศศิเกษม	RAP99	5	4		-	กำลังดำเนินการสรุปผล	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		50 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คะแนนการประเมินคุณภาพ  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี  ทุก 6 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , นคร , ดนัย , จันทนา	RAP104	5	4		-	กำลังดำเนินการปรับคู่มือ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานการเงินและบัญชี 3. งานพัสดุ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		51 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน  มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน  6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , สุธาทิพย์	RAP122	5	4		-	1. จัดทำแผนแล้ว 2 รายงานการเงินต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		52	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ศิริศศิเกษม	RAP83	5	4		-	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2555	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		53	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณท์รัตน์ , มหัทธวัฒน์	RAP85	5	4		-	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ผลการประเมินได้คะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2555	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		54	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณท์รัตน์ , มหัทธวัฒน์ , พิชรินทร์	RAP85	5	4		-	จัดทำรายงานผลดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอจัดทำสรุปรอบ 12 เดือน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		55	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	กรัณท์รัตน์ , มหัทธวัฒน์ , ชุศรี	RAP85	5	4		-	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , มหัทธวัฒน์ , พรทิพย์	RAP85	5	4		ไม่ประเมิน	1) เนื่องจากในปีนี้ มหาวิทยาลัยใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 เป็นผลการประเมิน ก.พ.ร. แทน ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 2) อยู่ระหว่างจัดประชุม ทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีการศึกษา 2555	100	เสร็จสิ้น	
		57	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร รู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	มีแผนการดำเนินงาน  มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน  รายงานการศึกษา	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ฐิตาภา และทีมงาน	RAP85	5	4	-	-	1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม 5ส 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส โดย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 5ส และ จัดหมายข่าวกิจกรรม 5ส	85	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		58	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ  รายงานการวิเคราะห์ผล	1 แผน  รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก , จันทนา , สวัสดิ์ , เฉลิมพล	RAP93	5	4	-	-	1. จัดทำแผน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มาตรการประหยัดพลังงาน และจดหมายข่าวผ่านเว็บไซต์ระบบคิดดี	85	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	59	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ถาวร และทีมงาน	SAP31 (3)	5	4	-	-	1. ดำเนินการโครงการการรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่น้องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงฯ ของมหาวิทยาลัย	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.54-มิ.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		60	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ธนรรเทพ , วรเศรษฐ์ , เฉลิมพล ปรุรัตน์	RAP71	5	4		-	อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม เพื่อเริ่มโครงการ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		61	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	จินทนา , สุเมธ , ถาวร	RAP71	5	4		-	อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม เพื่อเริ่มโครงการ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		62	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วรเศรษฐ์ , จักรพันธ์ , ญาดา , ชุศรี , สุกัญญา	RAP95	5	4		-	อยู่ระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อนการประหยัดพลังงานและการปรับปรุงให้มีพื้นที่สีเขียว	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
