

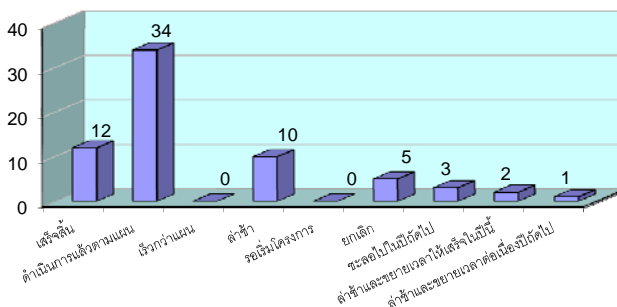


ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2556)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1 โครงการในปีงบประมาณ 2556	67			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	48	71.64		
- โครงการตามแผน	45			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ 65)	1			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3 (โครงการ 66-67)	2			
1.2 โครงการประจำ	19	28.36		
2 ผลการดำเนินงาน				
2.1 เสร็จสิ้น	12	17.91		
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	34	50.75	68.66	3.43
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	10	14.93		
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	5	7.46		
2.7 ชะลอไปในปีที่ต่อไป	3	4.48	31.34	
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	2	2.99		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีที่ต่อไป	1	1.49		
รวม	67	100.00	100.00	

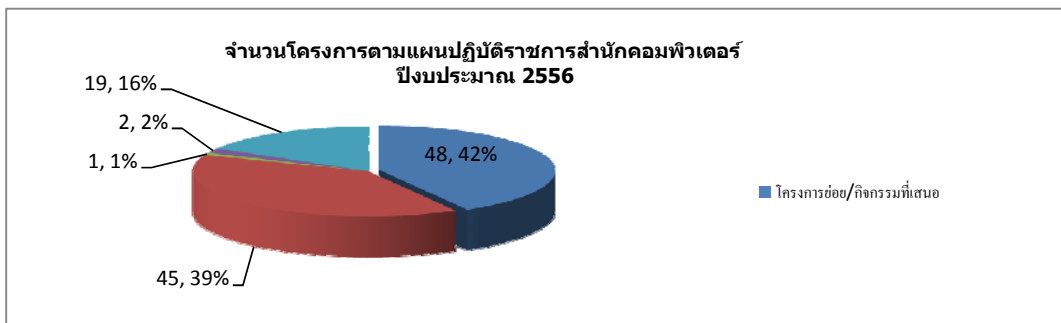

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

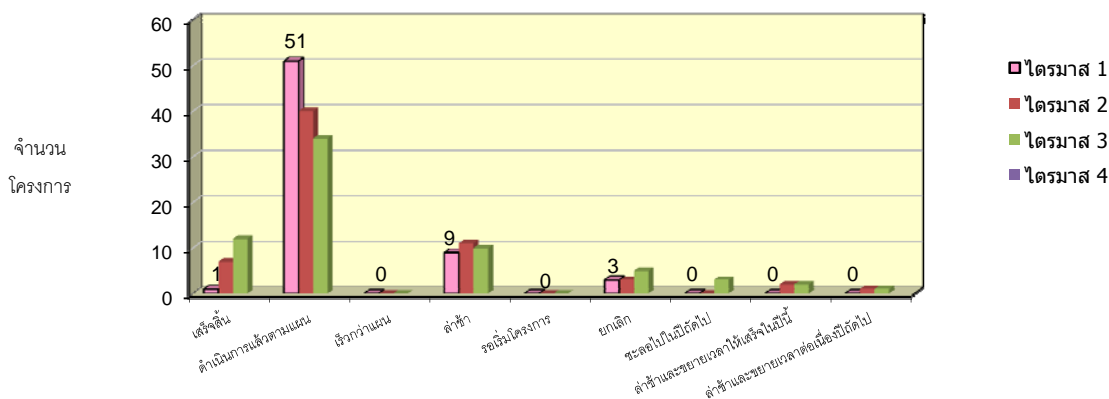

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
1	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	คณะกรรมการ ISM	-	ไตรมาส 3
4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	-	ไตรมาส 3
5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กร (Wireless Controller และ Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 2
6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 2
10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	นคร ถิ่นยธรร ไพโรจน์ ธรณรณพ ปวีริศ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
22	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เฉลิมพล ถิ่นยธรร ญาดา	-	ไตรมาส 3
23	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	นคร ญาดา ถิ่นยธรร ไพโรจน์ ธรณรณพ ชัยวัฒน์	-	ไตรมาส 3
67	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5	ไพโรจน์	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
งานประจำ				
62	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ เฉลิมพล ปวีร์ณณ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
64	Green University ของมหาวิทยาลัย	วรเศรษฐ์ จักรพันธ์ ญาดา ชูศรี	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีที่ถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก พัทธินทร์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ นคร ไพโรจน์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	สมบุญ มหัทธวัฒน์	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในปีงบประมาณนี้	ไตรมาส 3

โครงการย่อย/กิจกรรม (ลำช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในมศว องค์กรฯ	มัทธวัฒน์ นครเฉลิมพล	อยู่ระหว่างรอหาแหล่งเงินงบประมาณมาดำเนินการต่อ
19	ส่งเสริมการใช้งานDotNetNuke New Version	สุวิมล ปวีร์ศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
20	Migrate Web Hosting Server	สุวิมล ปวีร์ศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	วิลาวัลย์ นครศิริศศิเกษมพรทิพย์ และทีม	อาจจะขอยกเลิกโครงการไปทำในปีถัดไป
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศศิเกษม	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม ขณะนี้ได้รับบุคลากรใหม่ จึงได้เริ่มพัฒนาต่อ
26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล ภัทรชัย	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม ขณะนี้บุคลากรที่ลาศึกษาต่อได้กลับมากปฏิบัติงาน จึงได้เริ่มพัฒนา
29	มอดูล จองห้อง online	พรทิพย์ อมรัตน์	-
31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	พรทิพย์ สุวิมล อมรัตน์ วันทนา มณฑลสิริดาภา	-
43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรีนพีร์ตัน	ผู้ดูแลโครงการมีภาระกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
งานประจำ			
61	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	สุทิสาดนัย	-

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเล็ก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเล็กไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	มัทธวัฒน์ นครญาติดา	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด	ไตรมาส 2
15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมองค์กรฯ	ดิเรก ธนรรณพ	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย	ไตรมาส 29
32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุทิสาดนัย	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 2
33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	สมบุญ วิลาวัลย์ มัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทิสาดนัย	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 3
38	ICT Competency Curriculum	ภาณุวัฒน์ วิชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	เนื่องจากได้ออนโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	ธัญธร ญาดา	ขยายระยะเวลา 6 เดือน แรก เป็น 12 เดือน
งานประจำ			
63	จิตอาสาสาธารณะ	จันทนา สุเมธ ถาวร	0

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	เนื่องจากแบบและ คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยและขั้นตอน ในการจัดจ้างมีระยะเวลา คาดว่ามีทันใน ปีงบประมาณ 2556

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																	ผลสำเร็จ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																	
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5	-	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มศว และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง ICT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		2	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอที	องค์กรฯ	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	-	-	บริษัทดำเนินการปรับแบบและคุณสมบัติเฉพาะให้ตรงตาม TOR	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยและขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลา คาด
		4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ขยายบริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ให้กับหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์	3 หน่วยงาน	เฉลิมพล ชันยธร ญาตา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	3	4,7	-	-	ดำเนินการติดตั้งให้กับหน่วยงานตามแบบสำรวจความต้องการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	170 AP	นคร ญาตา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,8	173 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้สมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 AP	นคร ญาตา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,9	30 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้สมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		7	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน มศว องค์กรฯ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตซ์ที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,10	-	-	ผ่านขั้นตอนการเปิดซองจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว การนำส่งอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,11	-	-	- ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของการเดินสายไฟเบอร์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอหาแหล่งเงินงบประมาณมาดำเนินการต่อ	40	ล่าช้า	อยู่ระหว่างรอหาแหล่งเงินงบประมาณมาดำเนินการต่อ
3	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	เพื่อเปิดบริการการลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ Mobile device	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ นคร ญาตา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,12	-	-			ยกเลิก	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด
		10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาตา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,13	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012 เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		11	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	เฉลิมพล ชันยธร ญาตา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,14	-	-	ดำเนินการร่างแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	ชั้นยุทธภูมิตา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,15			จัดทำร่างอุปกรณ์ที่จัดเก็บค่าติดตั้ง (configuration) ของอุปกรณ์	40	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	ขยายระยะเวลา 6 เดือนแรก เป็น 12 เดือน
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสำนักคอมพิวเตอร์และตอบปัญหาผู้ใช้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 FP	นครชั้นยุทธไพโรจน์ธรรณพปวริศ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 17 RAP 28	4	4,16	ติดตั้ง Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์บน Facebook เรียบร้อย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้ง Fan Page บน Facebook เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (https://www.facebook.com/SWUComputerCenter) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	ดิเรกพัชรินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5			บริษัทผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการเข้าปรับปรุง โดยเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
		15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	ดิเรกธรรณพ	องค์กรฯ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5					ยกลึก	เนื่องจากเปิดประมูล ได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	สันตินครไพโรจน์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 28	3,4	1,4,5			อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	เพื่อศึกษาหาแนวทางการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	1 ฉบับ	สมบุญวิลาวัลย์ สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		18	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดการนำสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	11 รายงาน	สมบุญวิลาวัลย์ สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5			1. มีปรับปรุงข้อมูล FTES ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในรายงานที่นำไปใช้ โดยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และเพิ่มรายงานข้อมูลผู้สอนและรายวิชาในแต่ละเดือนที่มีการดึงข้อมูลไปแสดงคลังข้อมูล ดูได้ที่ infoservice.swu.ac.th 2. ปรับปรุงคลังข้อมูล จากไฟล์ในระบบ WISE ที่ไม่ถูกนำเข้าระบบตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2555 ถึงเดือน มีนาคม ปี 2556 3. นำข้อมูลไปใช้ในการตอบงานประกันคุณภาพ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย.56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
6	เว็บไซต์ มศว	19	ส่งเสริมการใช้งาน DotNetNuke New Version	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม DotNetNuke	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	สุวิมล ปวีริศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5			ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่าย แต่ยังไม่ได้ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานจาก Web Hosting เดิม มายังเครื่องใหม่	60	ล่าช้า	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
		20	Migrate Web Hosting Server	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ปวีริศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,4,5			ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้บริการ แต่ยังไม่ได้ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานจาก Web Hosting เดิม มายังเครื่องใหม่	60	ล่าช้า	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
		21	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์ Mobile บนระบบปฏิบัติการต่างๆ	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	สุวิมล ปวีริศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,2,4,5			อยู่ระหว่างการพัฒนา Application on Mobile เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการ Android	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	22	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. นำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวมองค์ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. นำความรู้ที่ได้จากการ	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	จำนวน 5 เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญผล อัญญธร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29 SAP 32	2,5	1,2		-	1. จัดทำเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
23		โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	นศร ญาดา อัญญธร ญาดา ธีรรัตน์ ธีรรัตน์ ธีรรัตน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	4	6			-	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) เกี่ยวกับความรู้ด้านไอที จำนวน 7 เรื่อง เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. 56	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
24		โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันเรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	วิลาวัลย์ นศร ศิริศศิเกษม พรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5					อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการ	10	ล่าช้า
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศศิเกษม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 20	3,4	1,4,5			ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมใหม่ด้วย CakePHP และปรับโครงสร้างการออกแบบระบบจากเดิมบางส่วน	10	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม ขณะนี้ได้รับบุคลากรใหม่ จึงได้เริ่มพัฒนาต่อ
26		ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามโครงการวิจัย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	สุวิมล ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 21	3,4	1,4,5					ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ	60	ล่าช้า

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	วิลาวัลย์ พรทิพย์ วันทนา อำนาง	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			1. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ดังนี้ 1.1 workflow ของระบบจองหอพักนิตินิตเก่าและนิตินิตใหม่ 1.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจองหอพักของนิตินิตเก่าสำหรับเจ้าหน้าที่หอพัก 1.3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจองหอพักของนิตินิตใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่หอพัก 1.4 คู่มือการจองหอพักออนไลน์ของนิตินิตเก่า 1.5 คู่มือการจองหอพักออนไลน์ สำหรับนิตินิตใหม่ 2. ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้ 3. เข้าร่วม/ดูแลการใช้งานระบบจองหอพักของนิตินิตใหม่และนิตินิตเก่า ณ สำนักงานบริหารกิจการหอพัก 4. ปรับปรุงโปรแกรมและพัฒนาระบบเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5. อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิตินิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	พรทิพย์ อมรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			- ร่วมประชุม ประสานงานกับผู้ใช้งานระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ - นำข้อมูลการสมัครงานของนิตินิตจากระบบภายนอก(JOB TOP GUN) เข้าระบบ Job Online - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานต่างๆ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		29	มอดูล จองห้อง online	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	พรทิพย์ อมรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			Phase ที่ 1 - สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานนำร่องการใช้งานระบบจองห้อง - ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้ เพิ่มการนำเข้าข้อมูลสำหรับการจอง และเงื่อนไขในการแสดงผล - ออกแบบหน้าจอนิวเพื่อการจัดวางที่ดียิ่งขึ้น	70	ล่าช้า	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย.56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		30 ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1 แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2 ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย 2.ประเมินแบบการสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		31 ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	พรทิพย์ สุวิมล อมรรัตน์ วันทนา มณฑลสิริตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4				- อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ - ระบบ Supreme สามารถใช้งานได้ - ระบบ Huris ยังทดสอบการใช้งานไม่ครบทุกมอดูลและยังมีปัญหาการใช้งานอยู่มาก	60	ล่าช้า	-
		32 จัดทำแนวทางการนำเสนอสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	10 รายงาน	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
		33 โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	เพื่อติดตั้งระบบ ERP HR Payroll และ ระบบลงทะเบียนเรียน	ความสำเร็จของการทำสัญญาจัดจ้างผู้ประกอบการ	1 สัญญา	สมบุญ วิลาวัลย์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา มณฑลสิริตาภา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	34 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	มณฑลสิริตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			มีการแก้ไขโปรแกรมงานเงินเดือน จำนวน 4 โปรแกรม ระบบสารบรรณ จำนวน 1 โปรแกรม และงานบุคคล จำนวน 1 โปรแกรม และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		35 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ - อยู่ระหว่างรอการจัดจ้างจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "ปรับโปรแกรมการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตามระเบียบการคิดเงิน แบบใหม่" - อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		36	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิ เช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับโปรแกรม/รายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ	สุวิมล ปวีศรี	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 17	4	1,2,3			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรม Web Application เพื่อเป็นระบบเว็บแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ	ระดับดีขึ้นไป	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 5	4	1,2,3					ยกเลิก	เนื่องจากได้ออนโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
		39	ICT Competency Training 2013	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ จิตติมา จันทนา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP4	4	1,2,3			1. อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 14 โดยกำหนดอบรมเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		40	โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 60 คน ไม่น้อยกว่า 12 คน มากกว่า 2,000 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 60 คน ไม่น้อยกว่า 12 คน มากกว่า 2,000 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 2,3	3,4	1,2,3			1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุนสนับสนุนการพัฒนา E-Learning Courseware ภาคการศึกษา 2/2555 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์ที่เสี่ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุนอาจารย์ Mentor และค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล 3. SOT2BP - อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมประเมินผลงานวิจัย	75	ดำเนินการแล้วตามแผน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		41	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2556	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	4 โครงการ	ดิเรก วัชรพงศ์ พัทรินทร์ จิตติมา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 6 SAP 32 SAP 33	3,4	1,2,3,6			1. โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว - กิจกรรมที่ 1.3 ชุมชนพบนักวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรม 2.1 : ห้องสมุดชุมชน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 - กิจกรรม 2.2 : แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมที่ 2.3 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์สถานีวิทยุไม่เสร็จ - กิจกรรมที่ 3.2 : พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ คืบเงินเนื่องจากบุคลากรมีภาระกิจงานประจำเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินการภายใน 25 มิ.ย. 2556 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการหารายได้	42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	สมบุญ มัทธวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 47	4,5	1,2,3,6				ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในปีงบประมาณนี้	
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรีนซอร์ด	สำนักงานผู้อำนวยการ		5	6			อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	40	ล่าช้า	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
		44	โครงการวิจัยสถาบันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	6			อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		45	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ผศ.ศิรินุช	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 29	5	6			เตรียมโครงการศึกษาดูงานด้านไอที ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2

		65	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)	1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	3,4,6			อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
--	--	----	---	--	---	--------	--	------------------	--------	---	-------	--	--	--	----	---------------------	--

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3

		66	โครงการกุเกิลแอปส์เพื่อการศึกษา	1. เพื่อพัฒนานิสิตคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเป็นแกนนำ (Google Guide) ในการประยุกต์ Google Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU GAFE)	จำนวนกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	มหัศจรรย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29	3,4	1,2,3			ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ 1. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3. จัดอบรมนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็น SWU Google Guides ระหว่าง 30 พฤษภาคม 2556 – 6 มิถุนายน 2556 4. จัดกิจกรรมเปิดตัว SWU GAFE เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556	90	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		67	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5	1. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง การนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ไอที	สำนักงานผู้ช่วยการ	RAP 29	3,4	1,2,4	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,015 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 86.16	สูงกว่าเป้าหมาย	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2556 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. บรรยายวิชาการ 2. นิทรรศการความรู้ด้านไอซีที 3. เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีในยุคปัจจุบันผ่านทางวีดิทัศน์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
งานประจำ																	
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	46	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter Face Book	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	ปวีตร นครธนรรณพ ไพโรจน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 17	4,5	6			มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	47	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 โครงการ	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4			อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าการทำวิจัยให้เป็นไปตามแผน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		48	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4			จัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าของโครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	49	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	สมบุญ นครดภัย ญาตา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4			มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		50	จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	แผนอัตราค่าจ้าง ระยะ 4 ปี (2557-2560)	1 ฉบับ	พัชรินทร์ ศิริศศิเกษม ดนัย	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4			อยู่ระหว่างการจัดทำ Career path แต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		51	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติงานทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	พัชรินทร์ นครดภัย จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4			1.มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน 2.อยู่ระหว่างการติดตามผลและเร่งรัดหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปรับปรุงคู่มือภายในฝ่ายให้เรียบร้อย	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		52	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	พัชรินทร์ สุรชาติพิทย์ ภัทรเชวีร์รัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 47	5	4			มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		53	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	สมบุญ ศิริศิริเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4			1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2556	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		54	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	ภัทรเชวีร์รัตน์ มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4			รับการประเมินประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		55	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	ภัทรเชวีร์รัตน์ มหัทธวัฒน์ พัทชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4			อยู่ระหว่างการดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		56	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	ภัทรเชวีร์รัตน์ มหัทธวัฒน์ ชูศรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4			อยู่ระหว่างการดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		57	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	พัชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4			อยู่ระหว่างการดำเนินงานการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		58	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา	จักรพันธ์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ 5 ส	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		59	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	ดิเรก จันทนา สวัสดิ์เฉลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	60	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	ถาวร ไพโรจน์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4			- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2556	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		61	พัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	สุทิสา ดนัย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4			อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดโครงการและเตรียมจัดกิจกรรมในไตรมาส 4	30	ล่าช้า	-
		62	ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	ธนรรณพ วรเศรษฐ์เฉลิมพล ปวรุฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ด้วยใช้ไอที โดยจัดทำเป็นภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรกิจ จำนวน 150 เครื่อง โดยมีภาพพื้นหลังภาษาไทย จำนวน 75 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		63	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	จันทนา สุเมธถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4			- อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุมัติโครงการเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในไตรมาส 4	30	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		64	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	วรเศรษฐ์ จักรพันธ์ ญาดา ชูศรี	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรณรงค์การลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ย. 56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี
