

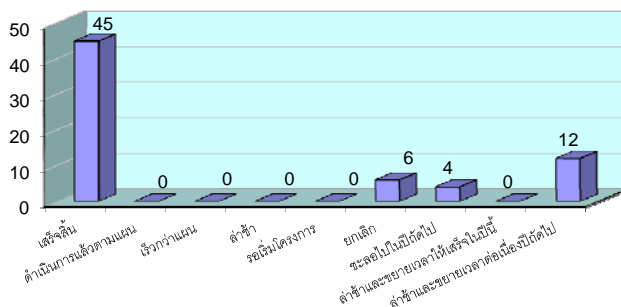


ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2556)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
<b>1 โครงการในปีงบประมาณ 2556</b>	<b>67</b>			
<b>1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>	<b>48</b>	<b>71.64</b>		
- โครงการตามแผน	45			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ 65)	1			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3 (โครงการ 66-67)	2			
<b>1.2 โครงการประจำ</b>	<b>19</b>	<b>28.36</b>		
<b>2 ผลการดำเนินงาน</b>				
2.1 เสร็จสิ้น	45	67.16	<b>67.16</b>	<b>3.36</b>
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0.00		
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	0	0.00		
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	6	8.96		
2.7 ชะลอไปในที่สุด	4	5.97		
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	12	17.91		
<b>รวม</b>	<b>67</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

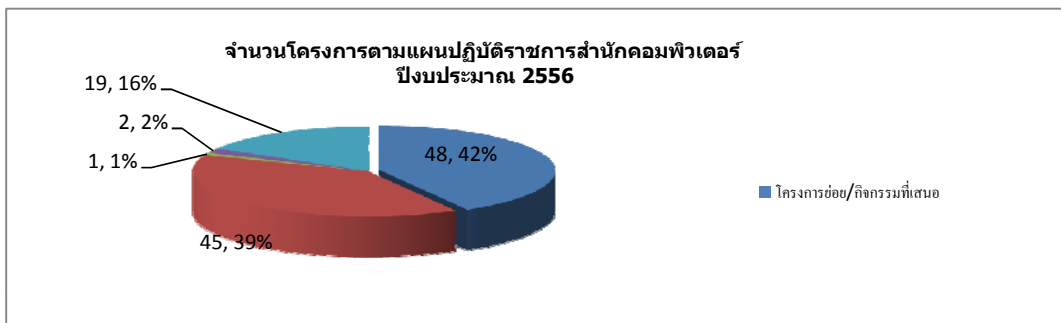

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

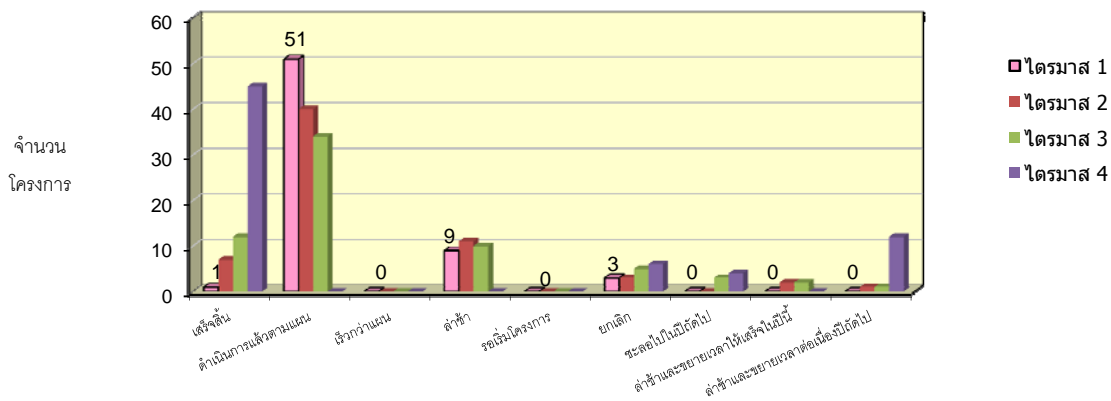

ระดับความสำเร็จ		โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น) -->	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	ตามเป้าหมาย		1	4	2	24
2	สูงกว่าเป้าหมาย		0	2	3	4
3	ต่ำกว่าเป้าหมาย		0	0	0	0
4	ไม่ประเมิน		0	0	0	5
5	-		0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ			1	6	5	33

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>				
14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก พัทรินทร์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ นครไพโรจน์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	สมบุญ มหัทธวัฒน์	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในปีงบประมาณนี้	ไตรมาส 3
43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรีนเวิร์ด	อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>				
9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	มัทธวัฒน์ นครญาติ	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด	ไตรมาส 2
15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม อองครักษ์	ดิเรก ธนรรณพ	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย	ไตรมาส 2
24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	วิลาวัลย์ นครศิริศิริเกษมพรทิพย์ และทีม	ไม่ได้เสนอโครงการ	ไตรมาส 4
32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สมบุญ วิลาวัลย์พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 2
33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	สมบุญ วิลาวัลย์ มัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา มณฑล	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 3
38	ICT Competency Curriculum	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ชัยวัฒน์ ศิริศิริเกษม	เนื่องจากได้อนุมัติโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ นครพงษ์ภูมิพันธ์	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยและขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินการไม่ทันในสิ้นปีงบประมาณ 2556
8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในตึก ออรัล	มัทธวัฒน์ นครเฉลิมพล	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	ธันยธร ญาดา	เนื่องจากคอนฟิกของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีหลากหลายชนิด
19	ส่งเสริมการใช้งานDotNetNuke New Version	สุวิมล ปาวีศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
20	Migrate Web Hosting Server	สุวิมล ปาวีศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัยศิริศศิเกษม	บุคลากรใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาระบบใหม่

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนัก คอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>																			
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้ จำนวน 29 แนวปฏิบัติ	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มศว และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง ICT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		2	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอที	องค์กรฯ	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์ 5 อุปกรณ์ ได้แก่ Server, Core switch, Distribution switch, Access Point และ ตู้ Rack	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำเอกสารมาตรฐานของอุปกรณ์เครือข่าย 5 อุปกรณ์ ได้แก่ Server, Core switch, Distribution switch, Access Point และ ตู้ Rack	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-มี.ค.56	มหัทธวินันดร พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	-	-	ประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR ครั้งที่ 1	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลา คาดว่าไม่ทันใน ปีงบประมาณ 2556
		4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ขยายบริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ให้กับหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล ธีรธรรมญา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	3	4,7	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 44 หน่วยงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งให้กับหน่วยงานตามแบบสำรวจความต้องการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	170 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,8	มีการดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 173 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้สมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,9	มีการดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 30 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้สมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		7	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน มศว องค์กรฯ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมประสิทธิภาพลง	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,10	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 พื้นที่ ได้แก่ มศว องค์กรฯ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้สมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,11	-	-	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง
		9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	เพื่อเปิดบริการการลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ Mobile device	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,12	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด		
		10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,13	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012 เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	เป้าหมาย	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		11	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล ธีรยธรรดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,14	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก 2 พื้นที่ ได้แก่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์	สูงกว่าเป้าหมาย	ตรวจสอบความถูกต้องแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติกเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองครักษ์	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	ธีรยธรรดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,15	-	-	ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และทดสอบสคิปการปรับเก็บ	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากคอนฟิกของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีหลากหลายชนิด
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสำนักคอมพิวเตอร์และตอบปัญหาผู้ใช้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 FP	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	นคร ธีรยธรรดา ไพโรจน์ ธีรยธรรดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 17 RAP 28	4	4,16	ติดตั้ง Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์ บน Facebook เรียบร้อย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้ง Fan Page บน Facebook เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ( <a href="https://www.facebook.com/SWUComputerCenter">https://www.facebook.com/SWUComputerCenter</a> ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน ผลิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ใน ปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก พัทธินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	บริษัทผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการเข้าปรับปรุง โดยเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
		15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	เพื่อให้บริการแก่ผลิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก ธีรยธรรดา	องครักษ์	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากเปิดประมูล ใ้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน ผลิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สันติ นคร ไพโรจน์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	เพื่อศึกษาหาแนวทางการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		18	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดการนำสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	11 รายงาน	3 ปี	ต.ค.54-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน มีมากกว่า 11 รายงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	1. มีปรับปรุงข้อมูลรับสมัคร ผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในรายงานที่นำไปใช้ โดยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และเพิ่มรายงานข้อมูลตามผู้ใช้งานในแต่ละเดือนที่มีการตั้งข้อมูลไปแสดงคลังข้อมูล ดูได้ที่ <a href="http://infoservice.swu.ac.th">infoservice.swu.ac.th</a> 2. ปรับปรุงคลังข้อมูล โดยเพิ่มข้อมูลระบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม ปี 2556 3. นำข้อมูลไปใช้ในการตอบงานประกันคุณภาพ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปึงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)						
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																			ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ
6	เว็บไซต์ มศว	19	ส่งเสริมการใช้งานDotNetNuke New Version	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม DotNetNuke	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5	-	-	ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายเว็บไซต์จาก Web Hosting เดิม มายังเครื่องใหม่	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า	
		20	Migrate Web Hosting Server	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,4,5	-	-	ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้บริการ แต่ยังไม่ได้ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานจาก Web Hosting เดิม มายังเครื่องใหม่	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
		21	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์ Mobile บนระบบปฏิบัติการต่างๆ	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,2,4,5	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้ Application on Mobile เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการ Android	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	22	การจัดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. นำแผนยุทธฯ 15 ปีของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวมองค์ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 4. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	จำนวน 5 เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	มหัทธวินันดร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญผล อ้นยธรรณญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29 SAP 32	2,5	1,2	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 5 เรื่อง ภายใต้อโครงการไอที ทอล์ค 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3	
		23	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นฤ ญาดา อ้นยธรรณญาดา ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	4	6	ตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3	
		24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ นนทรศิริศิเกษมพรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศิเกษม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 20	3,4	1,4,5	-	-	-	ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมใหม่ด้วย CakePHP - ปรับโครงสร้างการออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม - ปรับการออกแบบหน้าจอของระบบใหม่	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	บุคลากรใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาแบบใหม่

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามโครงการวิจัย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 21	3,4	1,4,5		-	- ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ระบบ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	วิลาวัลย์ พรทิพย์ วันทนา อำนวย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	1. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับเทอม2 ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ดังนี้ 1.1 workflow ของระบบจองหอพักนิสิตเก่าและนิสิตเก่าที่ไม่เคยอยู่หอพักในเทอม1 1.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจองหอพักของเทอม2 สำหรับเจ้าหน้าที่หอพักและนิสิต 1.4 คู่มือการยืนยันอยู่หอพักออนไลน์ของนิสิตเก่า 2. ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้ 3. เข้าร่วม/ดูแลการใช้งานระบบจองหอพักของนิสิตเก่า 4. ปรับปรุงโปรแกรมและพัฒนาเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5. อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		28	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- ดำเนินการนำข้อมูลการสมัครงานของนิสิตจากระบบภายนอก (Job Top Gun) เข้าระบบ job online เรียบร้อยแล้ว - การปรับปรุงระบบ และจัดทำรายงานต่างๆตามความต้องการผู้ใช้ ดำเนินการเรียบร้อย - อยู่ระหว่างทดลองการใช้งานระบบ - ในปีการศึกษา 2/2556 จะเริ่มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		29	มอดูล จองห้อง online	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		-	Phase ที่ 1 - สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานนำร่องการใช้งานระบบจองห้อง - ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้ เพิ่มการนำเข้าข้อมูลสำหรับการจอง และเงื่อนไขในการแสดงผล - ออกแบบหน้าจอใหม่เพื่อการจัดการที่ดียิ่งขึ้น	75	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากติดภาระกิจในการพัฒนาระบบงานอื่นที่เร่งด่วนกว่า จึงทำให้การพัฒนาการจองห้องล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		30	ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		-	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1 แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2 ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ร้องขอ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย 2. ประเมินแบบการสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ยังไม่สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
		31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ สุวิมล อมรรัตน์ วันทนา มณฑล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4				- อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ - ระบบ Supreme สามารถใช้งานได้ - ระบบ Huris ยังทดสอบการใช้งานไม่ครบทุกมอดูลและยังมีปัญหาการใช้งานอยู่มาก	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
		33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	เพื่อติดตั้งระบบ ERP HR Payroll และ ระบบลงทะเบียนเรียน	ความสำเร็จของการทำสัญญาจ้างผู้ประกอบการ	1 สัญญา	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ มัทธวีวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุธิสา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	34	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มณฑล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- แก้ไขโปรแกรมเลื่อนชั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ กรณีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้คำนวณทดแทนด้วย - แก้ไขหน้าจอบันทึกภาระงาน ให้สามารถบันทึกภาระงานได้ในกรณีที่ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบอยู่	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		35	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ - การดำเนินงานการจัดจ้างบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบงานของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "ปรับโปรแกรมการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตามระเบียบการคิดเงิน แบบใหม่" ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ คาดว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		36	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3		ไม่ประเมิน	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับโปรแกรม/รายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4



แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มคอ 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			ผลสำเร็จ
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัย	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปรวัตร	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 17	4	1,2,3	มีระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัยผ่านออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัยผ่านออนไลน์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ	ระดับดีขึ้น	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 5	4	1,2,3			ยกเลิก	เนื่องจากได้ออนไลน์โครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้		
		39	ICT Competency Training 2013	เพื่อพัฒนาผลิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรัฐสารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ จิตติมา จันทนา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP4	4	1,2,3	ดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 13 -14	ตามเป้าหมาย	ดำเนินโครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 13-14 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		40	โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มคอ 2.รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มคอ ในปีการศึกษา 2555 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มคอ 5. นิสิตที่ได้รับการจัดการศึกษาไฮบริด มคอ 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ฉบับ	8 เดือน	ต.ค.55-พ.ค.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 2,3	3,4	1,2,3	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มคอ 7 ฉบับ 2.รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มคอ ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 85 รายวิชา 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มคอ 19 คน 5. นิสิตที่ได้รับการจัดการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มคอ จำนวน 10,098 คน 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สูงกว่าเป้าหมาย	1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware - ภาคการศึกษา 2/2555 มีจำนวน 48 รายวิชา 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์ที่เสี่ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มคอ - จำนวน 19 ท่าน 3. SOT2BP - จำนวน 7 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		41	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2556	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอทีที่ ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดตั้งแวลลุ่มการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	4 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก วัชรพงศ์ พัทธินทร์ จิตติมา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 6 SAP 33 SAP 34	3,4	1,2,3,6	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 4 โครงการ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ ตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดตั้งแวลลุ่มการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
11	โครงการหารายได้	42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ มัทธวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 47	4,5	1,2,3,6		-		20	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในงบประมาณนี้
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ ทน. ฝ่ายกรีนซิริตัน	สำนักงานผู้อำนวยการ		5	6		-	อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	45	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
		44	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	6		-	อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		45	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ศศ.ศิริบุษ	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 29	5	6	ได้มีการเสนอเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมฯ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ได้ส่งผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานด้านไอที ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2

		65	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)	1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)	1 ฉบับ	7 เดือน	พ.ค.56-ก.ย.56	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	3,4,6		-	มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระยะ 4 ปี และการปรับแผนการดำเนินงานออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
--	--	----	---	--	---	--------	---------	---------------	--	------------------	--------	---	-------	--	---	---	----	-----------------------------------	--

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3

		66	โครงการดูแลแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา	1. เพื่อพัฒนานิสิตคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเป็นแกนนำ (Google Guide) ในการประยุกต์ Google Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU GAFE)	จำนวนกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	5 เดือน	พ.ค.56- ก.ย.56	มัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29	3,4	1,2,3	2 กิจกรรม - จัดอบรมนิสิตคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็น SWU Google Guides - จัดกิจกรรมเปิดตัว SWU GAFE เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
--	--	----	-------------------------------------	--	--------------	-----------------------	---------	----------------	-----------	---------------------------------	--------	-----	-------	---	-------------	--	-----	-----------	----------

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			ผลสำเร็จ
		67	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5	1. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง การนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	3 เดือน	พ.ค.56- ก.ค.56	ไพโรจน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 29	3,4	1,2,4	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,015 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 86.16	สูงกว่าเป้าหมาย	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2556 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. บรรยายวิชาการ 2. นิทรรศการความรู้ด้านไอซีที 3. เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีในยุคปัจจุบันผ่านทางวีดิทัศน์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

งานประจำ

1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	46	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter Face Book	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ปวีตร นรธรรมพรไพโรจน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 17	4,5	6	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	47	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4	- มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี จำนวน 1 แผน - มีจำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ	ตามเป้าหมาย	มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี และมีจำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		48	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4	มีจำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมติดตามและให้ความรู้ด้านงานวิจัย และส่งเข้ารับการอบรม	ตามเป้าหมาย	จัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าของโครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์ และส่งนักวิจัยรับการอบรมด้านวิจัยจากมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	49	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ นรณิตย์ญาดา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4	- มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี จำนวน 1 แผน - บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	ตามเป้าหมาย	มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		50	จัดทำแผนอัตรากำลัง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงาน	แผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (2557-2560)	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ ศิริศักดิ์เกษมดภัย	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4	แผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุงตามประกาศ ก.พ.อ ฉบับปัจจุบัน และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 2.เตรียมปรับปรุงแผนกรอบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		51	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ นรณิตย์จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4	คู่มือฉบับปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	1.มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแล้ว 2.มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการต่อไป และทำการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยขึ้นในปีถัดๆ ไป	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		52	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ สุรชาติพิทย์กรัณษิ์รัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 47	5	4	1 แผน รายงานผลการดำเนินงาน	ตามเป้าหมาย	มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
53		ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมณบดีศิริคดีเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ เป็นรายไตรมาส	สูงกว่าเป้าหมาย	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนกันยายน 2556 3. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
54		การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
55		การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็ง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์ พิษรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	- มีแผนการควบคุมภายใน จำนวน 1 แผน - มีการรายงานผลการดำเนินงาน ฝดฝ/	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
56		การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์ ชูศรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	- มีแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 แผน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
57		การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พิชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำคำรับรอง 2.จัดทำรายงานผล ปีงบประมาณ 2556 เสนอผู้บริหารเดือนตุลาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
58		การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	จักรพันธ์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4	1.มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามภาคการศึกษา	ตามเป้าหมาย	มีการจัดกิจกรรม Big Clean Day วันที่ 6 ก.พ.56 ณ สำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
59		การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก จันทนา สวัสดิ์ เจลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4	1. มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบ ไตรมาส 4	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย. 56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			โครงการย่อย/กิจกรรม
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	60	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ถาวร ไซโรจน์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4	3 กิจกรรม 1)โครงการถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ 3) กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 19 ปี" เมื่อ 29 ธ.ค. 2555	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการ โครงการถวายเทียนพรรษา 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		61	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุทิสา ดันย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์สู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		62	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	ธนรณพร เจริญเลิศ พลบูรณ์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ด้วยไอที โดยจัดทำเป็นภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ จำนวน 150 เครื่อง โดยมีภาพพื้นหลังภาษาไทย จำนวน 75 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		63	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	จันทนา สุเมธถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดทำโครงการรณรงค์จิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม : บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสอน ให้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภออ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดนครนายก	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		64	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	วรเศรษฐ์ จักรพันธ์ ญาติชูศรี	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรณรงค์การลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

**ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์อย่างรู้เท่าทัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี
