
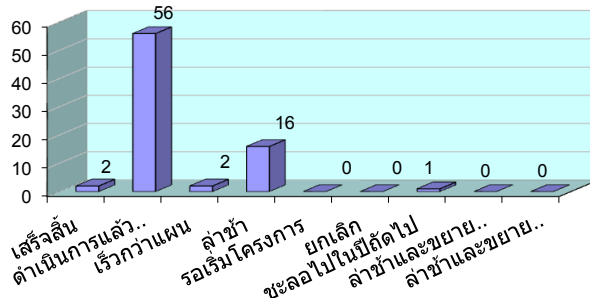



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

ผลดำเนินงาน		จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1 โครงการในปีงบประมาณ 2557		77			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		58	75.32		
- โครงการตามแผน		58			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 1 (โครงการ ...)		0			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ ...)		0			
1.2 โครงการประจำ		19	24.68		
2 ผลการดำเนินงาน					
2.1	เสร็จสิ้น	2	2.60	77.92	คะแนน เต็ม (5)
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	56	72.73		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	2.60		
2.4	ล่าช้า	16	20.78		
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	0	0.00		
2.7	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	1	1.30		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีที่ถัดไป	0	0.00		
รวม		77	100.00	100.00	

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2557



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

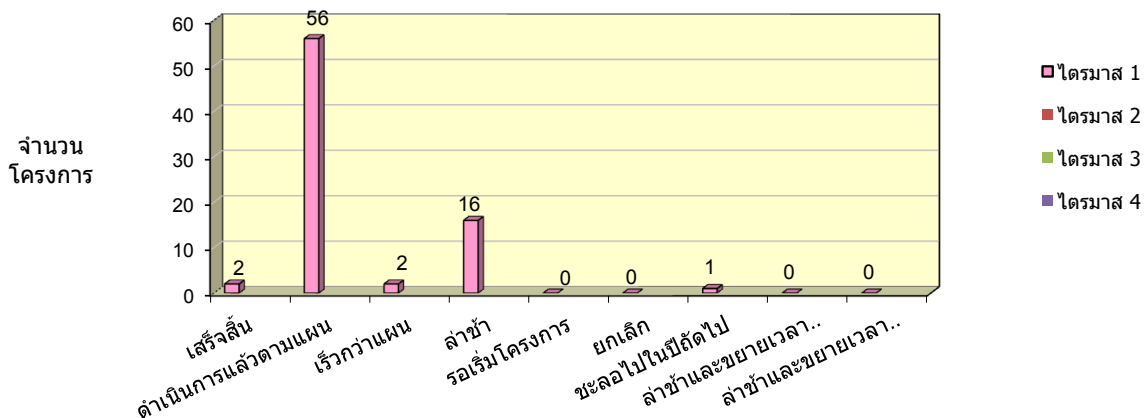

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
8	ระบบตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network monitor)	มหัทธวัฒน์ ประกิจธันยธร	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ไตรมาส 1
11	ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนผ่านอุปกรณ์พกพา (VPN on Mobile)	มหัทธวัฒน์ ธันยธร ภาคภูมิ	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ไตรมาส 1

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
14	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออกรักษ์	ธนรรณพ ดิเรก	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม่ได้รับวงเงินจัดสรร	

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
13	ระบบแสดงผังครุภัณฑ์ประจำห้อง ณ คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ ดิเรก	-
14	ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับหน่วยงาน เพื่อรองรับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	ไพโรจน์ ดิเรก	อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณ
18	เสริมสร้างความร่วมมือการมีผู้ใช้ไอซีทีที่ดี	อำนาจ ดิเรก	อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
23	ปรับโฉมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	สุวิมล ปวีศรี	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
30	HURIS on Mobile	มณฑล ฐิตาภา	-
31	ปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ - Web Application - Back Office	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
32	ระบบงาน TQF ระยะที่ 2 - Web Application	พรทิพย์ ภัทรชัย ฐิตาภา	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
35	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	พรทิพย์ วิลาวลัย และทีม	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
37	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ	สุทิสรา วิลาวลัย พรทิพย์ สมบุญ	-
38	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
39	ระบบบริการ การศึกษา	พรทิพย์ วิลาวลัย อมรรัตน์ วันทนา สมบุญ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
46	ศึกษา Google API สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ GAFE	สุวิมล ปวีศรี ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
48	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	สุวิมล ปวีศรี ชัยวัฒน์	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
49	ย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่	ประจักษ์ มณฑล	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
50	จัดหาเครื่องมือเพื่อการพัฒนากระบวนการ	พรทิพย์ มณฑล	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
58	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ พรทิพย์ นครสันติ	อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ									โครงการย่อย/กิจกรรม	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนครพนงภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	project_01			บริษัทดำเนินการปรับแบบและคุณสมบัติเฉพาะให้ตรงตาม TOR	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องครักษ์	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนครเฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	4,5	project_02			ดำเนินการสรุปและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		3	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WISE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	นครญาติเฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	4,5	project_03			ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของอุปกรณ์ และกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		4	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ภาคภูมิ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	4,5	project_04			ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของอุปกรณ์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		5	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	5	project_05			ตรวจสอบระบบปัจจุบันและเตรียมความพร้อมการติดตั้ง Hyper-V เวอร์ชันใหม่	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		6	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนครกิจฉัตร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	5,6	project_06			ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของอุปกรณ์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		7	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	5	project_07			ตรวจเช็คโปรแกรมเดิมในส่วนที่ต้องปรับแก้ไข	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
2	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีที	8	ระบบตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network monitor)	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ภาคภูมิ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	5	project_08	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	100	เสร็จสิ้น	
9		ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ไวเลสและระหว่างมหาวิทยาลัย (Eduroam)	เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายไวเลสแลนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานเครือข่ายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มัทธวิวัฒน์ นคร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4,5	4,5	project_09			ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านชื่อเครือข่าย Eduroam ในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	30	ดำเนินการแล้วตามแผน		
10		พัฒนาระบบเครือข่ายบิวทรีไฟร์รองรับนวัตกรรมหมายเลขไอพีแอดเดรส เวอร์ชัน 6 (IPv6)	เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบิวทรีไฟร์รองรับ IPv6	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มัทธวิวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญพล ชัยยธร ญาดา ภาคภูมิ ธนภักดิ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2,5	4,5	project_10			ติดตั้งและทดสอบระบบ IPv6 ในส่วนทดสอบและสามารถทำงานได้	60	เร็วกว่าแผน		
11		ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนผ่านอุปกรณ์พกพา (VPN on Mobile)	เพื่อรองรับการเข้าถึงเครือข่ายบิวทรีไฟร์อย่างปลอดภัยผ่านอุปกรณ์พกพา	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มัทธวิวัฒน์ ชัยยธร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28 RAP 17	2,5	4,5	project_11	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบ VPN ให้รองรับอุปกรณ์พกพา (Mobile) และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	เสร็จสิ้น		
12		จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.56-มิ.ค.57	ไตรมาส 2	กันยธร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,5	5	project_12			ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์และวิธีการดำเนินงาน	20	ดำเนินการแล้วตามแผน		
13		ระบบแสดงผังครุภัณฑ์ประจำห้อง ณ คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	แสดงความพร้อมของครุภัณฑ์ประจำห้องเพื่อให้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สันติ ตีแรก	ฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	RAP 28	3,4	1,4,5	project_13			ศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา	10	ล่าช้า	-	
14	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กร	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	2 ปี	ต.ค.56-ก.ย.58	ไตรมาส 4	ภรตพร ตีแรก	องค์กร	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5	project_14					ชะลอไปในปีที่ถัดไป	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ได้รับวงเงินจัดสรร		
15	ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานเพื่อรองรับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	เพื่อนำร่องสำหรับการใช้งานข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	จำนวนบริการทำ SLA	5 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ไพโรจน์ ตีแรก	ฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5	project_15			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณ		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถทำตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
		16	เปิดบริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาใหม่ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	3 รายการ	4 ปี	ต.ค.56-ก.ย.60	ไตรมาส 4	ดีเรก วเรชชัวร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5	project_16			วิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาใหม่สำหรับนิสิตและบุคลากรเรียบร้อยแล้ว (ระบบบริหารจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร)	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		17	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของหน่วยงานให้ผู้ให้บริการทราบ	จำนวนช่องทางใหม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	1 ช่องทาง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ธนรณพ ดีเรก	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 17	3,4	1,4,5	project_17			ศึกษาข้อมูลของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานบริการไอที	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		18	เสริมสร้างความร่วมมือการฝึกอบรมของบุคลากรตามวิชาชีพ	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามวิชาชีพ	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อำนาจ ดีเรก	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 29	3,4	1,4,5	project_18			ศึกษารูปแบบในการจัดกิจกรรมและจัดเตรียมหัวข้อในการอบรม	10	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
4	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	19	ระบบ BI เพื่อการบริหาร	เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล	จำนวนรายงาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุวิมล วิลาวัลย์ สมบุญ	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	project_19			1.ดำเนินการติดตั้ง Software ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 1. Windows 2012 2. MS SQL2012 3. MS Office 4. MS Sharepoint ดูได้จาก Server IP 10.1.3.95 และ 10.1.3.134 2.ดำเนินการศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ประกอบด้วย 1. Windows 2012 2. MS SQL2012 3. MS Office 4. MS Sharepoint	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
5	เว็บไซด์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	20	ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม CMS	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5	project_20			อัพเกรดระบบให้เป็นปัจจุบัน และติดตั้งโมดูลใหม่เช่น โมดูลบทความ โมดูลอัลบั้มรูปภาพ เป็นต้น	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		21	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่าย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	2	1,4,5	project_21			ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายจริง	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		22	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	2	1,2,4,5	project_22			จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		23	ปรับโฉมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีตร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 28 RAP 29	2	1,2,4,5	project_23			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		24	ส่งเสริมการใช้งานระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมความรู้	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	2	1,2,4,5	project_24			ทดสอบการทำงานของระบบบนระบบปฏิบัติการต่างๆ และบราวเซอร์ Internet Explorer, Chrome และ Firefox	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
ที่	กลุ่มโครงการ									โครงการย่อย/กิจกรรม	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																				
6	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 2	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สิริมลภัทรชัย อมรธา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_25		พัฒนาระบบในส่วนของการนำเสนอข้อมูลรายงานสรุปในมุมมองต่างๆ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		26	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	จำนวนรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	อย่างน้อย 2 รายงาน	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	วันทนา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_26		เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานสำนักงานบริหารกิจการหอพัก เพื่อรวบรวมและสรุปความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาาระบบเพิ่มเติม	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		27	ส่งเสริมการใช้งานระบบส่งเสริมการทำงานทำของนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ อมรรัตน์ รุ่งดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_27		- ประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ - ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ - ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	ระบบจองห้อง online ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	จำนวนหน่วยงานที่นำระบบจองห้องไปใช้งาน	3 หน่วยงาน	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_28		- ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		29	ส่งเสริมการใช้งาน ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	5 หน่วยงาน	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5	project_29		- จัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 1. รายงานผลการประเมินระดับคณะ (ปค003/03) เพิ่มการรายงานให้จำแนกตามอาจารย์ผู้สอน 2. แบบรายงานผลการประเมินระดับภาควิชา (ปค003/02) เพิ่มการรายงานให้จำแนกตามอาจารย์ผู้สอน 3. รายงานผลการประเมินระดับคณะ (ปค004/03)เพิ่มการรายงานให้จำแนกตามอาจารย์ผู้สอน 4. รายงานผลการประเมินระดับภาควิชา (ปค004/02)เพิ่มการรายงานให้จำแนกตามอาจารย์ผู้สอน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		30	HURIS on Mobile	เพื่อให้ระบบ HURIS (ทะเบียนประวัติ) ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มณฑลสิริดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	3,4	1,4,5	project_30		อยู่ระหว่างการศึกษาเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม	10	ล่าช้า	-
		31	ปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ - Web Application - Back Office	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_31		ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		32	ระบบงาน TQF ระยะที่ 2 - Web Application	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ภัทรชัย รุ่งดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_32		ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
		33	ระบบงานจองรถตุ่มมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบงานจองรถตุ่มมหาวิทยาลัย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_33			1.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อรวบรวมความต้องการของระบบ 2.ออกแบบระบบ และนำเสนอภาพรวมการทำงานของระบบให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ 3.อยู่ระหว่างการออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		34	ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2	เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	6 เดือน	ต.ค.56-มี.ค.57	ไตรมาส 2	สินันต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_34			ดำเนินการพัฒนา ติดตั้ง และอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานหน่วยงาน	100	เร็วกว่าแผน	
		35	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มคอ 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนคู่มือการใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วิลาวัลย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5	project_35			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		36	ส่งเสริมการใช้งาน ระบบรับนิสิตใหม่ สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย	หน่วยงานสามารถใช้งานระบบรับนิสิตใหม่ เพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	วันทนา วิลาวัลย์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5	project_36			1.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 2.จัดทำคู่มือการใช้งานระบบส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 3.ให้คำแนะนำ/ปรึกษา ในการเตรียมข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่ ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 (อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดรับสมัครนิสิต)	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	37	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีพัสดุ	เพื่อให้มีระบบการพัสดุ การเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขตของโครงการฉบับจริง	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุทธิสา วิลาวัลย์ พรทิพย์ สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5,6	project_37			คณะกรรมการบริหารโครงการ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง(TOR) แล้ว	10	ล่าช้า	-
		38	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มณฑลวิลาวัลย์ สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,6	project_38			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		39	ระบบบริการ การศึกษา	เพื่อจัดหาระบบลงทะเบียนเรียนใหม่	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_39			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
8	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	40	บำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มูลนิธิสุติภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_40			1.แก้ไขหน้าจอทะเบียนประวัติ ในส่วนของค่านำหน้าชื่อ เมื่อเลือกค่านำหน้าชื่อภาษาไทยแล้ว ให้ระบบทำการเลือกค่านำหน้าชื่อภาษาอังกฤษขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 2.แก้ไขหน้าจอปิดยอดเงินสวัสดิการ เมื่อทำการปิดยอดเงินสวัสดิการ ยอดเงินรออนุมัติจะต้องไม่หายไป 3.ปรับปรุงมอดูลการออกคำสั่งประเภทคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ให้ระบบไปหย้อนข้อมูลในตารางผู้ดำรงตำแหน่งบริหารด้วย 4. ตรวจสอบข้อมูลงานลาศึกษา และงานดำรงตำแหน่งบริหารเพื่อทำการ migrate ข้อมูล	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		41	บำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนาอมรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	project_41			- ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ - จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		42	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วิลาวัลย์สุริยมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_42			- ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ - จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	มาตรฐานการพัฒนา ระบบสารสนเทศ	43	ระบบจัดการ Source Program	เพื่อปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่มีการนำ Control Version มาใช้	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ภัทรชัย ประกิจมณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_43			จัดเตรียมเครื่อง Server สำหรับติดตั้งโปรแกรม control version	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)	44	ศึกษาการใช้งานระบบ LMS	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	รายงานผลการศึกษาระบบ LMS	1 เล่ม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3	project_44			จัดเตรียมเครื่อง Server และ Service พื้นฐาน (Apache, php) เรียบร้อยแล้ว	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		45	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Atutor	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor - เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย - เชื่อมข้อมูลรายวิชาจากระบบ SUPREME	รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor	1 เล่ม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 2 SAP 3 RAP 28	3,4	1,2,3	project_45			- ระบบ ATutor ไม่สามารถแสดงข้อมูลภาษาไทยหลังจากการปรับปรุงระบบ - หรือเพื่อกำหนดรูปแบบและทดสอบการเชื่อมข้อมูลรายวิชาจากระบบ SUPREME	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ									โครงการย่อย/กิจกรรม	มคอ. 15 ปี	สำนัก คอมฯ		ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
11	Google Apps for Education	46	ศึกษา Google API สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ GAFE	เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบ Google App	คู่มือการใช้ Google API	1 เล่ม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน ปรวิศร ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3	project_46			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		47	Personal Web (Google Site)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้สร้างเว็บไซต์อย่างง่าย	จำนวนเว็บไซต์	50 เว็บไซต์	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน ปรวิศร ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_47			ศึกษาการใช้งาน Google Site	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		48	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน ปรวิศร ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_48			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
12	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน	49	ย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล CCDB	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ประจักษ์ มณฑลดี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	project_49			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
		50	จัดหาเครื่องมือเพื่อการพัฒนา ระบบงาน	เพื่อปรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย	จำนวนบุคลากรสาย IT ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ มณฑลดี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	1	4,5	project_50			ยังไม่เริ่มโครงการ	0	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
13	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	51	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง "ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC" 2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ศิริศศิเกษม ไพโรจน์ จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 6 SAP 33 SAP 34	3,4	1,2,3,6	project_51			โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2557 ได้ดำเนินโครงการ 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง "เสริมสร้างบรรจุภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล" เปลี่ยนชื่อโครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง "ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC" 2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการอนุมัติ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																					
14	โครงการหารายได้	52 โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สมบุญ มัทธวีวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	4,5	1,2,3,6	project_52			อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพื่อเตรียมหลักสูตร	10	ดำเนินการแล้วตามแผน		
15	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	53	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ (ร่าง)	1 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.56-ก.ย.58	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ ทน. ฝ่าย กรีนเชริตัน	SAP 43	5	6	project_53			อยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน		
		54	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	มีกิจกรรมตามแผนดำเนินงานของคณะกรรมการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 21	5	6	project_54			อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินการ	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		55	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดีที่สุด	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมการศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	5	6	project_55			อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		56	งาน Open house ครอบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ วันทนาไพโรจน์ อำนวยสรุทธาทรัพย์ กรีนเชริตัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17	4	6	project_56			1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน 2. ดำเนินการตามแผน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	
57	Green University ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.56-มี.ค.57	ไตรมาส 2	ดีเรก สุธาทรัพย์ จักรพันธ์	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 04 RAP 16	5	4	project_57			อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ	10	ดำเนินการแล้วตามแผน			
58	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ พรทิพย์ นครสันติ	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 02 RAP 29	4,5	4,5,6	project_58			อยู่ระหว่างการศึกษาหลักการ Lean Management ในการบริหารงาน	10	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan		ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
งานประจำ																					
1	การเร่งรัดการรู้จัก SWU IT Services	59	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่ทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปวีตร นคร สิริมล ธรบรรณ ศิริศศิเกษม จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17	4,5	6	project_59			มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	60	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2. จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อ.วัชรชัย ประกิจ สิริมล ไพโรจน์ ชัยวีวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 21	3,5	4	project_60			อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยประจำปี	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		61	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อ.วัชรชัย ประกิจ สิริมล ไพโรจน์ ชัยวีวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 20	3,5	4	project_61			อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการติดตามโครงการวิจัย	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของ สำนักคอมพิวเตอร์	62	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สมมย นคร ดนัย ญาตา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 43	5	4	project_62			1. ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2. มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		63	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ นคร สันต์ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4	project_63			หัวหน้าฝ่ายกำลังดำเนินการรวบรวมและจัดทำเป็นระบบ	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		64	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ สุรชาติพรย์ ภัทรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 48	5	4	project_64			1.มีแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2557 2.มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
	65	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สมณบุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4	project_65			1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 2. อยู่ระหว่างการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 1	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	66	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ไพโรจน์ รัตนานุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	project_66			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556 2. จัดประชุมติดตามผลดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ 3. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	67	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	กรวิชัยรัตน์ พิชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	project_67			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 3.ดำเนินงานตามแผน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	68	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มัทธวิวัฒน์ บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	project_68			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่วความเสี่ยง 3.มีแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (แบบฟอร์ม RM 7.4) 3.ดำเนินงานตามแผน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	69	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ มัทธวิวัฒน์ พรทิพย์ บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	project_69			1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีการประชุมเพื่อติดตามงาน	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	70	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมในบุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	จักรพันธ์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4	project_70			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 2. มีแผนการดำเนินงาน 5 ส	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	71	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สันติ จันทนา สวัสดิ์ วรเศรษฐ์	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4	project_71			1. จัดทำแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2557 2. ได้รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากร ผ่านเมล	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																					
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.56-ธ.ค.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถทำตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	72	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุชาติพงษ์ ไพโรจน์ถาวร และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4	project_72			1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำกิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 20 ปี" เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหารและวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		73	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สุทธิสา ดนัย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4	project_73			1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		74	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ดีเรกถาวรสันต์ พิชรินทร์ สุราทิพย์ กรวิฑูร์วิรัตน์ ศิริศศิเกษม	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	project_74			อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	
5	โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	75	จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ศิริศศิเกษม จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 4 RAP 29	3,4	1,2,3,6	project_75			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 15 (พ.ย. 56 - มี.ค. 57)	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
6	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	76	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5	project_76			ดำเนินการร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเสร็จสิ้นแล้ว รอดำเนินการให้ท่านอธิการบดีลงนาม	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		77	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอที	องค์กรฯ	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6	project_77			อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริหารวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี

แหล่งเงิน	งบประมาณ (บาท)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
เงินรายได้	5	8	13
เงินแผ่นดิน	1	0	1
เงินแผ่นดิน (บก)	1	0	1
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	0	0	0
เงินยืมมหาวิทยาลัย	0	0	0
บริการวิชาการแบบครั้งคราว	0	0	0
รวม	7	8	15

สถานะการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
เสร็จสิ้น	0	0	0
ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0	0
เร็วกว่าแผน	0	0	0
ล่าช้า	0	0	0
รอเริ่มโครงการ	0	0	0
ยกเลิก	0	0	0
ชะลอไปในปีที่ถัดไป	0	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	0	0	0
รวม	0	0	0

ระดับผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
ตามเป้าหมาย	2	0	2
สูงกว่าเป้าหมาย	0	0	0
ต่ำกว่าเป้าหมาย	0	0	0
ไม่ประเมิน	0	0	0
รวม	2	0	2

ฝ่าย	จำนวนโครงการ	โครงการใหม่	โครงการประจำ
สำนักคอมพิวเตอร์	19	8	11
สำนักงานผู้อำนวยการ	7	0	7
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	12	12	0
ฝ่ายระบบสารสนเทศ	31	31	0
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	5	5	0
องค์กรกีฬา	2	1	1
ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	0	0	0
ศูนย์ UOC	1	1	0
รวม	77	58	19
