

2554

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานผลดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

CONTENTS

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	1
☉ การจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	4
☉ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559	4
☉ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	6
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	9
ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	10
ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	11
ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	12
ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน	13
ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2554	14

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักคอมพิวเตอร์มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (<http://cc.swu.ac.th>)

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำงานบำรูงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้น ในการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไป


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่อุปการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องได้เตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2550-2554 เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความสำร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไว้ดังนี้



ผลดำเนินงาน				จำนวน โครงการ ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1 โครงการในปีงบประมาณ 2554				54			
1.1	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			35	64.81		
1.2	โครงการประจำ			19	35.19		
2	ผลการดำเนินงาน	โครงการ ย่อย/ กิจกรรม ที่เสนอ	โครงการ ประจำ	รวม	ร้อยละ	ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	26	18	44	81.48	88.89	4.44
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	4	0	4	7.41		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0	0	0.00		
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	1	1	2	3.70		
2.7	ชลออกไปในปีถัดไป	0	0	0	0.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ ในปีนี้	0	0	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	4	0	4	7.41		
รวม		35	19	54	100.00	100.00	

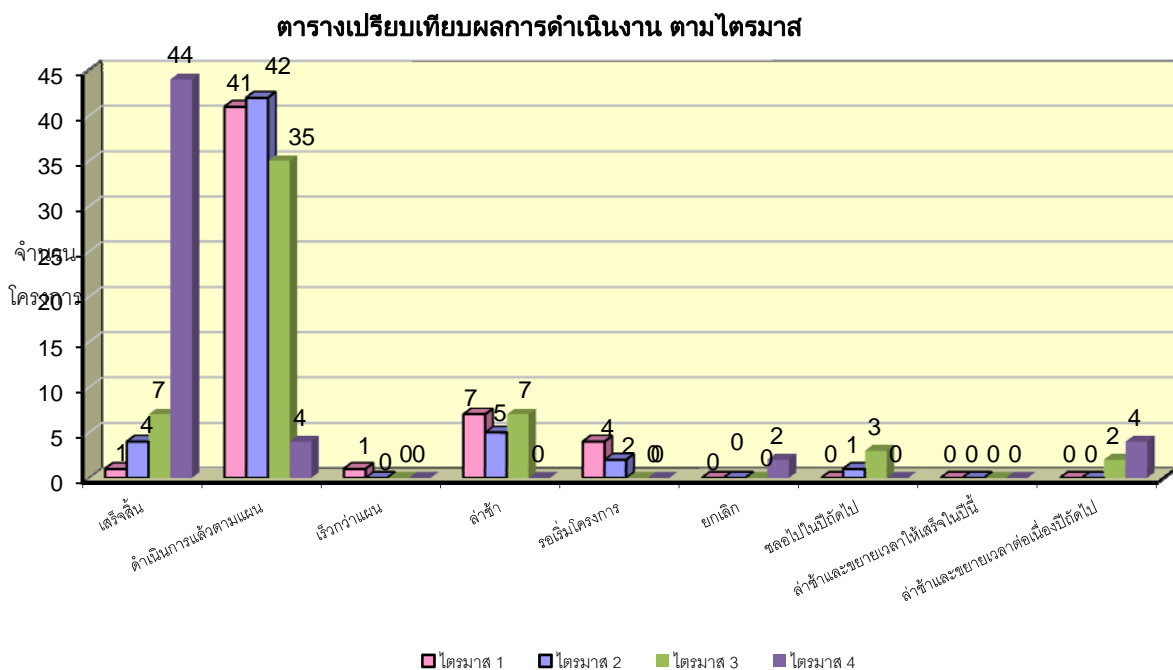

1. สำนักคอมพิวเตอร์มีแผนกลยุทธ์ศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบกำกับ ดูแล ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 ได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ปี 2555-2559
2. สำนักคอมพิวเตอร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายในผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ และจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าว
URL : <http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>
3. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีต่อไป
 - ▶ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัย
4. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
5. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
6. สำนักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
7. สำนักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
8. สำนักคอมพิวเตอร์มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

➡ การจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี



<http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>

➡ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559

สำนักคอมพิวเตอร์มีแผนกลยุทธ์ศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบกำกับ ดูแล ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 ได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2554 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมดังนี้

▶ จัดทำ SWOT แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้บุคลากรทำการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2550-2554 เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 16-406 และห้องประชุมทางไกล (VC2) ผ่านระบบ Video conference





▶ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559”

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2554 - วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ และ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2550-2554 และระดมสมองผู้บริหารและบุคลากรร่วมกัน วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT) แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสระดมสมองและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559





ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ปี 2555-2559 โดยในปีงบประมาณ 2555 ให้ใช้แผนฯ ฉบับเดิมไปพลางก่อน

➔ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยึดหลัก PDCA (Plan Do Check Act) ในการทำงานและเป็นการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ▶ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี
- ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
- ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัย
- ▶ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านที่ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน
- ▶ มีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น



และได้มีการนำเสนอแผน ผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ กำกับ ดูแล และนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ตามลำดับ รวมถึงประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินการแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

21 ต.ค. 53	นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2553
21 ต.ค. 53	นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 5/2553
10 พ.ย. 53	การจัดทำยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ให้รองรับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2553
16 ธ.ค. 53	มอบให้คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2553
6 ม.ค. 54	ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2554
19 ม.ค. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2554
19 ม.ค. 54	นำเสนอการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2554
27 ม.ค. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2554
3 ก.พ. 54	จัดทำ SWOT แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2550-2554 เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
3 ก.พ. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2554
10 ก.พ. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 1/2554
16 ก.พ. 54	นำเสนอประเมินแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับ ปี 2550- 2554 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2554

กิจกรรมดำเนินการแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

3 มี.ค. 54	นำเสนอรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550-2554 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2554
10 มี.ค. 54	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559” เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2554
29 มี.ค. 54-1 เม.ย. 54	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559”
19 เม.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 2/2554
25 เม.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2554
25 เม.ย. 54	นำเสนอรายงานความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปี 2555-2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2554
27 เม.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2554
2 มิ.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2554
13 ก.ค. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2554
14 ก.ค. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2554
27 ก.ค. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2554
1 ก.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2554

กิจกรรมดำเนินการแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

9 ก.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2554
9 ก.ย. 54	นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2554
14 ก.ย. 54	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4 และ แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2554

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. การติดตามผลดำเนินงานแต่ละไตรมาส แต่ละฝ่าย จะใช้เวลาในการติดตามมาก เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบมีภาระงานค่อนข้างมาก
2. โครงการบางโครงการถูกยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกและการเข้าออกของบุคลากร เช่น โครงการการจัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower ยกเลิกไปเนื่องอาคาร Learning Tower ยังไม่เสร็จ หรือการติดตั้งระบบ Protal รายบุคคล สำหรับนิสิต และบุคลากร ชะลอไปปีหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาระบบดังกล่าวได้ลาออก เป็นต้น
3. ควรมีการวิเคราะห์ในเรื่องของงานที่กำลังคนในการทำงาน หรือให้มีบางส่วน Outsource เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์

1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
12. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	กรรมการ
13. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป	กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	กรรมการ
18. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์	กรรมการ
19. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต	กรรมการ
20. อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธวิรัช	กรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ
22. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ
23. อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

1. ศาสตราจารย์วิลาศ ววงศ์	ที่ปรึกษา
2. นายพีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ	ที่ปรึกษา
3. นางสุวิภา วรรณสาธพ	ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	ประธาน
5. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)	กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ณสรณ์ ผลโภาค (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา)	กรรมการ
9. อาจารย์สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
10. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
11. นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
12. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
13. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช (เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์)	เลขานุการ

ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

1. นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2. อาจารย์สาโรช เมลลันนท์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง)	ที่ปรึกษา
3. อาจารย์อรุณพ โพธิสุข	ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	ประธาน
5. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการ
7. อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
9. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
10. นายดิเรก อั้งตระกูล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ)	กรรมการ
12. นายนคร บริพนธ์มงคล (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)	กรรมการ
13. นายสันติ สุขยานันท์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ)	กรรมการ
14. นางพัชรินทร์ สนธิวิเศษ (เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์)	กรรมการและเลขานุการ



ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	2553			2554								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	★											
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	★											
3. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผ่านที่ประชุมสำคัญต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 	★											
4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
5. ติดตามผลดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นรายไตรมาส และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 			★			★			★			★
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ												★


ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม		ร้อยละ			
1 โครงการในปีงบประมาณ 2554	54					
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35		64.81			
1.2 โครงการประจำ	19		35.19			
2 ผลการดำเนินงาน	โครงการย่อย/ กิจกรรมที่เสนอ	โครงการ ประจำ	รวม	ร้อยละ	ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
2.1 เสร็จสิ้น	26	18	44	81.48	88.89	4.44
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	4	0	4	7.41		
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	0	0	0	0.00		
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	1	1	2	3.70		
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	0	0	0	0.00		
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0	0	0.00		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	4	0	4	7.41		
รวม	35	19	54	100.00		

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2554

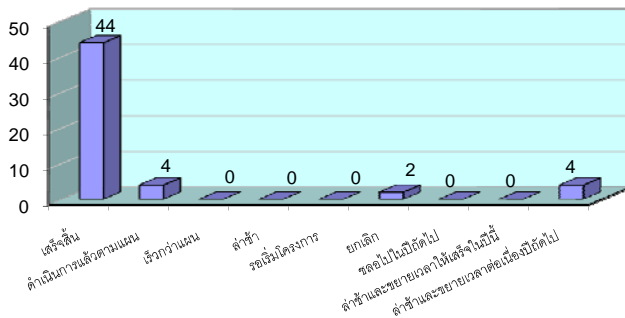

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส

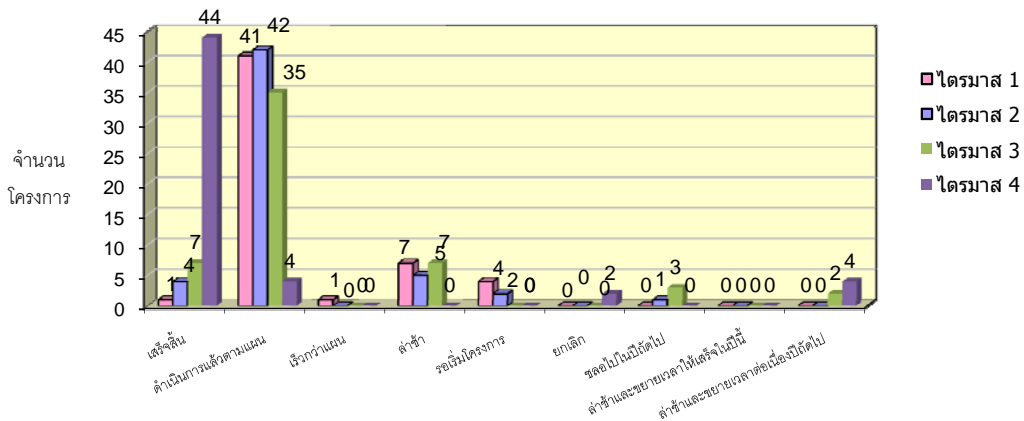

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	ดิเรก อึ้งตระกูล
โครงการประจำ		
8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	มัทธวิวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก อึ้งตระกูล
15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	ดิเรก อึ้งตระกูล
26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	สุทธิสา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ
27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	สุทธิสา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินการตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดิเรก อึ้งตระกูล
23	การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	ผู้อำนวยการ
25	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	วิลาวัลย์ บัวชา
28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ													
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2555-2559	เพื่อแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	1 ปี	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	SAP46	4	4,7,9	จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว ปี 2555-2559 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป	100	เสร็จสิ้น	
		2	โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	เพื่อขยายการใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านไอซีทีให้แก่หน่วยงาน	1 ปี	วิลาวัลย์ บัวขาว พัชรินทร์ สนิวนิช สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ นคร บริพนธ์มงคล สันติ สุขยานันท์ ชูศรี เขาวนารมย์	RAP125	2	1,4,9	1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ICT 9 ได้เฉลี่ยร้อยละ 84.22 2.แบบประเมินโครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 3. รายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการทราบ 4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2554 ส่งสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	
		3	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี	ไพโรจน์ ผาสุวรรณ	RAP124	4	4,7,10	ได้จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Service เรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง	100	เสร็จสิ้น	
		4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี	1 ปี	นคร บริพนธ์มงคล	RAP126	1	4,7,9	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่ายอาคาร 6 และอาคาร 15	100	เสร็จสิ้น	
		5	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	1. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ระบบเครือข่าย บัณฑิต	1 ปี	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP126	1	4,7,9	มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ฉบับ	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	6 ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพื่อแสดงข้อมูล สถิติการเข้าใช้บริการเครือข่ายบัวศรี	1 ปี	อิสระ สนิญเรือง อ้นยธร พงษ์เฉลิม	RAP123	1	4,7,9	รายงานแสดงสถิติผู้ใช้งานเครือข่ายผ่านระบบ I-Pass	100	เสร็จสิ้น		
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7	ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรี	1 ปี	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พงศ์ภูมิพันธ์ เตี้ย	RAP123	1	4,7	เสร็จสิ้น ในไตรมาส 2 แล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล Buasri ID ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1 ปี	ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ มณฑล ลัมกิจเจริญภรณ์	RAP123	1,2	4,7	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ LDAP กับระบบ Huris เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	เพื่อขยายขีดความสามารถของการให้บริการระบบไอซีทีให้รองรับกับการขยายงานของมหาวิทยาลัย	6 เดือน	พงศภูมิพันธ์ เตี้ย อนุกุล	RAP123	4	4,7,9	เสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว	100	เสร็จสิ้น	
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	10	ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว	เพื่อปรับปรุงระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายในให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ทราบถึงการเพิ่มขยายหมายเลขในอนาคต	6 เดือน	เฉลิมพล คำนิกรณ์	RAP123	4	4,7	มีรายงานการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมระบบทั้งหมด	100	เสร็จสิ้น	
		11	การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อเพิ่มขยายหมายเลขระบบโทรศัพท์ SIP Phone ให้มากขึ้น	1 ปี	เฉลิมพล คำนิกรณ์	RAP123	4	4,7	หน่วยงานได้รับความเข้าใจประโยชน์ของ SIP Phone แต่ขาดงบประมาณดำเนินการ	100	เสร็จสิ้น	หน่วยงานเข้าใจประโยชน์ของ SIIP Phone แต่ขาดงบประมาณดำเนินการ
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ออกแบบสถานที่		ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	สำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่พร้อมรับการดำเนินการจัดจ้างงานประเภทอาคาร
		13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิดบริการให้แก่ นิสิตในปีการศึกษา 2554	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	รอสำนักนวัตกรรมฯ กำลังประสานงานเรื่องการออกแบบ		ยกเลิก	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
		14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออกรักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	ประสานงานกับ สถาปนิก มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเขียน TOR	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	
		16	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	เพื่อความคล่องตัวในการ ขอรับบริการของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP123	1,2,4	5,6	ดำเนินการแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศ สามารถขอรับบริการได้	2 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP124	1,2,4	5,7	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
6	ระบบ ICT Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะเวลาที่ 3	18	โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554	เพื่อจัดหารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	6 เดือน	ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป	100	เสร็จสิ้น	
		19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	7 เดือน	ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป	100	เสร็จสิ้น	
		20	ICT Competency Training	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร ให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	1 ปี	ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	RAP109	1,2	1,2,3	ดำเนินการตามเป้าหมาย 2 โครงการ - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 8 (มี.ค.54-พ.ค.54) - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9 (มี.ย.54-ส.ค.54)	100	เสร็จสิ้น	
7	SWU Hybrid Education	21	SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware ระยะเวลาที่ 2 ปีการศึกษา 2553	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP9,13 RAP17	3,4	1,2,3	- ภาคการศึกษา 1/2553 มีพัฒนา จำนวน 47 รายวิชา ผ่านการประเมิน 39 รายวิชา - ภาคการศึกษา 2/2553 มีพัฒนา จำนวน 52 รายวิชา ผ่านการประเมิน 47 รายวิชา **สรุป การพัฒนา E-Learning Courseware ประจำปีการศึกษา 2553 มีผู้พัฒนา 99 รายวิชา ผ่านการประเมิน 86 รายวิชา	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
		22	กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	1 ปี	อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธริักษ์ และคณะ	RAP109	3,4	1,2,3,6	อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป	100	เสร็จสิ้น	
8	AOS : Cyber Education Center	23	การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	1 ปี	ผู้อำนวยการ	RAP66	3,4	1,2,3,6	ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินงานดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ (Learning Environment in Social Media Society) - กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ในยุคไซเบอร์ (Cyber Learning) (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัท เป็ดชอง) - กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน (อยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน)	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	24	กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว ดังนี้ กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรม 3. จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP125	1,2,3,4,5	1,4,6	เสร็จสิ้นแล้ว ในไตรมาส 2	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
10	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	25 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	3 ปี	วิลาวัลย์ บัวชา	RAP123	2,3,4,5	1,4,7	1. รายงานความก้าวหน้าของระบบให้กับผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม 2. ปรับแผนการทำงานจาก FTES เป็นการจัดทำรายงานสถิติต่างๆ ให้กับฝ่ายปฏิบัติการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย นโยบายการจัดทำ FTES มีการเปลี่ยนแปลง 3. ปรับแต่งเมนู ข้อความ และ Interface การนำเสนอ	100	ดำเนินการแล้วตามแผน	ปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากข้อมูลต้นทางมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงส่งผลไปยังการทำงานในไตรมาสนี้	
11	ระบบ SWU Information Portal	26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	9 เดือน	สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	1. มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2. ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	รอนโยบาย และความชัดเจนของความต้องการระบบ
		27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	9 เดือน	สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	1. มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2. ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	รอนโยบาย และความชัดเจนของความต้องการระบบ
12	ระบบนิทรรศการ มศว	28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดการนิทรรศการ มศว	1. เพื่อติดตั้งระบบไอซีทีในการจัดการนิทรรศการ มศว	3 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล		2,4,5	4,9	พัฒนาระบบและติดตั้งใช้งานจริงแล้ว http://g23.swu.ac.th/ http://act.swu.ac.th/	100	ดำเนินการแล้วตามแผน	
13	เว็บไซต์ มศว	29	ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Thai Version English Version	1. เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	RAP125	2,4	5,6	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาส 3	100	เสร็จสิ้น	
14	ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2554	30	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล วิลาวัลย์ บัวชา	RAP123	1,2,3,4,5	1,2,4	1. ติดตั้งและทดสอบระบบ 2. อบรมการใช้งานระบบ ระยะที่ 2 (โครงการ ICT9) 3. เตรียมแผนการอบรมผู้ใช้สำหรับการใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)
		31 ระบบ TQF Supporting System	เพื่อจัดทำระบบไอทีสนับสนุนการทำฐานข้อมูลรายวิชาตามมาตรฐาน TQF	1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	SAP10 RAP123	2,3,4,5	1,2,4	- ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับการทำงานของผู้ใช้งาน - จัดอบรมให้กับผู้ดูแลระบบงานหลัก - จัดอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนในการใช้งานระบบ	100	เสร็จสิ้น	
15	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	1.เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	RAP49 RAP123 RAP50	2,3,5	1,4,5	1.ติดตั้งระบบ 2.อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลงานวิจัยประจำหน่วยงาน โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการ ICT9 3.สรุปปัญหาในการใช้ระบบโปรแกรมที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ต้องปรับปรุง 4.รายงานผลการดำเนินงาน และการอบรม ให้แก่ผู้บริหารทราบ	100	เสร็จสิ้น	ต้องเสนอโครงการระยะที่ 3 ในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากต้องนำผลสรุปจากการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
16	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	33 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว	1 ปี	มณฑล สิมกิจเจริญภรณ์	RAP102 RAP123	2,4,5	4,7	มีการบำรุงรักษาระบบและพัฒนางานใหม่เพิ่มเติม	100	เสร็จสิ้น	
		34 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว	1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,3,4	4,7	- มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 6 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบ เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)
18	IT วิชาการ	35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ	เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที	1 ปี	ดร.อุราพร ศุขะทัตสมบุญ อุดมพรย้ง	RAP125	4	6	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ประมาณ 1,160 คน - ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 95.70% - มีความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการระดับดี ขึ้นไป 95.70% (เฉพาะในงานบรรยายวิชาการ)	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)
โครงการประจำ												
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1 ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	1 ปี	ปิ่นทิพย์ ไชยทรัพย์ พุทธิพร	RAP125	1,2,3,4	1,4,7	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly 3. จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1 ปี	ประกิจ สีลาเขียวชาญกุล	SAP23	4,5	1,4,7	มีโครงการวิจัยของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ และมีงานวิจัยที่เสร็จสิ้นจำนวน 1 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	
		3 กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	1 ปี	ประกิจ สีลาเขียวชาญกุล	RAP 47-50	3	5	มีการประชุมจัดกิจกรรมให้นักวิจัยบรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง	100	เสร็จสิ้น	
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	4 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP38	5	1	- มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ - บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน	100	เสร็จสิ้น	
		5 จัดทำแผนอัตรากำลัง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP99	5	1,4,7,9	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนอัตรากำลังเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)
	6	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP104	3,4,5	1,4,7,9	ได้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย	100	เสร็จสิ้น	
	7	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP122	3,4,5	1,4,7,9	- สำนักคอมพิวเตอร์มีจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดินและเงินรายได้) - มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	
	8	จัดทำโครงการเงินทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น	1 ปี	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP121	3,4,5	1,4,7,9	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	9	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	1 ปี	ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	RAP83	4,5	4,7,9	- จัดประชุมติดตามผลงานดำเนินการทุกไตรมาส - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ทุกไตรมาส	100	เสร็จสิ้น	
	10	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1 ปี	กรรณชวีรัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินได้คะแนน 4.53 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2554	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)
	11	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1 ปี	กฤษณ์วีรัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	- มีแผนการควบคุมภายใน - มีการรายงานผลการดำเนินงาน 6/9/12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	
	12	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	กฤษณ์วีรัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	สำนักคอมพิวเตอร์มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในเดือนกรกฎาคม 2554	100	เสร็จสิ้น	
	13	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวนิช	RAP85	5	4,7,9	สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์รับทราบ เนื่องจากนโยบาย ก.พ.ร. การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	
	14	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP85	5	4,7,9	ดำเนินการแล้วตามแผน ดูได้จาก http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=747&tabid=6519	100	เสร็จสิ้น	
	15	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	สมบุญ อุดมพรยิ่ง	RAP93	5	4,7,9	ดำเนินการแล้วตามแผน ดูได้จาก http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)	
		16	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	ไพโรจน์ ผาสวรรณ์	SAP31	5	4,7,9	1. กิจกรรมทำบุญในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงฯ ระดับมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	17	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	ธนรณพ อินดาสาย	RAP71	5	1,6	เสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 2	100	เสร็จสิ้น	
		18	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	จันทนา หมื่นพันธ์	RAP71	5	1,6	- กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านไอซีที ให้แก่นักเรียนในชุมชนครนาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ องค์กรฯ - กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตอาสาสาธารณะภายในหน่วยงาน	100	เสร็จสิ้น	
		19	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวนิช	RAP95	5	1,6	- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ - กิจกรรมรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า	100	เสร็จสิ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

- ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านที่ 5 ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี
